

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка результативности (эффективности) использования средств,
направленных на реализацию регионального проекта «Современная
школа» в рамках национального проекта «Образование» за 2020 год и
истекший период 2021 года»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Статья 2 Закона Республики Марий Эл от 03.01.1997 № 13-3 «О Государственной счетной палате Республики Марий Эл», пункт 2.3 плана деятельности Государственной счетной палаты Республики Марий Эл на 2021 год.

Цель контрольного мероприятия:

Оценка законности, результативности (эффективности) использования средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года».

Предмет контрольного мероприятия:

1. Деятельность ответственного исполнителя и участников по разработке и реализации регионального проекта «Современная школа».

2. Документы национального проекта «Образование», государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы», включая паспорт подпрограммы, в рамках которых реализуется региональный проект «Современная школа». Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие разработку государственных программ и региональных проектов. Законодательные, нормативные правовые акты, распорядительные, информационные и иные документы, обосновывающие ресурсное обеспечение и использование средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа».

3. Средства, направленные на реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года.

4. Бухгалтерская, финансовая, статистическая отчетность, соглашения, договоры, контракты, платежные и иные документы, подтверждающие выделение и расходование средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа», справочно-цифровые и иные материалы, относящиеся к теме проверки.

Объекты контрольного мероприятия:

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее – Минобрнауки Республики Марий Эл, Министерство).

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» (далее - ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат»).

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш Советского района» (далее – ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»).

4. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола».

5. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – МКУ «ДМЗ»).

6. Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл.

7. Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

8. Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл.

По результатам проверки каждого объекта контроля составлены справки проверок.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия проведено **12** контрольных обследований и осмотров (с применением фотофиксации), о чем составлены акты, проанализирована информация, полученная от **35** общеобразовательных организаций, расположенных в **15** муниципальных районах республики.

Проверяемый период деятельности: с 1 января 2020 года по 1 июня 2021 года, отдельные вопросы проверены по 15 октября 2021 года.

Срок проведения контрольного мероприятия на объектах контроля: с 8 февраля по 15 октября 2021 года.

Краткая характеристика исследуемой сферы деятельности:

Национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16).

Национальным проектом «Образование» определены 4 национальные цели развития¹.

Срок реализации национального проекта «Образование» с 01.01.2019 по 31.12.2024.

Реализация национального проекта «Образование» осуществляется в рамках 10 федеральных проектов.

В Республике Марий Эл национальный проект «Образование» реализуется в рамках 7 региональных проектов, которые обеспечивают достижение целей 7

¹Национальные цели развития:

1) вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

2) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

3) создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

4) увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов.

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование».

Взаимосвязь национального проекта с федеральными проектами и региональными проектами Республики Марий Эл представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Национальный проект	Федеральные проекты	Региональные проекты
Образование	«Современная школа»	«Современная школа»
	«Успех каждого ребенка»	«Успех каждого ребенка»
	«Поддержка семей, имеющих детей»	«Поддержка семей, имеющих детей»
	«Цифровая образовательная среда»	«Цифровая образовательная среда»
	«Учитель будущего»	«Учитель будущего»
	«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
	«Новые возможности для каждого»	-
	«Социальная активность»	«Социальная активность»
	«Экспорт образования»	-
	«Социальные лифты для каждого»	-

Федеральный проект «Современная школа» направлен на решение задач по внедрению на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

В Республике Марий Эл реализация федерального проекта «Современная школа» осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа» (далее – региональный проект).

Сведения о финансовом обеспечении регионального проекта в проверяемом периоде представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Уровни бюджетов	Утверждено: Закон о бюджете/Решение собрания депутатов (тыс. руб.)		Кассовые расходы по состоянию на 01.06.2021* (тыс. руб.)		Проверено средств** (тыс. руб.)	
	2020 год	2021 год ²	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год
Республиканский	12 962,2	8 638,0	10 359,8	3 110,1	8 241,9	3 110,1
Федеральный	374 172,4	423 264,7	311 443,5	152 394,8	207 667,1	152 394,8
Местный	411,1	1 069,1	334,4	867,8*	228,5	867,8
Итого	387 545,7	432 971,8	322 137,6	156 372,7	216 137,5**	156 372,8
Всего	820 517,5		478 510,4		372 510,32	

* С учетом расходов по просроченному платежу за государственную экспертизу проектно-сметной документации от 28.06.2021 в сумме 502,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета Мари-Турекского муниципального района;

** Без учета кассовых расходов по Городскому округу «Город «Волжск» в сумме 106 000,1 тыс. рублей (проверка проводилась Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл).

² Данные сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.05.2021.

В ходе контрольного мероприятия проверен объем израсходованных средств в сумме **393 365,52 тыс. рублей**, в том числе за 2019 год - 20 855,2 тыс. рублей³, 2020 год – 216 137,5 тыс. рублей, за 5 месяцев 2021 года – 156 372,8 тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия:

Вопрос 1. Проверка соблюдения законодательных, нормативных правовых актов, соглашений, распорядительных и иных документов, регламентирующих ресурсное обеспечение, выделение и использование средств на реализацию регионального проекта «Современная школа»

В Республике Марий Эл механизмом реализации регионального проекта «Современная школа» является государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования на 2013 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 № 452 (с изменениями и дополнениями) (далее – Государственная программа Республики Марий Эл).

Региональный проект утвержден Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому планированию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ (протокол от 05.02.2019 № 1), срок его реализации - с 01.11.2018 по 30.12.2024.

Ответственным исполнителем регионального проекта определено Минобрнауки Республики Марий Эл. Участниками являются в том числе подведомственные Министерству учреждения и органы местного самоуправления в Республике Марий Эл (по согласованию). Куратором назначен Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, руководителем - министр образования и науки Республики Марий Эл⁴.

Для обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» приказом Минобрнауки Республики Марий Эл от 10.01.2019 № 6 «О создании ведомственного проектного офиса в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл» (в ред. приказа от 28.04.2020 № 355) создан ведомственный проектный офис и утвержден его состав. Руководителем проектного офиса назначена - заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл.

Функции по организации деятельности проектного офиса возложены на отдел проектно-аналитической и организационной работы Министерства.

³ Стоимость работ и имущества, оплаченных в 2019 году (по выявленным в ходе осмотров нарушениям (работы по установке в оконные проемы здания школы деревянных блоков на сумму 12 386,6 тыс. рублей, работы по устройству вентиляционной системы на сумму 8 101,5 тыс. рублей, поставка технологического оборудования в столовую (кухонные стеллажи, подставка под пароконвектомат) на сумму 347,5 тыс. рублей).

⁴ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. № 487 «Об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл».

Между Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Министерство просвещения России) и Минобрнауки Республики Марий Эл заключено Соглашение о реализации на территории Республики Марий Эл регионального проекта «Современная школа» от 08.02.2019 № 073-2019-Е10011-1, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (далее – Соглашение о реализации регионального проекта от 08.02.2019).

Предметом Соглашения о реализации регионального проекта от 08.02.2019 является организация взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» в части мероприятий, реализуемых в Республике Марий Эл и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Республики Марий Эл (далее – федеральный проект по республике).

Нарушений в части исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением о реализации регионального проекта от 08.02.2019 (в ред. дополнительных соглашений), в проверяемом периоде не установлено.

Региональный проект интегрирован с Государственной программой Республики Марий Эл, в которой он выделен как основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» подпрограммы «Реализация региональных проектов».

1.1. Оценка качества формирования Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования на 2013 - 2025 годы» в части регионального проекта «Современная школа». Анализ выполнения целевых показателей (индикаторов) регионального проекта

Целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Государственной программой Республики Марий Эл для основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа»», соответствуют приоритетам развития образования в республике, определенным стратегией социально-экономического развития Республики Марий Эл⁵.

Однако, в Государственной программе Республики Марий Эл показатель эффективности: «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях», предусмотренный Планом мероприятий по реализации Стратегии⁶ для ключевого события «Реализация регионального проекта

⁵ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 17.01.2018 № 12 (ред. от 14.11.2019) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года» (вместе с «Перечнем основных инвестиционных проектов Республики Марий Эл, планируемых к реализации в 2018 - 2021 годах»).

⁶ План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 29.06.2018 № 380-р (в редакции распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 15.06.2020 № 224-р).

«Современная школа»», отражен в паспорте другой подпрограммы - «Государственное обеспечение функционирования системы образования».

Цель и задача, определенные паспортом регионального проекта, дублируют цель и задачу федерального проекта и также соответствуют направлению развития республики, определенному в Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года и требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2011 № 435 (далее - Порядок разработки, реализации и оценки государственных программ от 30.12.2011 № 435).

В проверяемом периоде в Государственную программу Республики Марий Эл всего было внесено 5 изменений, в части основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа» - 2, из них: в 2020 году - постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29.05.2020 № 219; в первом полугодии 2021 года - постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12.02.2021 № 53.

Внесение изменений связано с: *приведением целевых показателей основного мероприятия «региональный проект «Современная школа» в соответствие с Соглашением о реализации регионального проекта; уточнением кодов бюджетной классификации расходов (далее – КБК) и мероприятий по объектам капитального строительства.*

Так, по объекту капитального строительства: «Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в г. Козьмодемьянск с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский, 5 в г. Ижевске» (далее - строительство школы в г. Козьмодемьянске на 825 мест) уточнено направление расходования на «проектирование» (в 2020 году) и отражено финансовое обеспечение объекта в сумме 4 000,0 тыс. рублей (в 2021 году).

По объекту: «Строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района» (проектирование, строительство)» (далее – строительство школы в дер. Сардаял) изменена сметная стоимость с 93 057,8 тыс. рублей на 184 120,61 тыс. рублей, а также изменены объемы финансирования на данный объект с **92 944,4 тыс. рублей** (на 2020 год – 0 тыс. рублей, на 2021 год – 92 944,4 тыс. рублей, на 2022 год – 0 тыс. рублей) на **185 363,1 тыс. рублей**, в том числе на 2020 год – 1 326,0 тыс. рублей (добавлен объем финансирования на проектирование - 1 326,0 тыс. рублей), на 2021 год – 83 531,7 тыс. рублей, на 2022 год – 100 505,4 тыс. рублей (все изменения внесены в 2021 году).

При увеличении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства (постановление Правительства Республики Марий Эл от

12.02.2021 № 53) по состоянию на июнь 2021 года показатели основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа» в Государственной программе Республики Марий Эл остались неизменными. По информации Министерства актуализация Государственной программы Республики Марий Эл запланирована до 01.12.2021.

В паспорт регионального проекта за 2020 год и 1 полугодие 2021 года указанные выше **изменения не были внесены**, мероприятие по строительству школы в г. Козьмодемьянске на 825 мест в паспорте отсутствует. Объемы финансового обеспечения, отраженные в Государственной программе Республики Марий Эл и паспорте регионального проекта не согласованы между собой.

Кроме того, объемы финансового обеспечения, отраженные в паспорте регионального проекта, не соответствовали бюджетным ассигнованиям, утвержденным законами о республиканском бюджете и решениями Собраний депутатов муниципальных образований.

Информация об объемах финансового обеспечения регионального проекта, предусмотренных Государственной программой Республики Марий Эл, паспортом регионального проекта, законами о республиканском бюджете и решениями Собраний депутатов муниципальных образований, в разрезе бюджетов, представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

Уровень бюджета	Утвержденные назначения (тыс. руб.)			Отклонение назначений, утвержденных Законом о бюджете/решениями Собраний депутатов	
	ГП: Основное мероприятие «Современная школа»	Паспорт регионального проекта	Закон о бюджете/Решения Собраний депутатов МО	Основного мероприятия ГП (тыс. руб.) (гр 4-гр 2)	Паспорта РП (тыс. руб.) (гр 4-гр 3)
1	2	3	4	5	6
2020 год					
Республиканский	12 962,2	7 636,2	12 962,2	0	+5 326,0
Федеральный	374 172,4	374 172,4	374 172,4	0	0
Итого	387 134,6	381 808,6	387 134,6	0	+5 326,0
Местный	357,2	357,2	411,1	+53,9	+53,9
Всего	387 491,8	382 165,8	387 545,7	+53,9	+5 379,9
2021 год					
Республиканский	8 638,0	8 638,0	8 638,0	0	0
Федеральный	423 264,7	423 264,7	423 264,7	0	0
Итого	431 902,7	431 902,7	431 902,7	0	0
Местный	351,8	351,8	1 069,1	+717,3	+717,3
Всего	432 254,5	432 254,5	432 971,8	+717,3	+717,3

В нарушение требований пункта 16 Порядка разработки, реализации и оценки государственных программ от 30.12.2011 № 435⁷:

- паспортом Государственной программы Республики Марий Эл не предусмотрено финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа» в объеме 771,2 тыс. рублей *за счет средств местного бюджета*, из них в 2020 году в сумме 53,9 тыс. рублей, в 2021 году – 717,3 тыс. рублей;

- паспортом регионального проекта «Современная школа» не предусмотрено финансовое обеспечение в объеме 6 097,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году

1) *за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл* в сумме 5 326,0 тыс. рублей на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги по строительству общеобразовательных школ, из них:

- 1 326,0 тыс. рублей – по школе в дер. Сардаял Мари-Турекского муниципального района;

- 4 000,0 тыс. рублей – по школе в г. Козьмодемьянске на 825 мест;

2) *за счет средств местных бюджетов* в сумме 53,9 тыс. рублей на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги по строительству школ, в том числе:

- 13,4 тыс. рублей – из бюджета Мари-Турекского муниципального района;

- 40,5 тыс. рублей – из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»;

в 2021 году

1) *за счет средств местных бюджетов* в сумме 717,3 тыс. рублей:

не включены расходы, предусмотренные в бюджете Мари-Турекского муниципального района на государственную экспертизу проектной документации по строительству школы в дер. Сардаял.

Кроме того, **до 16.07.2021** (паспорт Е1-11-2021/004, версия № 11 от 16.07.2021) в паспорте регионального проекта отсутствовали бюджетные ассигнования, предусмотренные *за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл* в законе о республиканском бюджете⁸, по строительству школы в дер. Сардаял на 2022 год в объеме 100 505,4 тыс. рублей. В паспорте отражен объем финансового обеспечения объекта в размере 83 615,27 тыс. рублей (на 2021 год – 83 615,27 тыс. рублей, на 2022 год – 0 тыс. рублей).

В целях устранения нарушений в ходе проверки в паспорт регионального проекта от 23.09.2021 № Е 1-11-2021/007 Министерством были внесены изменения (версия 13 от 13.10.2021):

⁷ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2011 № 435 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл».

⁸ Закон Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

- добавлен результат: «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (создание дошкольных мест)» («Строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района» (создание дошкольных мест)) со значением – 20 мест;

- по добавленному результату отражен объем финансового обеспечения на 2022 год – 17 669,0 тыс. рублей;

- по результату: «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» («Строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района») отражен объем финансового обеспечения на 2021 год – 83 615,27 тыс. рублей, на 2022 год – 83 851,59 тыс. рублей.

Государственной программой Республики Марий Эл (II этап) для регионального проекта предусмотрено 4 целевых показателя (индикатора):

- количество новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в сельской местности, в том числе: введенных путем строительства объектов инфраструктуры системы общего образования, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, 2021 год – 60 ед.;

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей, 2020 год – 15 ед., 2021 год – 21 ед.;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, 2021 год – 10,0 процента;

- количество общеобразовательных организаций Республики Марий Эл, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», 2021 год – 1 ед.

Вышеуказанные целевые показатели по числовым значениям и наименованию соответствуют показателям, установленным в паспорте регионального проекта и Соглашении о реализации регионального проекта от 08.02.2019 (в ред. дополнительных соглашений).

Вместе с тем, Государственная программа Республики Марий Эл (в ред. от 18.08.2020) по основному мероприятию «Региональный проект «Современная школа» не содержит показателя, предусмотренного паспортом регионального проекта, а именно: «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей», что не соответствует

требованиям пунктов 2, 7 Порядка разработки, реализации и оценки государственных программ от 30.12.2011 № 435.

В Отчете о ходе реализации Регионального проекта на 2020 год «(Е1-88) Современная школа (Республика Марий Эл)» кроме указанных целевых показателей отражен показатель: «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» со значением - 1 единица, который в Государственной программе Республики Марий Эл, паспорте регионального проекта и Соглашении о реализации регионального проекта от 08.02.2019 отсутствует.

Проверкой установлено, что значения целевых показателей регионального проекта в 2020 году фактически достигнуты. При расчете целевых показателей Министерством использовались как прогнозные, так и оперативные данные по причине наложения учебного и календарного годов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что значение целевого показателя: «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 10,5 тыс. человек, нарастающим итогом с 2018 года» на основании оперативной информации Министерства отражено в отчете в размере 11,39 тыс. человек, по результатам проверки (на основании форм статистического наблюдения № ОО-1) значение показателя составило 10,76 тыс. человек (при плановом значении – 10,5 тыс. чел., фактически достигнуто).

Указанная в паспорте регионального проекта Методика расчета показателей⁹ (применялась Минобрнауки Республики Марий Эл для расчета показателей за 2020 год), применима для расчета показателей Министерством просвещения России и основывается на данных отчетов субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа».

В ходе проверки методика расчета показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» (единственный показатель, установленный на 2021 год) в паспорте регионального проекта «Современная школа» (версия 13 от 13.10.2021) актуализирована.

⁹ Методика расчета показателей федерального проекта «Современная школа», утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.04.2019 № 179.

1.1.1. Оценка качества формирования муниципальных программ

Проверкой муниципальных программ по муниципалитетам, участвующим в проверяемом периоде в реализации регионального проекта «Современная школа» по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (строительство школ), выявлено, что муниципальные программы:

- не содержат перечней мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, предусмотренных Правилами и порядками предоставления субсидий (нарушения отражены в разделе 1.3. настоящего Отчета);

- не актуализированы, в том числе в части ресурсного обеспечения мероприятий по строительству школ, сроков их строительства.

В муниципальной программе *муниципального образования «Медведевский муниципальный район»*¹⁰: по состоянию на 01.06.2021 объемы финансового обеспечения по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский 5, в г. Ижевске» не приведены в соответствие с бюджетными назначениями, утвержденными решением Собрания депутатов Медведевского муниципального района¹¹ на 2021 год, а именно муниципальной программой объем финансового обеспечения предусмотрен в сумме 252 000,0 тыс. рублей (2021 год – 160 000,0 тыс. рублей, 2022 год – 92 000,0 тыс. рублей), тогда как в муниципальном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 535 756,9 тыс. рублей (2021 год – 268 597,5 тыс. рублей, 2022 год – 267 159,4 тыс. рублей).

В муниципальную программу *Мари-Турекского муниципального района* изменения по финансовому обеспечению мероприятия по строительству школы в дер. Сардаял на 2022 год по средствам субсидии республиканского бюджета в сумме 100 505,4 тыс. рублей внесены только в ходе проверки постановлением администрации от 30.09.2021 № 423, тогда как бюджетные ассигнования в данном объеме утверждены решением Собрания депутатов Мари-Турекского муниципального района¹² в редакции от 07.05.2021 № 197.

1.2. Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Анализ финансового обеспечения регионального проекта

В 2020 году в рамках регионального проекта Республикой Марий Эл реализовывалось 3 показателя результатов (эффективности) реализации регионального проекта, на 2021 год предусмотрено выполнение 6 показателей

¹⁰ Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 12.11.2013 № 1875 (в ред. от 26.08.2019 № 1151).

¹¹ Решение Собрания депутатов Медведевского муниципального района от 23.12.2020 № 102-VII «О бюджете Медведевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов» (в ред. от 10.02.2021 № 116-VII).

¹² Решение Собрания депутатов Мари-Турекского муниципального района «О бюджете Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 16.12.2020 № 139 (в редакции от 07.05.2021 № 197).

результатов (далее – результаты регионального проекта, мероприятия регионального проекта). Сведения приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Код результата по БК	Мероприятия регионального проекта	
	2020 год	2021 год
51690	<p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p><i>(Центр «Точка роста»)</i> </p>	<p>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей</p> <p><i>(Центр «Точка роста»)</i> </p>
51870	<p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p><i>(«Доброшкола»)</i> </p>	<p>Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p><i>(«Доброшкола»)</i> </p>
55200	<p>Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») <i>(строительство школ)</i></p>	<p>Создано новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)</p> <p><i>(строительство школ)</i> </p>
55300		<p>Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p><i>(строительство школ в сельской местности)</i> </p>
51730		<p>На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки</p> <p><i>(«Кванториум»)</i> </p>
54810		<p>Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров <i>(Центр профессионального мастерства)</i> </p>

Мероприятия, предусмотренные на 2020 и 2021 годы паспортом регионального проекта, соответствуют мероприятиям федерального проекта и

мероприятиям, установленным Соглашением о реализации регионального проекта от 08.02.2019.

По всем результатам в паспорте регионального проекта определены контрольные точки и мероприятия, обеспечивающие достижение их целей, а также ответственные исполнители.

В целях реализации мероприятий регионального проекта Министерством просвещения России бюджету Республики Марий Эл предоставлялись межбюджетные трансферты на основании соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее - соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, Соглашения). Сведения приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

№ п/п	Реквизиты соглашений		Код результата по БК	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)	Сумма на 2021 год (тыс. руб.)
	№	дата			
1	073-09-2020-310	22.12.2019	51690 Центр «Точка роста»	16 755,8	-
	073-09-2020-310/1	17.06.2020		ФБ-16 420,7 РБ-335,1	
	073-09-2020-310/2	23.12.2020	51870 «Доброшкола»	7 815,1 ФБ-7 658,8 РБ-156,3	
2	073-09-2019-057	10.02.2019	55200 Строительство школ	11 940,6 ФБ-11 701,7 РБ-238,9	-
	073-09-2019-057/1	19.03.2019			
	073-09-2019-057/2	19.04.2019			
	073-09-2019-057/3	30.04.2019			
	073-09-2019-057/4	18.05.2020			
	073-09-2019-057/5	06.10.2020			
3	073-09-2020-907	19.12.2019	55200 Строительство школ	282 018,6 ФБ 276 378,3 РБ – 5 640,3 (в ред. от 10.02.2021) 345 297,1 ФБ-338 391,2 РБ-6 905,9 (на 31.12.2020)	
	073-09-2020-907/1	14.01.2020			
	073-09-2020-907/2	03.03.2020			
	073-09-2020-907/3	20.05.2020			
	073-09-2020-907/4	02.06.2020			
	073-09-2020-907/5	26.06.2020			
	073-09-2020-907/6	23.12.2020			
	073-09-2020-907/7	10.02.2021		268 329,2 ФБ-262 962,6 РБ-5 366,6	
4	073-09-2019-188	10.02.2019	52300 Строительство школ в сельской местности		83 531,7 ФБ-81 861,1 РБ-1 670,6
	073-09-2019-188/1	12.04.2019			
	073-09-2019-188/2	29.06.2020			
	073-09-2019-188/3	23.12.2020			
	073-09-2019-188/4	12.02.2021			
5	073-09-2021-107	25.12.2020	51730 Создание технопарков «Кванториум»	-	21 361,8 ФБ-20 934,6 РБ-427,2
			51690 Центр «Точка роста»		32 943,5 ФБ-32 284,6 РБ-658,95
			51870 «Доброшкола»		14 711,6 ФБ-14 417,3 РБ-294,3
			54810 Центр профессионального мастерства		11 025,0 ФБ-10 804,5 РБ-220,5

№ п/ п	Реквизиты соглашений		Код результата по БК	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)	Сумма на 2021 год (тыс. руб.)
	№	дата			
	Итого, в том числе:			318 530,1 (на 10.02.2021) 381 808,6 (на 31.12.2020)	431 902,8
	федеральный бюджет			312 159,5 (на 10.02.2021) 374 172,4 (на 31.12.2020)	423 264,7
	республиканский бюджет			6 370,6 (на 10.02.2021) 7 636,2 (на 31.12.2020)	8 638,1

В феврале 2021 года дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 073-09-2020-907 от 19.12.2019 объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия регионального проекта **строительство школ (код 55200)** за 2020 год был уменьшен на 63 278,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 62 012,9 тыс. рублей, республиканского бюджета - на 1 265,6 тыс. рублей, из них по объектам:

- строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9 «В» в г. Йошкар-Оле на 825 мест – в сумме 27 429,5 тыс. рублей;

- 2 пускового комплекса школы в г. Волжске на 336 мест – в сумме 35 912,3 тыс. рублей.

Из общей суммы экономии экономия, полученная по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, составила в объеме 6 147,8 тыс. рублей, в том числе по средствам федерального бюджета – 6 018,8 тыс. рублей, республиканского – 122,8 тыс. рублей, местного – 6,2 тыс. рублей.

Несмотря на требования постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2019 № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (пункт 7), Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (пункт 4.3.9.6) Минобрнауки Республики Марий Эл в Министерство просвещения России информация о наличии экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов за 2 и 3 квартал 2020 года, и предложения о заключении дополнительных соглашений, предусматривающих уменьшение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в установленный срок (не реже одного раза в квартал) на сумму 6 141,6 тыс. рублей, не направлялись.

Министерством в адрес Министерства просвещения России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дирекция «Школа 2025») было направлено письмо от 08.12.2020 о наличии экономии средств федерального бюджета по объектам строительства школы в г. Йошкар-Оле на 825 мест на

сумму 27 057 285 рублей 33копейки и 2 пускового комплекса школы в г. Волжске на 336 мест на сумму 35 766 992 рубля 97 копеек. Также Министерство уведомило Дирекцию «Школа 2025» о необходимости заключения дополнительного соглашения, предусматривающего уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Марий Эл, софинансируемых из федерального бюджета.

Как указано выше дополнительное соглашение на уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Марий Эл было заключено только в феврале 2021 года.

В результате в 2020 году изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Марий Эл, Закон Республики Марий Эл от 29.11.2019 № 49-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на сумму 63 278,5 тыс. рублей, в том числе по образовавшейся экономии по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на сумму 6 141,6 тыс. рублей, не внесены.

Законами о республиканском бюджете Республики Марий Эл¹³ предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта:

- на 2020 год в сумме 387 134,6 тыс. рублей, в том числе в рамках соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета - 381 808,6 тыс. рублей и дополнительные расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 5 326,0 тыс. рублей (расходы на разработку проектно-сметной документации);

- на 2021 год в сумме 431 902,7 тыс. рублей в рамках соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

Отчеты о расходовании средств субсидий и достижении значения результатов использования субсидий направлены Минобрнауки Республики Марий Эл в Министерство просвещения России в проверяемом периоде своевременно.

1.3. Проверка соблюдения законодательства при предоставлении субсидий из республиканского бюджета

В проверяемом периоде Минобрнауки Республики Марий Эл в рамках регионального проекта «Современная школа» закупки не осуществлялись. Для реализации мероприятий регионального проекта денежные средства **распределены** Министерством:

1) **6 подведомственным организациям** в виде субсидий на иные цели на сумму 104 612,7 тыс. рублей по 4 направлениям расходования (*Центр «Точка*

¹³ Закон Республики Марий Эл от 29.11.2019 № 49-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 11.09.2020), Закон Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 49-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (ред. от 28.05.2021).

роста», «Доброшкола», «Кванториум», Центр профессионального мастерства) в соответствии с соглашениями, заключенными в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» по типовой форме, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2016 № 197н;

2) **5 муниципальным образованиям** в виде межбюджетных субсидий на сумму 714 424,6 тыс. рублей по 2 направлениям расходования (*строительство школ, строительство школ в сельской местности*) в соответствии с соглашениями, заключенными в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» по типовой форме, утвержденной приказом Минфина России от 14.12.2018 № 269н¹⁴ и на бумажном носителе по типовой форме, утвержденной приказом Минфина Республики Марий Эл от 25.12.2019 № 16н¹⁵.

Информация о распределении Министерством субсидий из республиканского бюджета в разрезе получателей средств представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

Получатель субсидии	Реквизиты соглашений, заключенных Министерством с подведомственными учреждениями, администрациями МО и ГО		Направление расходования	Сумма (тыс. руб.)		НПА, в соответствии с которыми выделены субсидии
	№	дата		2020	2021	
ВСЕГО, в том числе:				387 134,6 ФБ-374 172,4 РБ-12 962,2	431 902,8 ФБ-423 264,7 РБ-8 638,1	
1. Межбюджетные субсидии муниципальным образованиям и городским округам Республики Марий Эл, всего				362 563,7 ФБ-350 092,9 РБ-12 470,8	351 860,9 ФБ-344 823,7 РБ-7 037,2	
1.1. Администрация ГО «Город Йошкар-Ола» (МКУ «ДМЗ»)	88701000-1-2019-002	13.03.2019	Строительство школы в 9 «В» микрорайоне г. Йошкар-Олы (55200)	11 940,6 ФБ-11 701,7 РБ-238,9		Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240
	88701000-1-2020-005	19.02.2020		203 526,5		
	88701000-1-2020-005/1	13.03.2020		ФБ-199 456,0		
	88701000-1-2020-005/2	26.05.2020		РБ-4070,5		
	88701000-1-2020-005/3	05.06.2020				
1.2. Администрация ГО «Город Волжск»	88705000-1-2020-005 8870500-1-2020-005/1	17.02.2020 13.03.2020	Строительство 2 пусковой комплекс школы в г. Волжске (55200)	141 770,6 ФБ-138 935,2 РБ-2835,4		Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240
1.3. Администрация Медведевского муниципального района	88628000-1-2020-003 8862800-1-2020-003/1 8862800-1-2020-003/2	17.01.2020 13.03.2020 28.01.2021	Строительство школы по ул. Кирова в пос. Медведево (55200)		268 329,2 ФБ-262 962,6 РБ-5 366,6	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240
1.4. Администрация ГО «Город Козьмодемьянск	№1	29.06.2020	Проектные и изыскательские работы на строительство школы в г. Козьмодемьянске	4 000,0 (РБ)		Порядок отсутствует

¹⁴ Приказ Минфина России от 14.12.2018 № 269н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации».

¹⁵ Приказ Министерства финансов Республики Марий Эл от 25.12.2019 № 16-н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования в Республике Марий Эл».

Получатель субсидии	Реквизиты соглашений, заключенных Министерством с подведомственными учреждениями, администрациями МО и ГО		Направление расходования	Сумма (тыс. руб.)		НПА, в соответствии с которыми выделены субсидии
	№	дата		2020	2021	
1.5. Администрация Мари-Турекского муниципального района	№1/1	29.06.2020	Проектные и изыскательские работы на строительство школы в дер. Сардаял	1 326,0 (РБ)		Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353
	88624000-1-2019-011	21.11.2019	Строительство школы в дер. Сардаял (52300)		83 531,7 ФБ-81 861,1 РБ-1 670,6	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 01.11.2019 № 337
	88624000-1-2019-011/1	13.03.2020				
	88624000-1-2019-011/2	27.01.2021				
88624000-1-2019-011/3	03.02.2021					
2. Субсидии на иные цели подведомственным учреждениям, всего				24 570,9	80 041,8	
2.1. ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат п. Ургакш»	20-2020-02033	22.04.2020	Центр «Точка роста» (51690)		16 755,8 ФБ-16 420,7 РБ-335,1	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2011 № 254
	20-2021-01438	25.01.2021				
2.2. ГБОУ РМЭ «Козьмодемьянская школа-интернат»	20-2020-02021	22.04.2020	«Доброшкола» (51870)		7 815,1 ФБ-7 658,8 РБ-156,3	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2011 № 254
2.3. ГБОУ РМЭ «Косолаповская школа-интернат»	20-2021-01352	25.01.2021	«Доброшкола» (51870)		7 355,75 ФБ-7 208,6 РБ-147,15	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2020 №460
	20-2021-01352/1	12.04.2021				
20-2021-01352/2	20.04.2021					
2.4. ГБОУ РМЭ «Нартасская школа-интернат»	20-2021-01297	22.01.2021			7 355,75	
	20-2021-01297/1	12.04.2021			ФБ-7 208,6	
	20-2021-01297/2	20.04.2021			РБ-147,15	
2.5. ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»	20-2021-01500	25.01.2021	технопарк «Кванториум» (51730)		21 361,8 ФБ-20 934,6 РБ-427,2	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 460
2.6. ГБУ ДПО РМЭ «Марийский Институт Образования»	20-2021-01452	26.01.2021	Центр профессионального мастерства (54810)		11 025,0 ФБ-10 804,5 РБ-220,5	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 460
	20-2021-01452/1	16.04.2021				

При предоставлении субсидий из республиканского бюджета Министерством и получателями средств не соблюдались условия и порядок их предоставления, допускались нарушения требований Закона Республики Марий Эл от 06.07.2005 № 26-З «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл», Порядка распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306¹⁶ и порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

¹⁶ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам».

Кроме того, в проверенном периоде Министерством предоставлялись межбюджетные субсидии из республиканского бюджета при отсутствии порядков их предоставления.

Министерство, являясь главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств не осуществляло должный контроль за соблюдением порядка и условий предоставления и использования бюджетных средств их получателями.

1.3.1. Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям

При предоставлении в 2021 году Администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» межбюджетной субсидии в рамках мероприятия по **строительству школ (код 55200)** на «объект капитального строительства: «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский, в г. Ижевске»» (далее-строительство школы в пос. Медведево) Администрацией не выполнено, а Министерством не проконтролировано выполнение условий предоставления субсидии.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на строительство школ¹⁷ и Соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета¹⁸ условием предоставления средств является наличие в муниципальной программе перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Пунктом 1.2 Соглашения определено, что предоставление субсидии осуществляется для достижения результата регионального проекта по Муниципалитету в рамках Комплекса мер (программа), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 – 2025 годы¹⁹ (далее – Комплекс мер).

Вместе с тем, Комплекс мер не является муниципальной программой, разработанной в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не содержит распределение бюджетных ассигнований в соответствии с классификацией расходов бюджетов. Решением Собрания

¹⁷ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).

¹⁸ Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 – 2025 годы, на реализацию мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2020 – 2024 годы, от 17.01.2020 № 88628000-1-2020-003 (с дополнительными соглашениями).

¹⁹ Постановление Главы Администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 10.03.2016 № 168 «Об утверждении комплекса мер (программа), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 – 2025 годы» (в ред. от 05.12.2016 № 849).

депутатов муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 18.12.2019 № 31-VII «О бюджете муниципального образования «Медведевский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район»²⁰ (далее – муниципальная программа).

Указанным Комплексом мер предусмотрено строительство школы в пос. Медведево по ул. Кирова на 825 мест в 2018 году, что не соответствует периоду строительства, определенному Соглашением - 2020 - 2022 годы. В 2020 – 2022 годах Комплексом мер строительство школы в пос. Медведево по ул. Кирова на 825 мест не предусмотрено. В проверяемом периоде изменения в Комплекс мер в целях его актуализации не вносились.

Для получения субсидии в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл также предоставлена муниципальная программа.

Реализация регионального проекта в Муниципалитете по строительству школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский, в г. Ижевске» осуществлялась по основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов социального назначения» подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной и коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район» муниципальной программы.

Несмотря на требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Медведевский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 04.02.2020 № 114, в муниципальной программе принадлежность объекта: «Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский 5, в г. Ижевске» к региональному проекту «Современная школа» не указана. Коды бюджетной классификации расходов, по которым в бюджете муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство школы отсутствуют, мероприятие в виде отдельного структурного элемента не выделено.

В результате несоблюдения условий предоставления межбюджетных субсидий в 2021 году по состоянию на 01.06.2021 Министерством выделено, а *Администрацией муниципального образования «Медведевский муниципальный*

²⁰ Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 12.11.2013 № 1875.

район» получено и израсходовано средств в сумме 150 560,0 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета – 147 548,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 011,2 тыс. рублей.

Аналогично в соответствии с Соглашениями²¹, заключенными Министерством с *Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»* в рамках мероприятия по **строительству школ (код 55200)** на объект: «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9 «В» г. Йошкар-Олы с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский, 5 в г. Ижевске»» (далее - строительство школы в г. Йошкар-Оле), предоставление субсидии также осуществлялось для достижения результата в рамках Комплекса мер (программ), направленных на создание новых мест в муниципальных образовательных организациях городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 – 2025 годы (в ред. от 23.12.2016)²² (далее – Комплекс мер).

Согласно Комплексу мер строительство школы на 825 мест в микрорайоне 9 «В» г. Йошкар-Олы указано в период 2016 – 2018 годы, что не соответствует периоду строительства, определенному Соглашением - 2018 - 2020 годы. В 2018 – 2020 годах Комплексом мер строительство школы на 825 мест в микрорайоне 9 «В» г. Йошкар-Олы не предусмотрено. В республиканскую адресную инвестиционную программу объект строительства включен только с 2019 года. В проверяемом периоде изменения в Комплекс мер в целях его актуализации не вносились.

Реализация результата регионального проекта в Муниципалитете осуществлялась в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа» подпрограммы «Комплексное развитие муниципальных учреждений в сфере образования городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденной постановлением Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл от 31.03.2016 № 471, которая предоставлена в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл для получения субсидии.

Необходимо отметить, что порядками предоставления межбюджетных субсидий предусмотрено их предоставление при наличии в муниципальном

²¹ Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 – 2025 годы, на реализацию мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения:

- на 2016 – 2020 годы (1этап) от 13.03.2019 № 88701000-1-2019-002;

- на 2020 – 2024 годы» от 19.02.2020 №88701000-1-2020-005 (с дополнительными соглашениями).

²² Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.03.2016 № 407 «Об утверждении комплекса мер (программ), направленных на создание новых мест в муниципальных образовательных организациях городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 – 2025 годы (в ред. от 23.12.2016).

образовании муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия. Вместе с тем, типовыми формами соглашений предусмотрено наличие правового акта, содержащего расходные обязательства, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Фактически муниципалитетами для получения субсидий в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл предоставлены муниципальные программы.

Министерством с *Администрацией Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл* в рамках мероприятия по **строительству школ в сельской местности, код 53200** заключено 2 соглашения:

1) на строительство школы в дер. Сардаял на 60 мест на сумму 83 615,3 тыс. рублей;

2) на разработку проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг на строительство школы в дер. Сардаял на сумму 1 326,00 тыс. рублей за счет средств, дополнительно выделенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Соглашение²³ на строительство школы в дер. Сардаял заключено Министерством с *Администрацией Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл* без проведения отбора получателей субсидии, что не соответствует требованиям, установленным Порядком предоставления субсидии на строительство школ в сельской местности, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 01.11.2019 № 337²⁴.

Согласно информации Министерства, средства субсидий из федерального бюджета на строительство школы в дер. Сардаял, выделены на основании поручения помощника Президента Российской Федерации В.Кожина, в связи с обращением жительницы Мари-Турекского муниципального района.

Результатом реализации указанного Соглашения является строительство школы в дер. Сардаял на 60 мест и сроком ввода в эксплуатацию – 31.12.2021. Объем финансового обеспечения предусмотрен Соглашением на 2021 год в размере 83 615,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 81 861,1 тыс. рублей, республиканского – 1 670,6 тыс. рублей, бюджета Мари-Турекского муниципального района – 83,5 тыс. рублей.

²³ Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования в Республике Марий Эл на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2025 годы, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 21.11.2019 № 88624000-1-2019-011.

²⁴ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 01.11.2019 № 337 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».

В 2021 году постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16.02.2021 № 57²⁵ утверждено распределение субсидии бюджету муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» на строительство общеобразовательной школы в дер. Сардаял на 2022 год в размере 100 505,4 тыс. рублей. Изменения, предусматривающие объем финансового обеспечения в 2022 году, в Соглашение не вносились.

Как следует из обстоятельств, установленных в ходе контрольного мероприятия, *Администрацией Мари-Турекского муниципального района* планировалось и в 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство общеобразовательной школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест, что подтверждается Комплексом мер (программой)²⁶, которым предусмотрено строительство объекта: «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» дер. Сардаял Мари-Турекского района» на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест».

Администрацией Мари-Турекского района информация о планировании строительства общеобразовательной школы с дошкольной группой доводилась до Министерства начиная с 2016 года.

Вместе с тем, муниципальной программой Мари-Турекского района²⁷ и паспортом регионального проекта «Современная школа» было предусмотрено мероприятие по строительству школы в дер. Сардаял на 60 мест, сроком ввода в эксплуатацию – 31.12.2021.

В ходе проверки в сентябре 2021 года в «Сводную бюджетную роспись (расходы) на основании Закона Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 49-3²⁸» (далее - Сводная бюджетная роспись (расходы) Республики Марий Эл) были внесены изменения, в части разделения бюджетных ассигнований на 2022 год в размере 100 505,4 тыс. рублей на 2 направления:

- «Строительство объекта: «Сардаяльская основная общеобразовательная школа в дер. Сардаял Мари-Турекского района» - 83 013 073,63 рублей, по КБК 874 0702 028E152301 523;

- «Строительство объекта: «Сардаяльская основная общеобразовательная школа в дер. Сардаял Мари-Турекского района» (дошкольная группа)» - 17 492 309,95 рублей, по КБК 874 0702 028E152311 523.

Код целевой статьи 028E152311 - «Строительство объекта: «Сардаяльская основная общеобразовательная школа в дер. Сардаял Мари-Турекского района»

²⁵ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 16.02.2021 № 57 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2025 годы».

²⁶ Комплекс мер (программа), направленный на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью, современными требованиями к условиям обучения, на 2016-2025 годы, утвержденный постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 01.12.2016 № 578.

²⁷ Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности молодежной политики Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл от 28.02.2020 № 83.

²⁸ Закон Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 49-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

(дошкольная группа)» дополнен приказом Министерства финансов Республики Марий Эл от 24.08.2021 № 84о/д «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Марий Эл от 30.10.2020 № 120 о/д».

Между Минобрнауки Республики Марий Эл и Администрацией Мари-Турекского муниципального района заключено новое Соглашение от 30.09.2021 № 1 (на бумажном носителе).

Предметом данного Соглашения является предоставление в 2022 году из республиканского бюджета субсидии на строительство школы в дер. Сардаял в объеме 100 505,4 тыс. рублей. Значение результата Соглашением предусмотрено: создание школьных мест – 60 мест, со сроком ввода 2021 год, объем субсидии - 83 013 073,63 рублей (погашение кредиторской задолженности) и создание дошкольной группы – 20 мест, со сроком ввода 2022 год, объем субсидии - 17 492 309,95 рублей.

Соглашение на разработку проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг на строительство школы в дер. Сардаял было заключено с *Администрацией Мари-Турекского муниципального района* 29.06.2020 при отсутствии утвержденного законом о республиканском бюджете Перечня соответствующей субсидии и Порядка предоставления такой субсидии.

Субсидия, предоставленная *Администрации Мари-Турекского муниципального района*, внесена в Перечень субсидий только в сентябре 2020 года законом о республиканском бюджете от 11.09.2020 № 31-З²⁹, Порядок на предоставление субсидии на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги был утвержден постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353³⁰.

Отсутствие Перечня субсидий и Порядка предоставления субсидий повлекло нарушение администрацией *Мари-Турекского муниципального района* сроков оплаты по муниципальному договору на научно-исследовательские археологические работы на 39 календарных дней (расчет произведен 21.09.2020 следовало 13.08.2020) на сумму 99,9 тыс. рублей.

Пунктом 2 постановления Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353 определено, что данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Вместе с тем, изменения в Соглашение с *Администрацией Мари-Турекского муниципального района* с учетом принятия вышеуказанного Порядка не внесены.

²⁹ Закон Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 31-З «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

³⁰ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг объектов капитального строительства муниципальной собственности, создаваемых в рамках реализации национальных проектов и указанных в паспортах региональных проектов».

Аналогично в рамках мероприятия по *строительству школ, код 55200* Министерством 29.06.2020 было заключено Соглашение с *Администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск»* на разработку проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг на строительство школы в г. Козьмодемьянске на 825 мест за счет средств, дополнительно выделенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл на сумму 4 000,0 тыс. рублей.

При этом, субсидия выделена по объекту, не включенному в паспорт регионального проекта. В случае не заключения финансового соглашения с Министерством просвещения России на создание новых мест в городе Козьмодемьянске существует риск неэффективного использования средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».

По состоянию на август 2021 года в отношении субсидии, предоставленной *Администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»*, Перечень субсидий и Порядок ее предоставления не утверждены.

В рамках соглашений на разработку проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг фактически израсходованы бюджетные средства *Администрацией «Городской округ «Город Козьмодемьянск»* в сумме 2 911,3 тыс. рублей, их них субсидии из республиканского бюджета – 2 882,2 тыс. рублей, *Администрацией Мари-Турекского района* в сумме 1 132,9 тыс. рублей, их них субсидии из республиканского бюджета – 1 121,6 тыс. рублей.

Кроме того, соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги, заключенные с *муниципальными образованиями «Городской округ «Город Козьмодемьянск», Мари-Турекского района*, не соответствуют типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Марий Эл от 25.12.2019 № 16-н³¹, в части отсутствия условий, подлежащих обязательному включению.

В соглашениях *отсутствуют*:

1) в пreamбуле информация в соответствии с какими порядками предоставления субсидии заключено настоящее Соглашение;

2) в разделе II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия»:

- пункт 2.3: «Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № 2 к

³¹ Приказ Министерства финансов Республики Марий Эл от 25 декабря 2019 г. № 16-н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования в Республике Марий Эл».

настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.»;

3) в разделе IV «Взаимодействие сторон» в пункте 4.3:

- подпункт 4.3.3: «Обеспечивать достижение результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.», что **фактически подразумевает необязательность достижения результатов;**

- в подпункте 4.3.5 не предусмотрено предоставление «Отчета о достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, не позднее __ числа месяца, следующего за _____, в котором была получена Субсидия;».

При этом, в соответствии с пунктом 4.1.3 Соглашения предусмотрено, что **оценка эффективности использования** субсидии осуществляется Министерством с учетом **обязательств по достижению значения результатов** использования субсидии;

4) в приложениях к Соглашениям:

- приложение № 2: «Информация о размерах субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества»;

- приложение № 3: «Результаты использования Субсидии»;

- приложение № 6: «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии по состоянию на «__» _____ 20__ года».

Отсутствие в заключенных соглашениях условий, предусмотренных типовой формой соглашения, влечет нарушение Порядка распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306³² и порядков на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

1.3.2. Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям

В рамках реализации мероприятия регионального проекта **по созданию Центров «Точка роста» (код 51690)** получателем субсидии на иные цели определено ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш», с которым Министерством заключены соглашения³³ в 2020 году на сумму 16 755,8 тыс. рублей, в 2021 году с объемом финансового обеспечения - 100 394,6 тыс. рублей на 2021-2023 годы, в том числе на 2021 год – 32 284,6 тыс.

³² Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам».

³³ Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, от 22.04.2020 № 20-2020-02033, от 25.01.2021 № 20-2021-01438.

рублей.

Вместе с тем, согласно перечню общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»:

- в 2020 году определены 15 общеобразовательных организаций, из них 14 муниципальных организаций в 14 муниципальных образованиях республики и ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»;

- в 2021 году – 21 общеобразовательная организация, из них 20 муниципальных организаций и 1 организация, подведомственная Министерству. В ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» в 2021 году Центр «Точка роста» не создавался.

Соглашениями не оговорено, что субсидия на иные цели выделяется для приобретения оборудования и средств обучения для 15 и 21 Центров «Точка роста», соответственно ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» предварительные расчеты объема субсидии в Министерство не направлялись, что является нарушением порядков определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели³⁴.

Таким образом, Минобрнауки Республики Марий Эл, предоставляя субсидию, изначально не предназначавшуюся в полном объеме для создания (обновления) материально-технической базы Учреждения с целью создания Центра «Точка роста», и выражая согласие на отчуждение этого имущества, нарушило условия, указанные в соглашениях о том, что субсидия из бюджета Республики Марий Эл предоставлена Учреждению.

Необходимо отметить, что Центры «Точка роста» создаются как ***структурные подразделения общеобразовательных организаций.***

Согласно Уставу ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» к его компетенции не относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности других организаций, в том числе муниципальных.

Кроме того, исходя из требований и положений статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) ***бюджетное учреждение не может быть уполномоченным органом для осуществления централизованных закупок, наделенным полномочиями на заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных***

³⁴ Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2011 № 254 (на 2020 год).
Порядок определения объема и условия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 460 (на 2021 год).

услуг, обеспечение их оплаты.

Из условий контрактов (договоров) на приобретение оборудования и средств обучения для создания Центров «Точка роста», заключенных ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» по результатам централизованной закупки в 2020 и 2021 годах, следует, что учреждение осуществляло закупку оборудования и средств обучения в 2020 году для себя и 14 муниципальных общеобразовательных организаций, в 2021 году для 20 муниципальных и 1 государственного общеобразовательных организаций, **и осуществляло исполнение контрактов (договоров), в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты.**

ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» и Минобрнауки Республики Марий Эл соглашения с администрациями муниципальных районов (городских образований) **не заключались.**

Таким образом, ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» в 2020 и 2021 годах осуществлялись централизованные закупки при отсутствии необходимых полномочий, что является нарушением статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Следует отметить, что согласно комплексу мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» и описанию создаваемых Центров «Точка роста» в Республике Марий Эл, утвержденному распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 02.07.2019 № 298-р, ответственным исполнителем по закупкам товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» определено Минобрнауки Республики Марий Эл.

По данному факту нарушений в ходе проверки Государственной счетной палатой Республики Марий Эл направлена информация в прокуратуру Республики Марий Эл для принятия мер прокурорского реагирования.

Согласно информации прокуратуры Республики Марий Эл по итогам рассмотрения материалов министру образования и науки Республики Марий Эл внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства при реализации регионального проекта «Современная школа».

Минобрнауки Республики Марий Эл по результатам рассмотрения вышеуказанного представления к работникам Министерства, виновным в нарушениях, указанных в представлении, применены меры дисциплинарного воздействия, в 2022 году планируется определение в качестве уполномоченного органа, проводящего централизованные закупки для бюджетных учреждений, - Минобрнауки Республики Марий Эл.

В рамках соглашений на предоставление субсидий на иные цели³⁵, заключенных Министерством в 2021 году с ГБОУ Республики Марий Эл

³⁵ Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) с ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» от 25.01.2021 № 20-2021-01352;

«Косолаповская школа-интернат» и ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская школа-интернат» для реализации мероприятия регионального проекта **по проекту «Доброшкола» (код 51870)** учредителем нарушались сроки перечисления субсидий на иные цели, установленные соглашениями.

Министерством не соблюдался график перечисления субсидии – «не позднее 01.04.2021», в результате денежные средства доведены в период со 2 по 19 апреля 2021 года или позже срока, установленного графиком, в ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» в размере 402,14 тыс. рублей, ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская школа-интернат» - 774,18 тыс. рублей.

В ходе проверки 20.04.2021 к указанным соглашениям были заключены дополнительные соглашения, которыми изменены графики перечисления субсидии.

Проверками соблюдения порядка и условий предоставления в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на иные цели в рамках реализации других мероприятий регионального проекта, в том числе в части соответствия соглашений типовой форме, сроков перечисления субсидий, нарушений не установлено.

1.4. Проверка своевременности предоставления отчетности в рамках соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета

В соответствии с условиями соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета, требованиями порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета получателями бюджетных средств в Минобрнауки Республики Марий Эл предоставлялись отчеты о расходовании субсидии и отчеты о достижении значений показателей результативности использования субсидии.

По причине отсутствия должного контроля со стороны Министерства получателями бюджетных средств допускалось несвоевременное предоставление установленной соглашениями отчетности. Тремя из 7 объектов контроля были нарушены сроки ее предоставления от 10 до 25 дней, в том числе *Администрациями городского округа «Город Козьмодемьянск», Мари-Турекского и Медведевского муниципальных районов.*

Вопрос 2. Проверка законности, результативности (эффективности) использования средств, выделенных в рамках регионального проекта «Современная школа»

В 2020-2021 годах³⁶ на реализацию регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» законами о

2) с ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская школа-интернат» от 22.01.2021 № 20-2021-01297.


³⁶ За 2021 год данные сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.05.2021.

республиканском бюджете³⁷ и решениями Собраний депутатов муниципальных образований предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 820 517,5 тыс. рублей.

За 2020 год и 5 месяцев 2021 года произведены бюджетные расходы на выполнение заданных результатов регионального проекта в общей сумме 478 008,3 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета - 463 838,3 тыс. рублей, республиканского - 13 469,9 тыс. рублей, местного - 700,1 тыс. рублей.

Доля расходов, произведенных за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, приведена на диаграмме 1.

Диаграмма 1.

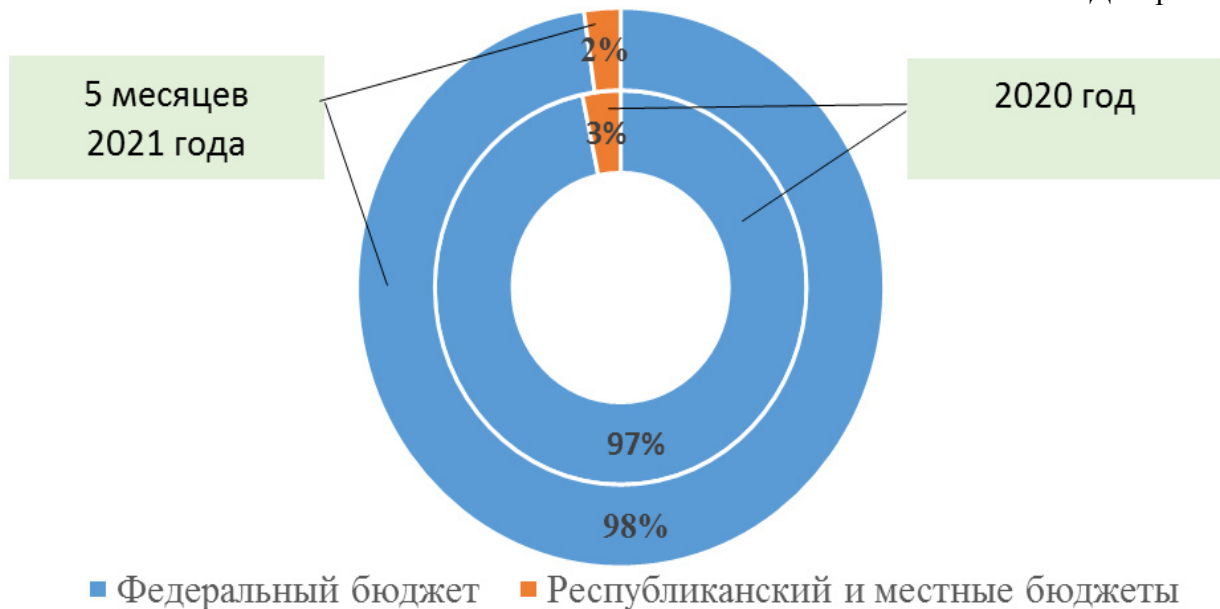

По данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) на реализацию регионального проекта израсходовано бюджетных средств **в 2020 году** - 322 137,6 тыс. рублей, или 83,1 % от утвержденных годовых бюджетных ассигнований (387 545,7 тыс. руб.), экономия бюджетных средств сложилась в сумме 65 408,1 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 62 729,0 тыс. рублей (израсходовано - 311 443,4 тыс. руб., утверждено - 374 172,4 тыс. руб.), республиканского - 2 602,4 тыс. рублей (израсходовано - 10 359,8 тыс. руб., утверждено - 12 962,2 тыс. руб.), местного - 76,7 тыс. рублей (израсходовано - 334,4 тыс. руб., утверждено - 411,1 тыс. руб.).

Экономия средств сложилась в результате их неиспользования (отсутствие потребности) и проведения конкурентных процедур при осуществлении закупок.

По данным Минобрнауки Республики Марий Эл **за 5 месяцев 2021 года** израсходовано бюджетных средств в сумме 155 870,7 тыс. рублей, или 36,0 % от

³⁷ Закон Республики Марий Эл от 29.11.2019 № 49-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 11.09.2020); Закон Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 49-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

утвержденных годовых бюджетных ассигнований (432 971,8 тыс. руб.), в том числе израсходовано средств: федерального бюджета – 152 394,8 тыс. рублей (утверждено – 423 264,7 тыс. руб.), республиканского – 3 110,1 тыс. рублей (утверждено – 8 638,0 тыс. руб.), местного – 365,8 тыс. рублей (утверждено – 1 069,1 тыс. руб.).

Причины низкого уровня исполнения расходов за 1 полугодие 2021 года носят **организационный характер**: несвоевременное заключение контрактов и договоров получателями бюджетных средств в рамках мероприятия по строительству школ, несвоевременное утверждение документации (инфраструктурного листа, по размещению помещений), необходимой для создания детского технопарка Кванториум. Также сложилась экономия средств в результате проведения конкурентных процедур при осуществлении закупок.

За счет средств бюджетов в 2020 году и 5 месяцев 2021 года произведены следующие расходы по: закупке оборудования и средств обучения для общеобразовательных учебных учреждений (Центры «Точка роста») и для занимающихся исключительно по адаптированным программам обучения («Доброшкола»); разработке проектно-сметной документации и строительству школ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в рамках регионального проекта – 87,2 % (715 187,6 тыс. рублей) предусмотрен на создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство школ), в том числе: в 2020 году – 362 974,8 тыс. рублей или 93,7 % от общего годового объема финансирования регионального проекта; в 2021 году – 352 212,8 тыс. рублей или 81,3 % от общего годового объема финансирования.

В 2020 году 3 мероприятия, предусмотренные в рамках регионального проекта, выполнены в полном объеме:


1) создано 1 161 новое место в общеобразовательных организациях, показатель результата регионального проекта по состоянию на 31.12.2020 составил 1 281 мест и соответствует плановому значению показателя регионального проекта (не менее 1280 мест), указанному в Паспорте регионального проекта «Современная школа» (Республика Марий Эл).

2) создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 15 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (15 Центров «Точка роста»);

3) обновлена материально-техническая база в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (1 «Доброшкола»).

Сведения об исполнении мероприятий регионального проекта в 2020 году приведены на диаграмме № 2.


Диаграмма 2

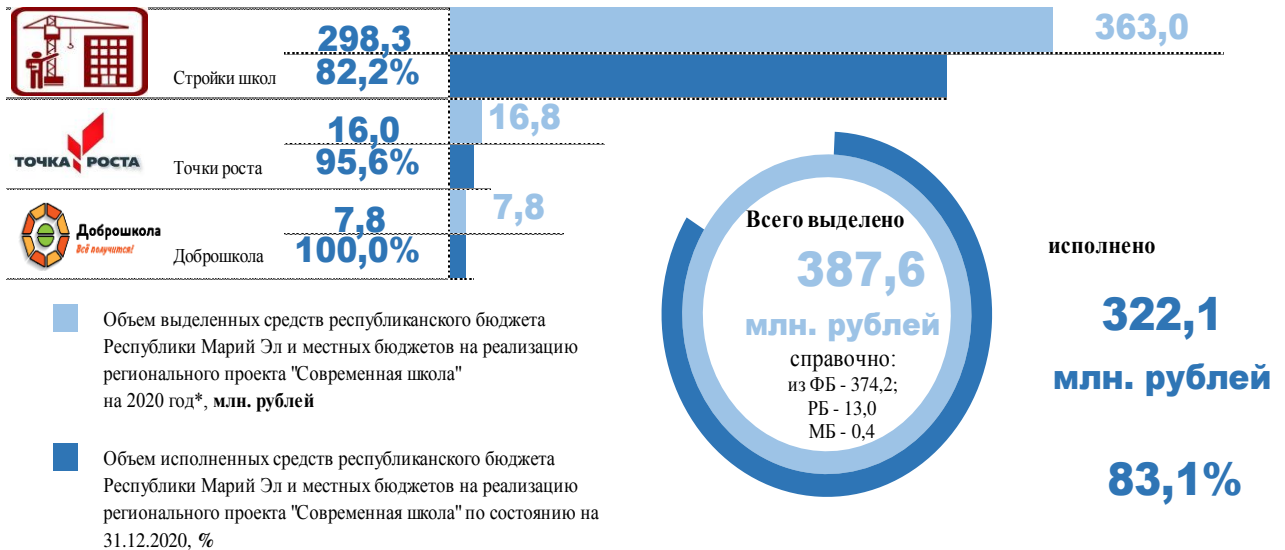

В 1 полугодии 2021 года в рамках всех 6 мероприятий, предусмотренных региональным проектом, заключены государственные (муниципальные) контракты, либо в Единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения о проведении закупок.

Вместе с тем, кассовое исполнение утвержденных бюджетных назначений по состоянию на 01.06.2021 было низким и составило 36,0 процента. Информация приведена на диаграмме № 3.

Диаграмма 3

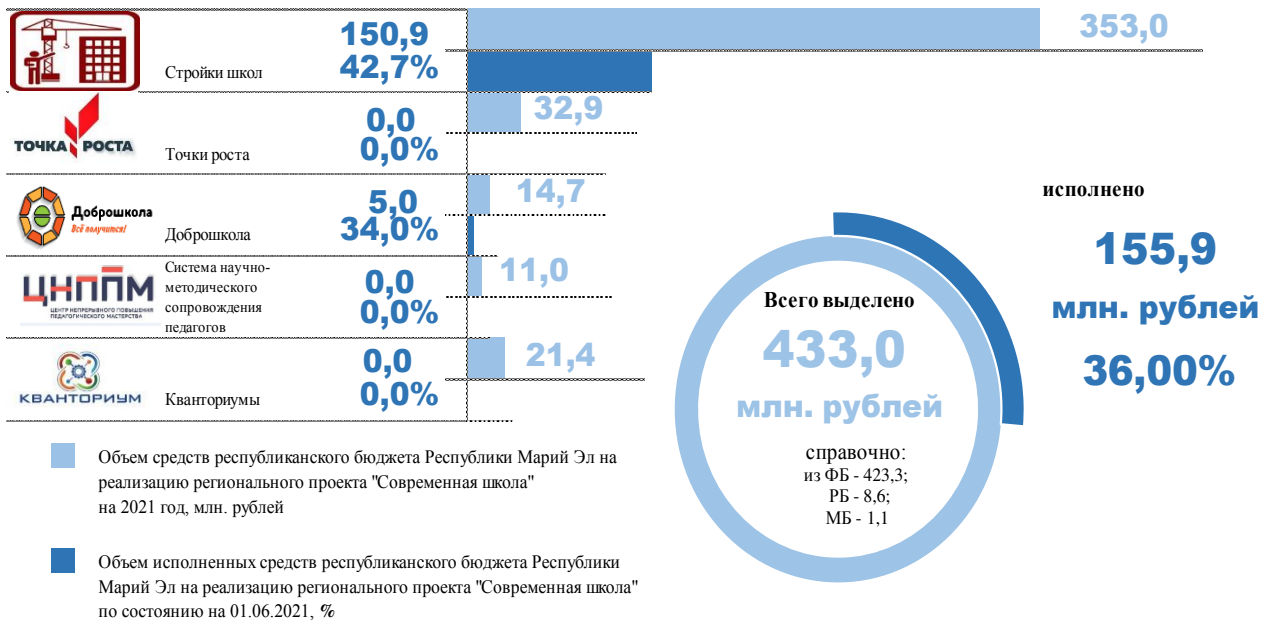

Исполнение заданных результатов регионального проекта в 2021 году по состоянию на 01.06.2021 в соответствии с Помесячным планом исполнения бюджета республики³⁸ составило по:

1) *строительству школ (код 55200)* - опережает план и составляет 104,1 % (150 559,96 тыс. руб.) от предусмотренных на 01.06.2021 расходов (144 590,35 тыс. руб.), и 56,1 % от предусмотренных расходов на 2021 год (268 329,18 тыс. руб.);

2) *проекту «Доброшкола» (код 51870)* - исполнено на 33,6 % (4 944,97 тыс. руб.) от расходов, предусмотренных на 01.06.2021 и на 2021 год (14 711,53 тыс. руб.);

3) не исполнялись результаты регионального проекта по:

3.1) *строительству школ в сельской местности (код 52300)* (предусмотрено на 01.06.2021 – 12 103,06 тыс. руб., на 2021 год – 83 531,73 тыс. руб.);

3.2) *созданию Центров «Точка роста» (код 51690)* (предусмотрено на 01.06.2021 и на 2021 год – 32 943,47 тыс. руб.);

3.3) *созданию детского технопарка «Кванториум» (код 51730)* (предусмотрено на 01.06.2021 и на 2021 год – 21 361,84 тыс. руб.);

3.4) *созданию Центра профессионального мастерства (код 54810)* (предусмотрено на 01.06.2021 и на 2021 год – 11 025,0 тыс. руб.).

(Причины несвоевременного достижения контрольных точек по мероприятиям регионального проекта в 2021 году см. приложение № 2 к Отчету).

Не освоение бюджетных средств в установленный срок и заданном объеме создает риски несвоевременного достижения результатов регионального проекта.

2.1. Использование средств на строительство школ (код 55200)

Реализация мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») осуществлялась в рамках соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 10.02.2019 № 073-09-2019-057 и от 19.12.2019 № 073-09-2020-907.

Уровень софинансирования расходов предусмотрен соглашениями в 2020 году – 92,0 %, в 2021 году – 98,0 процента.

Субсидии выделены в соответствии с Приложением № 3 к Правилам предоставления и распределения субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642³⁹.

Перечень объектов строительства, предусмотренных в соглашениях соответствует перечню объектов, включенных в Государственную программу

³⁸ Раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году» паспорта регионального проекта «Современная школа».

³⁹ Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

Республики Марий Эл, паспорт регионального проекта «Современная школа» и перечню, направленному в Министерство образования и науки Российской Федерации для участия в отборе.

В рамках соглашений бюджету республики из федерального бюджета в 2020 - 2021 годах выделены субсидии в 2020 году в сумме 350 092,9 тыс. рублей, 2021 году – 262 962,6 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета предусмотрены соглашениями: в 2020 году в сумме 7 144,8 тыс. рублей, в 2021 году - 5 366,6 тыс. рублей. Средства бюджетов муниципальных образований на 2020 год предусмотрены в сумме 357,3 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 268,3 тыс. рублей.

2.1.1. В 2020 году в рамках мероприятия осуществлялось строительство 2 объектов. Информация о стоимости строительства объектов представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

Наименование объекта строительства	Получатель субсидии	Реквизиты соглашения (номер/дата)	Объемы финансирования		Кассовые расходы на 01.06.2021 (тыс. руб.)	Отклонение кассовых расходов и ПОФ от утвержденных назначений (тыс. руб.)
			закон/решение о бюджете (тыс. руб.)	Доведенные до получателя (ПОФ) (тыс. руб.)		
2020 год						
Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в 9 «В» микрорайоне г. Йошкар-Олы (введена в эксплуатацию 07.08.2020)	Администрация ГО «Город Йошкар-Ола» (МКУ «ДМЗ»)	88701000-1-2019-002 от 13.03.2019 88701000-1-2020-005 от 19.02.2020	215 682,6 ФБ-211 157,7 РБ-4 309,4 МБ-215,5	188 253,1 ФБ-184 303,7 РБ-3761,3 МБ-188,1	188 253,1 ФБ-184 303,7 РБ-3761,3 МБ-188,1	-27 429,5 ФБ (-)26854,0 РБ (-)548,1 МБ (-)27,4
2 пусковой комплекс – учебный корпус для средней школы, спортзал, актовый зал, библиотека на 336 мест в г. Волжске (введен в эксплуатацию 17.11.2020)	Администрация ГО «Город Волжск»	88705000-1-2020-005 от 17.02.2020	141 912,4 ФБ-138 935,2 РБ-2835,4 МБ-141,8	106 000,1 ФБ-103 776,3 РБ-2 117,9 МБ-105,9	106 000,1 ФБ-103 776,3 РБ-2 117,9 МБ-105,9	-35 912,3 ФБ (-)35 158,9 РБ (-)717,5 МБ (-)35,9
Итого по 2020 году			357 595,0 ФБ-350 092,9 РБ-7 144,8 МБ-357,3	294 253,2 ФБ-288 080,0 РБ-5 879,2 МБ-294,0	294 253,2 ФБ-288 080,0 РБ-5 879,2 МБ-294,0	-63 341,8 ФБ (-)62 012,9 РБ (-)1 265,6 МБ (-)63,3

Проверка использования средств проведена по строительству средней общеобразовательной школы на 825 мест в 9 «В» микрорайоне г. Йошкар-Олы (далее - Школа № 31 в г. Йошкар-Оле).

Полномочия по администрированию⁴⁰ доходов местного бюджета, в части строительства Школы № 31 в г. Йошкар-Оле, были закреплены за

⁴⁰ Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23.12.2019 № 1171 «О передаче Министерством образования и науки Республики Марий Эл полномочий получателя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по перечислению межбюджетных трансфертов».

Муниципальным казенным учреждением «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – МКУ «ДМЗ») которое являлось заказчиком по строительству школы и оснащению ее учебно-технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем.

Информация о расходах за весь период строительства Школы № 31 в г. Йошкар-Оле, в том числе за 2020 год, в разрезе видов работ представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

№ п/п	Наименование видов работ	Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	
			всего	Уд. вес расходов
1	Проектно-изыскательские работы, всего,	5 452,6	3 518,3	0,9
	в том числе 2020 год	-	-	
2	Строительно-монтажные работы (муниципальный контракт от 22.10.2018 №188) всего, в том числе: учебное и технологическое оборудование, мебель и инвентарь	307 594,7	267 090,1	63,0
	в том числе 2020 год (Строительно-монтажные работы)	86 404,7	66 612,1	
3	Авторский надзор за строительством, всего	5 367,2	399,1	0,1
	в том числе 2020 год	5 367,2	379,1	
4	Приобретение учебного и технологического оборудования, мебели и инвентаря	129 277,8	121 640,9	36,0
	в том числе 2020 год	129 277,8	121 640,9	
	Итого	447 712,3	392 648,4	100
	в том числе 2020 год	221 049,7	188 632,1	

Реализация мероприятия по строительству Школы № 31 в г. Йошкар-Оле осуществлялась с 2016 по 2020 годы, с 2019 года строительство объекта осуществлялось в рамках регионального проекта по городскому округу «Город Йошкар-Ола».

Вместе с тем, в 2020 году расходы, относящиеся к расходам на реализацию регионального проекта, в части оплаты работ по осуществлению авторского надзора за строительством, в сумме 379,1 тыс. рублей (средства местного бюджета) были предусмотрены в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола», а МКУ «ДМЗ» произведены в рамках другого основного мероприятия муниципальной программы⁴¹. Применение КБК с нарушением статьи 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н⁴² влечет искажение данных о финансовом обеспечении регионального проекта «Современная школа».

⁴¹ Основное мероприятие «Введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (в т.ч. школьных стадионов)» подпрограммы «Комплексное развитие муниципальных учреждений в сфере образования городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденной постановлением Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл от 31.03.2016 № 471.

⁴² Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

2.1.1.1. Строительно-монтажные работы

На строительство Школы № 31 в г. Йошкар-Оле МКУ «ДМЗ» (Заказчик) с Закрытым акционерным обществом «Строительно-производственное предприятие «Салют» г. Йошкар-Ола (далее – ЗАО «СПП» Салют» (Подрядчик)) был заключен муниципальный контракт № 188 от 22.10.2018 (далее - муниципальный контракт № 188 от 22.10.2018).

Стоимость муниципального контракта № 188 от 22.10.2018, с учетом дополнительных соглашений, составила 267 090,1 тыс. рублей, срок выполнения работ до 1 августа 2020 года.

Технологическое и учебное оборудование, мебель и инвентарь, были приобретены:

- в рамках муниципального контракта № 188 от 22.10.2018 на общую сумму 19 866,0 тыс. рублей;
- в рамках 36 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 121 640,9 тыс. рублей.

По данным бюджетной отчетности МКУ «ДМЗ» за 2020 год дебиторская и кредиторская задолженности по расчетам за строительство и оснащение Школы №31 в г. Йошкар-Оле по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют.

Проектно-сметная документация на строительство объекта была подготовлена АО «Маригражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» (далее – АО «Маригражданпроект») с использованием проекта повторного применения: «Здание школы по пер. Прасовский, 5 в г. Ижевске», разработанного ПК «Агропромпроект» (г. Ижевск)⁴³, что соответствует условию, предусмотренному соглашениями о предоставлении средств из федерального бюджета⁴⁴.

На проектно-сметную документацию было получено положительное заключение экспертизы.

Вместе с тем, в ходе выполнения строительно-монтажных работ было установлено, что проектная документация, использованная при заключении контракта, не позволяла обеспечить соблюдение требований законодательства в области строительных работ, в том числе по:

- системе водоотведения и холодного водоснабжения;
- электрооборудованию;
- электроосвещению;
- тепловым сетям.

АО «Маригражданпроект» была скорректирована проектно-сметная документация на указанные виды работ, получено положительное заключение

⁴³ Ссылка на паспорт типового проекта <http://www.minstroyrf.ru/docs/10875/>.

⁴⁴ Соглашения на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10.02.2019 № 073-09-2019-057, от 19.12.2019 №073-09-2020-907.

экспертизы, в результате стоимость строительных работ увеличена на 5 544,0 тыс. рублей (с учетом НДС).

В дальнейшем, в связи с необходимостью выполнения обязательных работ, проектировщиком (АО «Маригражданпроект»), без внесения изменений в проектно-сметную документацию, были согласованы дополнительные работы еще на сумму 14 448,1 тыс. рублей (с учетом НДС).

В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация об указанных изменениях МКУ «ДМЗ» не направлена для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

Строительство Школы № 31 в г. Йошкар-Оле, согласно акту выполненных работ, завершено 07.08.2020. В указанный срок Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» подрядчику - ЗАО «СПП «Салют» было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что первоначально срок выполнения работ был предусмотрен муниципальным контрактом до 1 июля 2020 года, с учетом изменений - до 1 августа 2020 года. Проверкой установлено, что Подрядчиком неоднократно нарушался график выполнения отдельных видов работ. Отклонение сроков составляло от 19 до 235 дней.

Штрафные санкции за нарушение графика выполнения отдельных видов работ в адрес Подрядчика не направлялись. МКУ «ДМЗ» в адрес ЗАО «СПП Салют» было предъявлено требование об уплате пени за просрочку исполнения муниципального контракта только за 6 дней (с 01.08. по 07.08.2020) в сумме 10,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2021 пени подрядчиком не уплачены.

О соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям: энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, соблюдения технических условий по благоустройству и озеленению прилегающей территории, в адрес ЗАО «СПП Салют» соответствующими государственными органами выданы заключения. Согласно отчетам о проведении внутренней экспертизы товаров, работ, услуг замечаний или отклонений МКУ «ДМЗ» (Заказчик) не установлено.

Вместе с тем, контрольными осмотрами, проведенными в ходе проверки комиссиями, созданными по инициативе Государственной счетной палаты Республики Марий Эл (*фотоотчет представлен в приложении № 3 к Отчету*), установлены отклонения возведенного объекта, благоустройства и озеленения школьной территории от проектной документации и технических условий, а именно:

1. В оконные проемы здания школы вместо блоков оконных из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом были установлены деревянные стеклопакеты (в заключении о соответствии требованиям проектной документации, актах о приемке выполненных работ

(форма № КС-2), отчетах о проведении внутренней экспертизы товаров, работ указаны блоки оконные из поливинилхлоридных профилей).

В ходе осмотра руководством школы была предоставлена информация об обследовании здания «Тепловизором», проведенного силами самой школы, по результатам которого были установлены потери тепла под подоконниками примерно на 30,0 процента.

Кроме того, по результатам визуального осмотра окон было зафиксировано, что в стыках отдельных оконных блоков имеются дефекты в виде зазоров, стеклопакет одного окна имеет трещину. Наличие дефектов может повлечь их дальнейшее повреждение, что влечет риски дополнительных расходов по уходу, покраске и замене оконных блоков. Ручки для открывания окон, ограничители открывания окон отсутствовали, что является нарушением требований раздела «Архитектурные решения» проектной документации на строительство школы (том 3).

2. Коридоры 1-3 этажей школы оборудованы подвесными потолками.

Вместе с тем, проектно-сметной документацией предусмотрено, что потолки должны быть покрашены акриловой краской, что является нарушением раздела «Архитектурные решения» проектно-сметной документации (9396-АР Том № 3), раздела 4 локальной сметы на общестроительные работы, пункта 10 технического задания к муниципальному контракту.

Визуальный осмотр потолков показал, что из 138 помещений (учебные классы, туалеты, библиотека, актовый зал и др.), где потолки покрашены акриловой краской, в 66 помещениях (48,0 %) на потолках имеются растрескивания, в 10 помещениях следы подтеков.

3. Система вентиляции имела конструктивные недостатки, а именно вентиляционные каналы «П 7 и П 8» поменяны местами, в резьбовых соединениях 7 (семи) узлов регулирования отсутствовала герметичность.

В соответствии с пунктом 2.3.1. Свода правил по проектированию и строительству (СП) 2.4.3648-20 подвальные помещения зданий, строений, сооружений должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, *плесени* и грибка.

По результатам осмотра установлено, что в подвальном помещении на потолке и стенах комнаты хранения люминесцентных ламп, сантехнической арматуры имеется плесень. На первом этаже в кабинете начальных классов с двухуровневым потолком присутствует запах плесени, что позволяет сделать вывод о ненадлежащей вентиляции воздуха в помещениях здания школы.

С учетом позиции АО «Маригражданпроект», осуществлявшего подготовку сметной документации и авторский надзор, отсутствие герметичности в резьбовых соединениях вентиляционных камер является также следствием использования подрядчиком некачественных комплектующих и материалов.

ЗАО СПП «Салют» было оплачено за выполненные работы по устройству вентиляционной системы в сумме 9 665,6 тыс. рублей.

В ходе осмотра руководством школы была предоставлена информация о неоднократных обращениях, направленных в адрес МКУ «ДМЗ» и ЗАО «СПП Салют», о выявленных в ходе эксплуатации здания недостатках системы вентиляции, а также о том, что по результатам осмотра приборов системы противопожарного оповещения и вентиляции Управлением Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл было выявлено более десятка серьезных нарушений. Все проверенные системы не соответствовали установленным нормативам срабатывания, автоматическая система вентиляции не была подключена.

4. Спортивный газон футбольного поля школы состоит из 80,0 % утоптанной земли и 20,0 % редко растущей смеси трав, что не соответствует требованиям свода правил по проектированию и строительству (СП) 31-115-2006 «Открытые плоскостные сооружения», согласно которому травяное покрытие (спортивный газон) должно *быть низким, густым, устойчивым к вытаптыванию и частой стрижке, а также к засушливой и дождливой погоде.*

По данным Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) посев газонной травы на футбольном поле был выполнен ЗАО СПП «Салют» в период с 1 по 5 августа 2020 года, то есть за 6 дней до сдачи объекта в эксплуатацию. Согласно характеристике смеси семян «Газон «СПОРТСМЕН» средний срок прорастания семян составляет 14 дней.

В соответствии с Графиком выполнения работ срок выполнения работы по благоустройству территории составляет 618 дней, то есть указанные работы должны быть выполнены в срок до 1 июля 2020 года.

По пояснениям, представленным ЗАО СПП «Салют», при вводе школы в эксплуатацию спортивный газон был низким и густым.

Вместе с тем в силу биологических факторов прорастания смеси семян «Газон «СПОРТСМЕН» за 6 дней травяное покрытие спортивного газона не могло достичь технических характеристик, соответствующих СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные сооружения».

Подрядчику оплачено за выполненные работы по посеву газонных трав - 10,0 тыс. рублей, по благоустройству футбольного поля – 563,5 тыс. рублей.

5. На территории Школы имелись в наличии 312 декоративных кустарников (допущена пересортица сортов кустарников) и 59 деревьев - кленов остролистных высотой от 0,05 м до 1,15 м., (соответствует возрасту деревьев до 7 лет).

Вместе с тем, проектно-сметной документацией предусмотрена посадка декоративного кустарника в количестве 661 куста, 56 деревьев - кленов остролистных высотой от 1,5 м. до 2,0 м. (от 7 до 9 лет), что также указано в заключении о соответствии благоустройства и озеленения территории

требованиям технических условий, актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), отчетах о проведении внутренней экспертизы товаров, работ.

По пояснениям ЗАО СПП «Салют» саженцы кленов остролистных не закупались, а были выкопаны на территории подрядчика и пересажены на земельный участок школы. Отсутствие 349 кустарников обусловлено механическим их повреждением во время уборки снега в зимний период и отсутствием ограждения зоны посадки.

ЗАО СПП «Салют» было оплачено за выполненные работы по посадке деревьев в сумме 494,7 тыс. рублей (стоимость посадочного материала - 205,65 тыс. рублей), по посадке 349 кустарников - 77,1 тыс. рублей.

Вышеуказанные недостатки и дефекты свидетельствуют о некачественной приемке заказчиком строительно-монтажных работ и работ по благоустройству и озеленению территории, а также ненадлежащем контроле Инспекцией государственного строительного надзора Республики Марий Эл Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл при выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. В результате оплаты некачественно выполненных работ бюджетные средства использованы нерезультативно.

При наличии свободного остатка денежных средств по объекту ни администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», осуществляющей контроль за строительством школы, ни заказчиком не поднимались вопросы об изменении конструкции футбольного поля с учетом его расположения и будущей эксплуатацией и по проведению дополнительных мероприятий, позволяющих обеспечить сохранность произведенных посадок.

В результате контрольных осмотров также были зафиксированы многочисленные дефекты по другим конструктивным элементам здания и территории школы. Ввиду того, что на момент осмотра срок эксплуатации объекта составлял всего 7 месяцев, с учетом позиции АО «Маригражданпроект», осуществлявшего подготовку сметной документации и авторский надзор, можно сделать вывод, что установленные дефекты являются следствием некачественно выполненных строительных работ и приемки работ, в том числе:

1. Стены:

в 5 помещениях 1-го этажа на стенах имеются трещины, в отдельных местах длина трещин превышает 2 метра, ширина трещин превышает 5 мм. Трещина над дверями 3 помещений 1-го этажа – сквозная; на стенах имеются многочисленные растрескивания в 54 помещениях.

Согласно пояснениям АО «Маригражданпроект» растрескивания и трещины в стенах здания школы возникли вследствие *некачественной* перевязки кирпича, *некачественного выполнения работ*. Предварительной причиной

горизонтальных трещин в перегородках в 5 помещениях явилась *просадка плохо утрамбованного грунта*.

Наличие трещин создает риски необеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы.

2. Полы:

деревянный пол в помещениях снарядной и спортивного зала имеет щели, которые в отдельных местах достигают ширины в 1 см, что не соответствует требованиям пункта 4.29 раздела IV «Требования к зданию» СанПиН 2.4.2.2821-10 (полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений). По пояснениям проектировщика и подрядчика щели образовались по причине замачивания пола во время кровельных работ.

3. Двери:

в служебных помещениях столовой двери расслаиваются и не закрываются, количество дверей под замену – 8 штук, на дверях в 4 туалетах отсутствуют ручки и шпингалеты.

Кроме того, проверке представлен акт осмотра, проведенный представителем ИП Валишена Р.И., в отношении дверных защелок, установленных в дверях школы. Зафиксированы следующие дефекты дверных защелок: выпадение личинки, заедание при повороте ручки, открывание нескольких помещений одним ключом, отрыв шарообразной ручки от основания механизма.

4. Территория школы:

- калитка с правой стороны фасада – *перекошена и не закрывается*. Ворота, расположенные с правой стороны главного фасада *перекошены, нарушена возможность закрытия ворот на навесной замок*;

- поверхность спортивных площадок и беговых дорожек покрыта щебнем гранитным фракции 5-20 мм, в результате она рыхлая и подвижная, вместе с тем, АО «Маригражданпроект» письмом, направленным в адрес ЗАО СПП «Салют» и МКУ «ДМЗ», уточнило, что правильная фракция спецсмеси для спортивных площадок и беговых дорожек должна быть 4 - 7 мм. По указанной причине разметка, сделанная на спортивных площадках и беговых дорожках, практически *отсутствует*. Для соблюдения требований СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные сооружения» разметка на площадках должна постоянно обновляться, что влечет риски дополнительных затрат школы на приобретение красящих материалов и нанесение разметки;

- по периметру беговых дорожек и площадок стадиона с резиновым покрытием по краям уложены просмоленные доски. Согласно требованиям к устройству основания под покрытие «Эластур SBR» (Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» Том 2 Проектной документации) предусмотрено, что по внешнему периметру беговых дорожек и площадок стадиона устанавливаются алюминиевые бордюрные камни. Вместе с

тем, проектировщиком согласована вышеуказанная замена.

Замена алюминиевых бордюрных камней на просмоленные доски нарушает технологию устройства основания под резиновое покрытие, снижает период его использования, а в случае увеличения отслоений покрытия от основания площадок возникают риски дополнительных затрат на приведение площадок в нормативное состояние;

- на металлических элементах: рукоход, турник, брусья гимнастические, препятствие «стенка с двумя проломами», «забор с наклонной доской», «разрушенная лестница» имеется ржавчина, на препятствии «разрушенная лестница» отдельные деревянные элементы расслаиваются. Наличие указанных повреждений свидетельствует о низком качестве установленных объектов.

Кроме того, по данным руководства школы в адрес заказчика и подрядчика неоднократно направлялась информация о наличии следующих дефектов:

- на входных дверях в подвальное помещение отсутствует утеплитель;
- на задвижке вентиляции шахты лифта происходит активное выделение водного конденсата;
- водосточная система левого крыла протекает, вода скапливается на полу вестибюля 3-его этажа напротив библиотеки;
- в столовой умывальники установлены не горизонтально, в результате вода вытекает на пол помещения и пр.

По результатам материалов, направленных Государственной счетной палатой Республики Марий Эл по дефектам и недостаткам, выявленным в ходе осмотра здания школы, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл, Управлением постановлением о назначении административного наказания, должностное лицо школы привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам осмотров ЗАО СПП «Салют» (Подрядчик) устранило недостатки по потолкам, стенам, полам, подвальному помещению, системы вентиляции, посадке деревьев.

2.1.1.2. Оснащение технологическим и учебным оборудованием, мебелью и инвентарем

Стоимость технологического и учебного оборудования, мебели и инвентаря, приобретенного в рамках строительства Школы № 31 в г. Йошкар-Оле, составила 141 506,9 тыс. рублей.

Согласно информации МКУ «ДМЗ» по результатам исполнения контрактов (договоров) поставщикам оборудования были предъявлены требования об уплате неустойки за просрочку поставки оборудования в сумме 38 091,21 рублей. Неустойка оплачена поставщиками в полном объеме.

В отношении всего технологического оборудования, мебели и инвентаря МКУ «ДМЗ» проведена экспертиза и составлены экспертные заключения о соответствии поставленных товаров.

Вместе с тем, по результатам проведенного осмотра оборудования установлено, что в столовую школы поставлена подставка под пароконвектомат у которой отсутствуют уровни для размещения противней с пищей, что не соответствует модели, указанной в локальной смете на приобретение технологического оборудования и инвентаря проектно-сметной документации 02-01-20 (позиция № 152) и акту о приемки выполненных работ. По объяснениям кухонных работников это создает неудобства в процессе приготовления пищи.

В ходе проверки ЗАО СПП «Салют» (Подрядчик) произведена замена указанной подставки.

По работам, выполненным ЗАО СПП «Салют» (Подрядчик) ненадлежащим образом, МКУ «ДМЗ» (Заказчик) требования об уплате штрафов не предъявлялись. По данным проверки стоимость некачественно выполненных работ (в том числе подставки под пароконвектомат) составила 10 189,9 тыс. рублей, размер штрафа определен в сумме 1 335,5 тыс. рублей.

Согласно акту о приемке выполненных работ в школу поставлено 13 стеллажей кухонных на сумму 273,4 тыс. рублей и 22 стеллажа металлических на сумму 73,1 тыс. рублей.

По результатам осмотра установлено, что в столовой находилось всего 9 стеллажей, из них - 4 стеллажа кухонных на сумму 99,5 тыс. рублей и 5 стеллажей металлических на сумму 16,6 тыс. рублей. Стеллажи кухонные в количестве 9 штук на сумму 173,9 тыс. рублей находились за пределами столовой.

Конструкции стеллажей металлических и стеллажей кухонных, представленных к осмотру, визуальны изготовлены из одного и того же материала и имеют одинаковый внешний вид. Вместе с тем, стоимость стеллажей кухонных дороже в 6 раз стеллажей металлических. Таким образом, при отсутствии потребности в стеллажах кухонных объем израсходованных бюджетных средств на приобретение оборудования мог быть меньшим.

Средства обучения, приобретенные МКУ «ДМЗ» для оснащения Школы № 31 в г. Йошкар-Оле, соответствуют перечню средств обучения, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 30.03.2016 № 336⁴⁵ и приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465⁴⁶.

⁴⁵ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

⁴⁶ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

Стоимость оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания составила 171,5 тыс. рублей (141 506,9/825) и не превышает норматив, утвержденный вышеуказанными приказами Минобрнауки РФ в размере 178,0 тыс. рублей и 198,0 тыс. рублей соответственно.

На региональном уровне на базе утвержденного Минпросвещения России перечня перечень средств обучения и воспитания, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий регионального проекта, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания не разрабатывался (проверке Министерством не предоставлен).

В соответствии с распоряжениями Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – КУМИ) здание школы стоимостью 251 141,5 тыс. рублей, учебное и технологическое оборудование, мебель и инвентарь стоимостью 141 506,9 тыс. рублей принято в казну муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от МКУ «ДМЗ».

Распоряжениями КУМИ здание и имущество школы общей стоимостью 392 648,3 тыс. рублей закреплено на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы».

2.1.1.3. Оценка результата строительства школы

Согласно Комплексу мер⁴⁷ и в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета⁴⁸ строительство школы направлено для решения задач по выводу из двухсменного режима образовательного процесса общеобразовательных организаций города (в том числе по школам № 23 и 27 г. Йошкар-Олы).

Анализом изменения заполняемости общеобразовательных организаций в городе Йошкар-Оле, расположенных в непосредственной близости с построенной в 2020 году Школой № 31 в г. Йошкар-Оле, в связи с вводом ее в эксплуатацию, установлено следующее.

На момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе Республики Марий Эл (начало 2016/2017 учебного года) потребность в создании новых мест составляла 1 503 мест, на момент начала реализации регионального проекта «Современная школа» (начало 2018/2019 учебного года) - 1 160 новых мест, по результатам реализации регионального проекта (начало 2020/2021 учебного года) потребность в новых местах сохранилась и составила - 1 983 места.

⁴⁷ Постановление Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.03.2016 № 407 «Об утверждении комплекса мер (программ), направленных на создание новых мест в муниципальных образовательных организациях городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 – 2025 годы» (в ред. от 23.12.2016).

⁴⁸ Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Информация о численности учащихся, занимающихся во вторую смену приведена в таблице № 9.

Таблица № 9

Наименование общеобразовательной организации	нач. 2016/2017 учебного года	2018/2019 учебный год	2020/2021 учебный год
МБОУ «Средняя школа № 19»	526	363	711
МБОУ «Средняя школа № 23»	422	303	636
МБОУ «Средняя школа № 27»	555	494	393
МБОУ «Средняя школа № 31»	-	-	243
Всего:	1503	1160	1983

Таким образом, по итогам реализации регионального проекта, созданные за счет строительства школы № 31 в микрорайоне 9 «В» г. Йошкар-Ола новые места, не решили проблему вывода из двухсменного режима образовательного процесса общеобразовательных организаций города.

2.1.2. В 2021 году в рамках мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях осуществлялось строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова (далее – школа в пос. Медведево). Сметная (предполагаемая предельная) стоимость объекта составила 597 131,0 тыс. рублей. Дата достижения результата - 31.12.2022.

Объем финансирования на строительство объекта в 2021 году предусмотрен в сумме 268 597,5 тыс. рублей, в 2022 году - 267 159,4 тыс. рублей (для осуществления закупки и поставки учебного и технологического оборудования, мебели и инвентаря для оснащения школы). По состоянию на 01.06.2021 кассовые расходы составили 150 710,5 тыс. рублей (56,1 % от предусмотренных объемов финансирования).

Информация о стоимости строительства объекта в 2021 году представлена в таблице №10.

Таблица № 10

Наименование объекта строительства	Получатель субсидии	Реквизиты соглашения (номер/дата)	Объемы финансирования		Кассовые расходы на 01.06.2021 (тыс. руб.)	Отклонение кассовых расходов и ПФ от утвержденных назначений (тыс. руб.)
			закон/решения о бюджете) (тыс. руб.)	Доведенные до получателя (ПОФ) (тыс. руб.)		
Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в пос. Медведево (срок декабрь 2022 года)	Администрация Медведевского муниципального района	88628000-1-2020-003 от 17.01.2020	268 597,5 ФБ-262 962,6 РБ-5 366,6 МБ- 268,3	150 710,5 ФБ- 147 548,8 РБ-3 011,2 МБ-150,5	150 710,5* ФБ- 147 548,8 РБ-3 011,2 МБ-150,5	-117 887,0 ФБ (-) 115 413,8 РБ-(-)2 355,4 МБ-(-)117,8

Реализация мероприятия по строительству школы в пос. Медведево осуществляется с 2017 года в рамках муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в

муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район»⁴⁹. Принадлежность объекта строительства к региональному проекту «Современная школа» в муниципальной программе отсутствует.

Полномочия по администрированию доходов местного бюджета, в части строительства школы, закреплены за Администрацией Медведевского муниципального района Республики Марий Эл (далее – Администрация), которая является заказчиком строительства школы.

На строительство школы Администрацией (Заказчик) с Производственным кооперативом «Медведевская ПМК» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0108300011520000071 от 03.07.2020 (далее - муниципальный контракт № 0108300011520000071 от 03.07.2020). Стоимость муниципального контракта № 0108300011520000071 от 03.07.2020 составила 274 151,4 тыс. рублей, срок завершения строительства - 03.11.2021.

Проектно-сметная документация на строительство объекта была подготовлена АО «Маригражданпроект» с использованием проекта повторного применения: «Здание школы по пер. Прасовский, 5 в г. Ижевске», разработанного ПК «Агропромпроект» (г. Ижевск), что соответствует условию, предусмотренному соглашениями о предоставлении средств из федерального бюджета⁵⁰.

В целях определения состояния возводимого объекта, соответствия выполненных работ графику строительно-монтажных работ, предусмотренному муниципальным контрактом, проектной документации и актам выполненных работ, по инициативе Государственной счетной палаты Республики Марий был проведен осмотр строящегося здания школы в пос. Медведево.

Комиссией зафиксировано, что по состоянию на 08.06.2021 степень готовности объекта составила 61,9 %, работы по строительству объекта идут с опережением графика строительно-монтажных работ на 3,92 %.

Вместе с тем, объем работ, выполняемых с отставанием от графика строительно-монтажных работ, составил – 10 340,45 тыс. рублей (3,77 % цены контракта), в том числе:

- стоимость не выполненных работ, срок выполнения которых на дату осмотра истек - 1 187,3 тыс. рублей;

- стоимость работ, выполняемых с отставанием от графика - 8 123,0 тыс. рублей;

- стоимость не выполненных работ срок выполнения которых наступил – 1 030,15 тыс. рублей.

⁴⁹ Постановление администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 12.11.2013 № 1875 (в ред. постановления администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 26.08.2019 № 1151).

⁵⁰ Соглашения на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10.02.2019 № 073-09-2019-057, от 19.12.2019 № 073-09-2020-907.

Основными причинами задержки выполнения отдельных видов (этапов) работ, согласно пояснениям заказчика и подрядчика, явились:

- не полностью выполненные отделочные работы перед этапами работ по электроосвещению и монтажу тепловых сетей;
- согласование с АО «Маригражданпроект» (проектировщиком) изменений по монтажу электрооборудования, вносимых в проектно-сметную документацию.

Нарушение подрядчиком графика выполнения строительно-монтажных работ создает риски несвоевременного исполнения обязательств, принятых по муниципальному контракту № 0108300011520000071 от 03.07.2020.

2.2. Использование средств на строительство школ в сельской местности (код 52300)

Целью реализации результата регионального проекта за период с 2019 по 2024 годы является выполнение показателя по созданию 60 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе в 2021 году – 60 новых мест (дата достижения результата - 31.12.2021).

Паспортом регионального проекта предусмотрен объект: «Сардаяльская основная общеобразовательная школа в дер. Сардаял Мари-Турекского района» - 60 мест.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 10.02.2019 № 073-09-2019-188.

Уровень софинансирования расходов предусмотрен Соглашением в 2021 году – 98,0 процентов.

Субсидии выделены в соответствии с Приложением № 9 к Правилам предоставления и распределения субсидий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в 2021 году в сумме 81 861,1 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл предусмотрены Соглашением в 2021 году в объеме 1 670,6 тыс. рублей, местного - 83,5 тыс. рублей.

Кроме того, были дополнительно выделены средства на разработку проектно-сметной документации в 2020 году в объеме 1 339,4 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета - 1 326,0 тыс. рублей, местного – 13,4 тыс. рублей, в 2021 году из местного бюджета - 717,3 тыс. рублей (на получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз).

Объект строительства, предусмотренный Соглашением соответствует объекту, включенному в Государственную программу Республики Марий Эл, паспорт регионального проекта.

Заявка на участие в отборе на данный объект в Министерство просвещения России не направлялась. Как отмечено выше строительство школы в дер. Сардаял предусмотрено на основании поручения помощника Президента Российской Федерации В.Кожина, в связи с обращением жительницы Мари-Турекского муниципального района.

Для реализации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Министерством с *Администрацией Мари-Турекского муниципального района* заключило 3 соглашения:

- на разработку проектно-сметной документации⁵¹;
- на строительство школы в дер. Сардаял от 21.11.2019⁵²;
- на строительство школы в дер. Сардаял от 30.09.2021 № 1 (на бумажном носителе).

Соглашение от 30.09.2021 № 1 было заключено в ходе проверки в целях устранения выявленных Государственной счетной палатой Республики Марий Эл рисков нецелевого использования бюджетных средств на сумму 83 615,3 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета 81 861,1 тыс. рублей.

На разработку проектно-сметной документации на строительство школы в дер. Сардаял Администрацией Мари-Турекского муниципального района в 2020 году было заключено 4 договора на общую сумму 1 132,9 тыс. рублей (средства республиканского бюджета – 1 121,6 тыс. рублей, местного – 11,3 тыс. рублей), в том числе:

- с единственным поставщиком (ИП Дубцовым Г.А.) - 3 договора, из них 2 договора на выполнение проектно-сметной документации на сумму 500,0 тыс. рублей и 1 договор на инженерные изыскания на сумму 300,0 тыс. рублей;

- с Государственным бюджетным научным учреждением при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.А. Васильева» на выполнение: научно-исследовательских археологических работ на сумму 332,9 тыс. рублей.

Оплата по договорам произведена в полном объеме в сумме 1 132,9 тыс. рублей.

В 2021 году 1 договор с Автономным учреждением Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проведение государственной

⁵¹ Соглашение на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги от 29.06.2020 № 1/1.

⁵² Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования в Республике Марий Эл на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2025 годы, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 21.11.2019 № 88624000-1-2019-011 посредством ГИИС «Электронный бюджет».

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектных изысканий на сумму 717,3 тыс. рублей (местный бюджет).

Проверкой соблюдения законодательства о контрактной системе установлены нарушения (недостатки) в части:

1) определения в договорах условий оплаты товаров, работ (услуг). В 3 договорах с ИП Дубцовым Г.А. не определен срок выплаты аванса в размере 30%;

2) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). В отношении одного объекта - строительства школы в дер. Сардаял, у ИП Дубцова Г.А. осуществлена закупка работ на выполнение проектно-сметной документации и инженерных изысканий на общую сумму 800,0 тыс. рублей без проведения конкурентных процедур, путем заключения 3 договоров со сроком заключения и исполнения в течение одного календарного периода времени;

3) сроков оплаты по договорам от 32 до 63 календарных дней. Допущено нарушение сроков оплаты по договору на научно-исследовательские археологические работы на 39 календарных дней, по причине несвоевременного доведения Министерством до Администрации предельных объемов финансирования в сумме 99,9 тыс. рублей. По договору на проведение государственной экспертизы авансовый платеж в размере 215,2 тыс. рублей произведен на 32 календарных дня позже установленного договором срока; окончательный расчет в сумме 502,1 тыс. рублей произведен на 63 календарных дня позже установленного договором срока, по причине отсутствия средств в бюджете муниципального образования.

В связи с задержкой исполнения работ (услуг) по трем договорам на срок от 41 до 55 календарных дней Администрацией Мари-Турекского муниципального района выставлено ИП Дубцову Г.А. требование об уплате неустойки (пени) на общую сумму 6 166,67 рублей. По состоянию на 01.06.2021 неустойка (пени) не оплачена.

В соответствии с требованием Порядка по проведению проектных и изыскательских работ⁵³ достижением значения результата использования субсидий является «разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации».

Результатом использования средств субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии на проектные и изыскательские работы должна являться разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной

⁵³ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг объектов капитального строительства муниципальной собственности, создаваемых в рамках реализации национальных проектов и указанных в паспортах региональных проектов».

документации.

Ввиду получения заключения государственной экспертизы в 2021 году Администрацией Мари-Турекского района в 2020 году не достигнуто значение результата использования средств в рамках Соглашения на разработку проектно-сметной документации на сумму 1 132,9 тыс. рублей.

Недостижение результата в рамках указанного Соглашения является следствием того, что: Соглашение было заключено при отсутствии Порядка по проведению проектных и изыскательских работ, а после его принятия не приведено в соответствие с указанным порядком; Министерством предоставлена субсидия в размере, не позволяющем обеспечить достижение вышеуказанного результата.

Министерством средства субсидии выделены Администрации на основании писем, направленных администрацией в адрес Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл А.А.Сальникова от 24.04.2020 № 1103, Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютина от 24.04.2020 № 1104 и на основании бюджетной заявки на разработку проектно-сметной документации на сумму 1 326,00 тыс. рублей, направленной в Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл. В соответствии с приложенной к бюджетной заявке сметой на общую сумму 1 326,0 тыс. рублей на 2020 год расходы на проведение государственной экспертизы не предусматривались.

Главой администрации Мари-Турекского муниципального района 13.01.2020 утвержден План мероприятий («Дорожная карта») на строительство школы в дер. Сардаял в 2021 году, который согласован с министром образования и науки Республики Марий Эл.

Несвоевременное заключение контрактов на разработку проектно-сметной документации, несвоевременное их выполнение, отсутствие денежных средств в бюджете муниципального образования повлияли на своевременность получения положительной экспертизы, без которой размещение конкурсной документации в единой информационной системе в сфере закупок невозможно.

При установленном сроке выполнения «проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг» - **ноябрь 2020 года**, заключения контракта на строительство школы в дер. Сардаял – **май 2021 года**, фактически работы выполнены по: «Научно-исследовательским археологическим работам» - 03.09.2020, «Проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги (разработка и экспертиза проектно-сметной документации)» - 19.04.2021 (срок положительной экспертизы), контракт на строительство заключен - 17.06.2021.

Согласно проектно-сметной документации строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» дер. Сардаял Мари-Турекского района» включает в себя школу на 60 мест и дошкольную группу на

20 мест, сметная стоимость строительства в соответствии с положительным заключением экспертизы составляет 183,9 млн. рублей.

По результатам электронного аукциона с ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» заключен муниципальный контракт от 17.06.2021 № 4 на строительство объекта: «Сардаяльская основная общеобразовательная школа в дер. Сардаял Мари-Турекского района» (далее – контракт от 17.06.2021 № 4), цена которого составила 140 956,7 тыс. рублей, оплата работ контрактом предусмотрена в 2021 году – 83 615,3 тыс. рублей; 2022 году – 57 341,4 тыс. рублей.

По результатам проверки Администрацией Мари-Турекского района по контракту от 17.06.2021 № 4 в Единой информационной системе в сфере закупок изменена Информация о заключенном контракте (его изменении) от 01.10.2021 в части разделения суммы платежей на 2022 год на школу и дошкольную группу.

Муниципальный контракт заключен на месяц позднее срока, предусмотренного контрольной точкой Дорожной карты по строительству школы в дер. Сардаял – 20.05.2021, в результате срок строительства объекта сократился с **7,5** месяцев, до **6,5** месяцев. При этом согласно данным положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство школы в дер. Сардаял продолжительность строительства определена в **10 месяцев**.

Техническим заданием к контракту от 17.06.2021 № 4 предусмотрено, что монтаж технологического оборудования должен быть осуществлен не в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией. Подрядчик должен выполнить монтаж технологического оборудования только по части 1 локальной сметы ЛС 02-01-11⁵⁴.

Принимая во внимание, что согласно условиям контракта от 17.06.2021 № 4 ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» не должен поставлять и монтировать оборудование, указанное в части 2 локальной сметы, возникают риски не достижения результата по созданию новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, оснащенных средствами обучения и воспитания, и соответственно влечет риск неисполнения показателя регионального проекта «Современная школа» и условий Соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета.

По состоянию на 27.10.2021 Администрацией Мари-Турекского муниципального района в Единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения о проведении электронного аукциона:

- от 07.10.2021 на приобретение лабораторного комплекса для учебной практической и проектной деятельности по физике и химии (на стадии

⁵⁴ Локальная смета ЛС 02-01-11 состоит из двух частей: 1 - включает санитарно-гигиеническое оборудование, оборудование столовой; 2 - включает в себя столы ученические, компьютерную технику, стеллажи и иное оборудование для общеобразовательной школы, а также оборудование для детского сада.

подписания контракта с победителем (ООО «Медиал групп») на сумму 1 128,5 тыс. рублей);

- от 26.10.2021 на поставку мебели для оснащения медицинского кабинета Сардаяльской основной общеобразовательной школы с начальной (максимальной) ценой контракта 126,4 тыс. рублей.

2.3. Проверка иных расходов, произведенных в рамках регионального проекта «Современная школа»

В соответствии с заявкой городского округа «Город Козьмодемьянск» *Администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл* Министерством по Соглашению предоставлена субсидия из республиканского бюджета на проведение проектных и изыскательских работ на строительство школы в г. Козьмодемьянске на 825 мест (проектирование) в размере 2 882,2 тыс. рублей, средства местного бюджета предусмотрены в размере 29,1 тыс. рублей (Соглашением предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 040,5 тыс. рублей, в том числе субсидии – 4 000,0 тыс. рублей).

Данный объект и его финансовое обеспечение в паспорте регионального проекта отсутствуют.

За счет средств субсидии из республиканского бюджета оплачены:

1) работы по разработке проектно-сметной документации на строительство школы в г. Козьмодемьянске на 825 мест (привязка с переработкой проекта повторного применения) на общую сумму 2 320,0 тыс. рублей ООО «СтройКрафт» (г. Чебоксары) по контракту от 18.09.2020;

2) выполнение инженерных изысканий на строительство школы в г. Козьмодемьянске на 825 мест (автономная блочно-модульная котельная) на общую сумму 591,3 тыс. рублей ООО «СтройКрафт» (г. Чебоксары) договор от 01.12.2020.

Договором с ООО «СтройКрафт» (г. Чебоксары) от 01.12.2020 изменены условия муниципального контракта от 18.09.2020, а именно произведена замена централизованного теплоснабжения на автоматизированную блочно-модульную котельную. Информация об изменении условий контракта не направлена для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, что является нарушением пункта 8 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Государственная экспертиза проектной документации не проводилась, лимиты бюджетных обязательств на 2020 и 2021 годы в бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на экспертизу проекта не предусмотрены.

Необходимо отметить, что в случае не заключения финансового соглашения с Министерством просвещения России на создание новых мест в городе Козьмодемьянске существует риск неэффективного использования

средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».

2.4. Использование средств на создание и функционирование центров «Доброшкола» (код 51870)

В рамках реализации мероприятия до 2024 года планируется обновление материально-технической базы в 8 из 9 функционирующих в Республике Марий Эл общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Вместе с тем, в Реестр отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, - участников мероприятия 1.2 федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020-2024 годах, утвержденный 09.10.2019 заместителем министра просвещения Российской Федерации Т.Ю.Сенюгиной⁵⁵, включены только 5 общеобразовательных организаций, перечень приведен в таблице № 11.

Таблица № 11

Участники мероприятия (коррекционные школы)				
2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023-2024 г.	Всего
ГБОУ РМЭ «Козьмодемьянская школа-интернат» (109 обучающихся)	ГБОУ РМЭ «Косолаповская школа- интернат» (107 обучающихся)	ГБОУ РМЭ «Русскошойская школа- интернат» (58 обучающихся)	-	5
	ГБОУ РМЭ «Нартаская школа-интернат» (96 обучающихся)	ГБОУ РМЭ «Савинская школа-интернат» (146 обучающихся)		

Для реализации результата регионального проекта бюджету республики из федерального бюджета выделены субсидии в рамках соглашений: от 22.12.2019 № 073-09-2020-310 в 2020 году в сумме 7 658,8 тыс. рублей; от 25.12.2020 № 073-09-2021-107 в 2021 году в сумме 14 417,3 тыс. рублей.

Средства республиканского бюджета предусмотрены соглашениями в 2020 году в объеме 156,3 тыс. рублей, в 2021 году в объеме 294,2 тыс. рублей. Средства бюджетов муниципальных образований не предусмотрены.

Уровень софинансирования предусмотрен – 98,0 процента. Даты достижения результата – 31.12.2020, 31.12.2021.

Субсидии выделены в соответствии с Приложением № 5 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

2.4.1. В 2020 году в рамках мероприятия была создана 1 «Доброшкола» в ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат», с которым

⁵⁵ <https://docs.edu.gov.ru/document/0d1f1a619cb261c0936c53abbbb84162/download/3617>.

Министерством было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на иные цели на сумму 7 815,1 тыс. рублей.

ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» за счет средств субсидии заключило 5 контрактов по результатам электронных аукционов на сумму 3 883,1 тыс. рублей и 22 договора с единственным поставщиком на сумму 3 932,0 тыс. рублей, всего на общую сумму 7 815,1 тыс. рублей.

Результатом использования средств субсидии стало оснащение оборудованием и средствами обучения 6 мастерских, 16 кабинетов, сенсорной комнаты, спортивного зала (фотоотчет приведен в приложении № 4 к Отчету), в том числе:

1 мастерской строительного профиля (штукатурно-малярное дело): 70 ед. строительного оборудования и инструментов;

2 швейных мастерских: 20 столами и 22 стульями, 18 швейными машинами, швейно-вышивальной машиной, 3 оверлоками, 8 манекенами, интерактивной доской, 36 ед. прочего оборудования и инструментов.

1 кабинета социально-бытовой ориентировки: 27 ед. кухонного оборудования;

1 обувной мастерской: 8 комплектами профессиональных обувных инструментов и учебниками по обувному делу, 8 швейными машинами для ремонта обуви, 9 верстаками и табуретами, 5 ед. оборудования для ремонта обуви;

2 столярных мастерских: 4 токарно-копировальными и вертикально-сверлильными станками, 5 станками для заточки инструментов, 21 ед. электроинструментов, 16 верстаками, 4 тисками, 112 ед. ручного инструмента, интерактивной доской;

1 кабинета картонажное дело (при библиотеке): 5 ед. оборудования для скрепления документов, шредером;

1 кабинета педагога-психолога: профессиональным столом психолога-дефектолога, 3 ед. набора-психолога (игровыми наборами);

1 кабинета учителя-логопеда: 5 альбомами для логопеда и наборами на носителе флэш-карте;

4 кабинетов начальных классов: 60 комплектами обучающих игр, 2 интерактивными досками, 4 принтерами;

1 спортивного зала и 1 кабинета ЛФК: 255 ед. спортивного оборудования;

1 компьютерного класса с фото/видео студией: 12 компьютерами, 2 ноутбуками, интерактивной доской, 4 многофункциональными устройствами (МФУ), принтером, зеркальной фотокамерой с картой памяти;

1 кабинета биологии: 8 электронными микроскопами, 8 партами и 16 стульями;

2 кабинетов русского языка, 2 кабинетов математики: 32 партами и 64 стульями.

1 кабинета истории: 8 партами и 16 стульями, интерактивной доской;

1 музыкального класса: электрогитарой с комбоусилителем и гитарным процессором, синтезатором со стойкой клавишной, ноутбуком, 13 ед. акустического и коммуникативного оборудования;

1 сенсорной комнаты: 1000 шариками для бассейна.

Нарушений своевременности и полноты оприходования оборудования и средств обучения не установлено. Приказом учреждения определены места установки и ответственные за его использование и сохранность.

В ходе контрольного мероприятия проведен осмотр помещений (учебных кабинетов), оборудования и средств обучения, по результатам которого установлено, что оборудование и средства обучения имелись в наличии в удовлетворительном состоянии, из которых 115 единиц не эксплуатировалось, в том числе спортивное оборудование, имелись отклонения от дизайн-проекта в оформлении отдельных помещений.

Согласно пояснениям директора учреждения, спортивное оборудование в количестве 5 единиц не использовалось по причине требующегося ремонта в спортивном зале. Оборудование в мастерских не использовалось по причине наличия в рабочем состоянии старого оборудования и обеспечения сохранности нового.

По результатам проверки ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» сообщило, что спортивное оборудование в количестве 5 единиц установлено после проведения ремонта в спортивном зале, остальное оборудование также используется согласно учебному плану.

Согласно Методическим рекомендациям по обновлению материально - технической базы⁵⁶ на базе учреждения создан Ресурсный центр по сопровождению образовательных организаций города Козьмодемьянска и Горномарийского района республики, педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ, обеспечения условий для решения проблем инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, по разработке методических материалов по проблемам инклюзивного образования. О работе Ресурсного центра представлены отчеты, а также договоры о сотрудничестве с муниципальным общеобразовательным учреждением «Лицей г. Козьмодемьянска» и с муниципальной организацией дополнительного образования «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» на осуществление указанного сотрудничества.

⁵⁶ Методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2019 № Р-117.

ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» в рамках реализации мероприятий осуществляло публикации о ходе реализации в СМИ и на интернет ресурсах⁵⁷.

2.4.2. В 2021 году по состоянию на 01.06.2021 Министерством в рамках соглашений о предоставлении субсидий на иные цели доведены до получателей средства субсидии в общей сумме 4 944,97 тыс. рублей или 33,6 % от запланированного на 01.06.2021 объема средств (14 711,5 тыс. рублей), в том числе:

- ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» на общую сумму 1 841,0 тыс. рублей;

- ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская школа-интернат» на общую сумму 3 103,97 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия по документам, предоставленным Министерством проведены проверки соблюдения порядка и условий предоставления в 2021 году субсидий на иные цели (в части соответствия соглашений типовой форме, сроков перечисления субсидий) установлены нарушения Министерством графиков перечисления субсидий (нарушения отражены в вопросе 1 настоящего Отчета).

2.5. Использование средств на создание и функционирование Центров «Точка роста» (код 51690)

Региональным проектом предусмотрено мероприятие, направленное на создание Центров «Точка роста», с целью создания условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ.

Бюджету республики из федерального бюджета выделены субсидии в рамках соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 22.12.2019 № 073-09-2020-310 в 2020 году в сумме 16 420,7 тыс. рублей и от 25.01.2021 № 073-09-2021-107 в 2021 году в сумме 32 284,6 тыс. рублей.

Средства республиканского бюджета предусмотрены соглашениями: в 2020 году в объеме 335,1 тыс. рублей, в 2021 году в объеме 658,9 тыс. рублей. Средства бюджетов муниципальных образований не предусмотрены.

Субсидии выделены в соответствии с Приложением № 5 к Правилам предоставления и распределения субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

Уровень софинансирования предусмотрен – 98,0 процента.

Приказами Минобрнауки Республики Марий Эл от 26.09.2019 № 855 и от 18.12.2020 № 942 определен перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых

⁵⁷ https://m.vk.com/video-173408139_456239150?list=7a016a9f435775b22f&from=wall-173408139_900, https://vk.com/wall-23221184_49435, https://vk.com/wall-91124049_1454, https://vk.com/wall-173408139_4414.

планируется создание Центров «Точка роста» в 2020-2021 годах, согласно которому участниками мероприятий являлось в 2020 году – 15 общеобразовательных учреждений, в 2021 году – 21, всего 36 общеобразовательных учреждений, из них 34 муниципальных общеобразовательных учреждения, расположенные в 15 муниципальных образованиях, 2 общеобразовательных учреждения, подведомственных Министерству, в том числе в 2020 году - ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш», в 2021 году - ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных предметов».

Создание Центров «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательных организаций в части оснащения оборудованием и средствами обучения в соответствии с утвержденными проектами зонирования и дизайн-проектами помещений под Центры «Точка роста».

Для определения необходимого комплекта оборудования и средств обучения Минобрнауки Республики Марий Эл на основании типового дизайн-проекта помещений под Центры «Точка роста» составлены Инфраструктурные листы для создания (обновления) материально-технической базы общеобразовательных организаций.

В 2020 году Инфраструктурный лист для 15 общеобразовательных организаций республики формировался из одинаковых комплектов оборудования и средств обучения, без учета численности обучающихся, вместе с тем, в этих общеобразовательных организациях численность обучающихся варьировалась от 199 до 1146 человек.

Согласно Инфраструктурному листу на 2021 год предусмотрено несколько направлений: «Стандартный комплект» и «Стандартный комплект (малокомплектная школа)», «Профильный комплект база» и «Профильный комплект база (малокомплектная школа)».

Вместе с тем, инфраструктурные листы для оснащения 21 общеобразовательной организации предусматривают оснащение комплектами оборудования⁵⁸:

- для 13 общеобразовательных организаций (с числом обучающихся от 45 до 1149 учеников) – **«Стандартный комплект»**;

для 8 общеобразовательных организаций (с числом обучающихся от 170 до 1153 учеников) – **«Профильный комплект база»**.

При оформлении (согласовании) инфраструктурных листов, проектов зонирования и дизайн-проектов помещений под Центры «Точка роста» Министерством не учитывалась численность обучающихся каждого

⁵⁸ В соответствии с Реестром образовательных организаций, оснащаемых стандартным комплектом оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, утвержденным министром образования и науки Республики Марий Эл от 23.03.2021.

образовательного учреждения и не проводилась корректировка состава оборудования исходя из фактической потребности образовательных учреждений.

В 2020 году Министерством в рамках Соглашения⁵⁹ доведены ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» средства субсидии на иные цели в общем объеме 16 025,2 тыс. рублей.

В рамках Соглашения ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» заключены:

- 6 контрактов, согласно которым поставка оборудования и средств обучения осуществлялась в ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» и по 14 адресам муниципальных (бюджетных) общеобразовательных учреждений;

- 6 договоров с единственным поставщиком, согласно которым поставка оборудования и средств обучения осуществлялась в ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш».

Из условий контрактов (договоров) на приобретение оборудования и средств обучения для создания Центров «Точка роста», заключенных по результатам централизованной закупки, следует, что учреждение осуществляло закупки для себя и 14 муниципальных общеобразовательных организаций, а также их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты (*нарушения отражены в вопросе 1 настоящего Отчета*).

Проверкой установлены нарушения (недостатки) в части определения в договорах (контрактах) условий оплаты и поставки товаров, работ (услуг), а именно в 4 договорах с единственным поставщиком не определен срок выполнения обязательств заказчика о предоплате в размере 30%; в 3 договорах не определен срок поставки товара.

При исполнении обязательств по 5 договорам (контрактам) поставщиками нарушались сроки поставки оборудования и средств обучения от 9 до 106 календарных дней. ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» направлены требования об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения договоров (контрактов) на общую сумму 70,1 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783⁶⁰ учреждением произведен отзыв требований на перечисление неустойки (пени).

За счет средств субсидии на иные цели, выделенной ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» в 2020 году, оснащено 15 Центров «Точка роста» комплектом оборудования и средств обучения, состоящим из: печатающего 3D принтера с 10 кг филамента для него, печатающего устройства, 10 ноутбуков, 34 ед. аккумуляторного и ручного инструмента, шлема и ноутбука

⁵⁹ Соглашение о порядке и условиях предоставления из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидий на иные цели от 22.04.2020 № 20-2020-02033.

⁶⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом».

виртуальной реальности с фотограмметрическим программным обеспечением, 4 квадрокоптеров, смартфона, 3 практических пособий для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школах, 3 комплектов шахмат, 6 учебных тренажеров по изучению основ безопасности жизнедеятельности и оказанию первой помощи, 3 шахматных столов с 6 стульями, 6 столов с 12 стульями, 6 кресел-мешков «Груша».

Передача ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» приобретенного оборудования и средств обучения в муниципальные (бюджетные) общеобразовательные учреждения произведена по 14 договорам безвозмездного хранения с муниципальными (бюджетными) общеобразовательными учреждениями, по актам приема-передачи имущества.

В августе-сентябре 2020 года 14 администраций муниципальных районов направили в Минобрнауки Республики Марий Эл письма с согласием получить в муниципальную собственность оборудование и средства обучения для создаваемых Центров «Точка роста».

На основании Распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 11.11.2020 № 518-р «О безвозмездной передаче имущества государственной собственности Республики Марий Эл в муниципальную собственность муниципальных образований в Республике Марий Эл», Актом о приеме передачи объектов нефинансовых активов от 14.12.2020 № 00000001 ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» передало Министерству государственного имущества Республики Марий Эл 14 комплектов оборудования и средств обучения на общую сумму 14 956,85 тыс. рублей.

По передаточным актам от 14.12.2020 Министерство государственного имущества Республики Марий Эл передало в собственность администраций муниципальных районов Республики Марий Эл по 1 комплекту оборудования и средств обучения стоимостью по 1 068,35 тыс. рублей, в том числе администрациям муниципальных районов: Юринского, Сернурского, Параньгинского, Волжского, Звениговского, Килемарского, Куженерского, Мари-Турекского, Моркинского, Новоторъяльского, Оршанского, Медведевского, Советского и городского округа «Город Козьмодемьянск».

Администрации муниципальных образований на основании издаваемых ими распоряжений передали оборудование и средства обучения в общеобразовательные учреждения по актам приема-передачи объектов основных средств.

В ходе контрольного мероприятия *проведены осмотры помещений (учебных кабинетов), оборудования и средств обучения в ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» и в 5 муниципальных (бюджетных) общеобразовательных учреждениях. (фотоотчет по результатам осмотров приведен в приложении № 5 к Отчету).*

По результатам осмотра установлено следующее.

Приобретенные в рамках регионального проекта оборудование и средства обучения имелись в наличии, находились в удовлетворительном состоянии, эксплуатировались, за исключением 2 единиц оборудования: квадрокоптер (поврежден корпус) в МБОУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 2» и 3D принтер (отсутствовал по причине нахождения на ремонте) в МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа».

Помещения (учебные кабинеты) в муниципальных учреждениях соответствовали дизайн-проектам, адаптированным под помещения этих учреждений.

Оформление помещений в ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» не в полной мере соответствует типовому дизайн-проекту, имеются отклонения в части оформления пола (предусмотрен линолеум, фактически уложена плитка), мебели и оборудования, цветового оформления стен, а также площади помещений (типовым дизайн-проектом предусмотрены два помещения площадью 71 м² и 32 м², фактически реализовано в помещениях площадью 54 м² и 60 м² соответственно).

В 2021 году Министерством в рамках Соглашения⁶¹ доведены ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» средства субсидии на иные цели в общем объеме 32 943,5 тыс. рублей. Вместе с тем, в 2021 году учреждение не является участником мероприятия (нарушения отражены в вопросе 1 настоящего Отчета).

По состоянию на 15.07.2021 ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» в Единой информационной системе в сфере закупок размещено 6 извещений о проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контрактов на общую сумму 32 778,2 тыс. рублей, по которым заключено 6 контрактов на общую сумму 31 357,1 тыс. рублей. По результатам проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств составила 1 421,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.06.2021 ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» кассовые расходы не производились.

Согласно условиям контрактов, товар поставляется Поставщиком посредством доставки и передачи Заказчику по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Ургакш, ул. Новостройка, д. 4 «б» (ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»).

В ходе проверки Государственной счетной палатой Республики Марий Эл в 20 муниципальных (бюджетных) общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл и 1 подведомственное учреждение Министерства направлены запросы о предоставлении документов, подтверждающих создание Центров «Точка роста».

⁶¹ Соглашение о порядке и условиях предоставления из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидий на иные цели от 25.01.2021 № 20-2021-01438.

Общеобразовательные учреждения сообщили, что по состоянию на 09.08.2021 в школах завершались ремонтные работы по подготовке помещений, ожидалась поставка оборудования и средств обучения, дизайн-проекты, адаптированные под помещения учреждений, разработаны. Центры «Точки роста» созданы в виде структурного подразделения общеобразовательной организации, утверждены Положения о Центре «Точка роста» и штатные расписания.

Методическими рекомендациями по созданию и функционированию Центров «Точка роста»⁶² предусмотрено, что субъект Российской Федерации обязан обеспечить наличие бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности Центров «Точка роста» (в том числе созданных и функционирующих ранее).

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 02.07.2019 № 298-р предусмотрены расходы на функционирование Центров «Точка роста» из расчета 3 062,41 тыс. рублей в год, в том числе 2 821,41 на оплату труда с отчислениями (с последующей индексацией) на 1 образовательную организацию. Объем бюджетных ассигнований, необходимый на функционирование 36 Центров «Точка роста» в проверяемом периоде должен быть предусмотрен в размере - **82 685,07 тыс. рублей**, в том числе на оплату труда с отчислениями – 76 178,07 тыс. рублей, из них:

на 2020 год - **15 312,05 тыс. рублей**, в том числе на оплату труда с отчислениями - 14 107,05 тыс. рублей (15 Центров «Точка роста» x 4 мес.),

на 2021 год – **67 373,02 тыс. рублей**, в том числе на оплату труда с отчислениями – 62 071,02 тыс. рублей ((15 Центров «Точка роста» (созданных в 2020 году) x 12 мес.) + (21 Центр «Точка роста» (созданных в 2021 году) x 4 мес.).

Согласно информации Министерства по состоянию на 12.08.2021 фактически предусмотрено средств на функционирование 36 Центров «Точка роста» в общем объеме 31 656,4 тыс. рублей (факт) или 38,3 % от предусмотренных распоряжением Правительства Республики Марий Эл расходов. Информация приведена на диаграмме № 4.

Диаграмма № 4



⁶² Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров «Точка роста», утвержденные распоряжениями Министерства просвещения России: от 17.12.2019 № Р-133, от 12.01.2021 № Р-6, от 12.01.2021 № Р-6.

Следует отметить, что 46,2 % от фактически предусмотренных средств на функционирование 36 Центров «Точка роста» составляют расходы по текущему ремонту и оформлению помещений, закупке мебели. В 8 муниципальных районах Республики Марий Эл в Центрах «Точка роста» затраты на оплату труда не предусматривались.

Расходы на функционирование Центров «Точка роста» включены в объемы субсидий, выделяемых на выполнение государственных (муниципальных) заданий, без указания направления использования – «на функционирование Центра «Точка роста»».

2.6. Использование средств на создание детских технопарков «Кванториум» (код 51730)

Региональным проектом в рамках мероприятия по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» предусмотрено до 2023 года создание 3 технопарков на базе 3 общеобразовательных организаций, в том числе в 2021 году - 1 технопарка, информация приведена в таблице № 12.

Таблица № 12

Участники мероприятия по созданию «Кванториума»			
2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (1200 обучающихся)	МОУ «Волжский городской лицей» (1017 обучающихся)	МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы» (1513 обучающихся)	3

Бюджету республики из федерального бюджета в 2021 году выделены субсидии в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 073-09-2021-107 от 25.12.2020 в сумме 20 934,6 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета предусмотрены соглашением в 2021 году в объеме 427,2 тыс. рублей. Средства бюджетов муниципальных образований не предусмотрены.

Субсидии выделены в соответствии с Приложением № 5 к Правилам предоставления и распределения субсидий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

Уровень софинансирования предусмотрен – 98,0 процента, дата достижения результата – 31.12.2021.

Приказом Министерства от 19.01.2021 № 30 определен получатель субсидии на иные цели, и утвержден объем субсидии для ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» в сумме 21 361,8 тыс. рублей, с которым заключено Соглашение⁶³.

Помесячным планом исполнения республиканского бюджета⁶⁴

⁶³Соглашение о порядке и условиях предоставления из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидий на иные цели от 25.01.2021 № 20-2021-01500.

⁶⁴ Раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году» паспорта регионального проекта «Современная школа».

предусмотрено использование средств по состоянию на 01.06.2021 в полном объеме - 21 361,8 тыс. рублей, вместе с тем, Министерством денежные средства до получателя не доводились, кассовые расходы получателем не производились. (Причины несвоевременного достижения контрольных точек по результатам регионального проекта в 2021 году см. приложение № 2 к Отчету).

По состоянию на 19.07.2021 ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» в Единой информационной системе в сфере закупок размещено 8 извещений о проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контрактов на общую сумму 18 636,7 тыс. рублей, по которым заключено 7 контрактов на общую сумму 16 083,9 тыс. рублей.

По результатам проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств составила 1 535,8 тыс. рублей.

2.7. Использование средств на создание Центра профессионального мастерства (код 54810)

В рамках регионального проекта в 2021 году предусмотрено мероприятие по созданию 1 Центра профессионального мастерства.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 16.10.2020 № 496-р⁶⁵ данный Центр организуется на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский институт образования» (далее - ГБУДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования»).

Целью создания и функционирования Центров профессионального мастерства является формирование и развитие их как элемента единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

Приказами Минобрнауки Республики Марий Эл:

- от 02.03.2021 №156 утверждены показатели эффективности Центра профессионального мастерства на территории Республики Марий Эл и типовое положение о деятельности Центра профессионального мастерства на территории Республики Марий Эл;

- от 20.04.2021 № 399 утвержден Инфраструктурный лист для оснащения учреждения оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания.

Бюджету республики из федерального бюджета выделены субсидии в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 073-09-2021-107 в 2021 году в сумме 10 804,5 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета предусмотрены Соглашением в 2021 году в объеме 220,5 тыс. рублей. Уровень софинансирования за счет средств

⁶⁵ Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 16.10.2020 № 496-р «О реализации мероприятия по созданию на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский институт образования» центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».

федерального бюджета предусмотрен - 98,0 процента.

Помесячным планом исполнения республиканского бюджета предусмотрено использование средств по состоянию на 01.06.2021 в полном объеме – 11 025,0 тыс. рублей, вместе с тем, Министерством денежные средства до получателя не доводились, кассовые расходы получателем не производились. (Причины несвоевременного достижения контрольных точек по результатам регионального проекта в 2021 году см. приложение № 2 к Отчету).

По состоянию на 20.07.2021 ГБУДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» в Единой информационной системе в сфере закупок размещено 5 извещений о проведении электронных аукционов с начальной (максимальной) ценой контрактов на общую сумму 7 744,386 тыс. рублей, по результатам которых заключено 5 контрактов на общую сумму 6 689,696 тыс. рублей.

По результатам проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств составила 1 054,69 тыс. рублей.

Вопрос 3. Проверка организации контроля Министерством образования и науки Республики Марий Эл за реализацией регионального проекта «Современная школа»

Проверкой организации контроля Минобрнауки Республики Марий Эл за реализацией регионального проекта «Современная школа» установлено следующее.

Согласно Плану осуществления учредительного контроля на 2020 год, Министерством контрольные мероприятия в отношении подведомственных общеобразовательных учреждений, являющихся получателями средств субсидии на иные цели на реализацию мероприятий регионального проекта, не планировались и не проводились.

Планом осуществления учредительного контроля на 2021 год, Минобрнауки Республики Марий Эл предусмотрено контрольное мероприятие в отношении ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш Советского района».

Проведенной Министерством проверкой нарушений при использовании средств в 2020 году не установлено.

Вместе с тем, в ходе настоящего контрольного мероприятия выявлены многочисленные нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств получателями, в том числе по причине неэффективного контроля со стороны Министерства как главного распорядителя, распорядителя этих средств.

Возражения объектов контроля:

Справки проверки:

1. ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» подписана с разногласиями и пояснениями (письма от 26.04.2021 № 98, от 27.04.2021 № 89).

Разногласия и пояснения рассмотрены, частично приняты и учтены в тексте сводного акта проверки от 15.10.2021.

2. Администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл подписана с пояснениями (письма от 09.07.2021 № 1740, от 30.09.2021 № 2495). Пояснения рассмотрены, проведена дополнительная проверка по вновь представленным Министерством и Администрацией информации и документам, в части изменения данных о целевом и ресурсном обеспечении объекта: «Строительство «Сардаяльской основной общеобразовательной школы в дер. Сардаял Мари-Турекского района», исключающих признаки нецелевого использования бюджетных средств на сумму 82,5 тыс. рублей и риски нецелевого использования бюджетных средств на сумму 83 615,3 тыс. рублей, из них средства субсидии из федерального бюджета – 81 861,1 тыс. рублей.

Выявленные в Администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл нецелевое использование бюджетных средств на оплату проектно-сметной документации по строительству указанного объекта и риски о нецелевом использовании средств на оплату его строительства и оснащение в ходе проверки устранены, что отражено в сводном акте проверки от 15.10.2021, а именно:

- объект «Строительство «Сардаяльской основной общеобразовательной школы в дер. Сардаял Мари-Турекского района» (дошкольная группа) с показателем - 20 мест включен в паспорт регионального проекта. Утвержден отдельный код бюджетной классификации для осуществления расходов на создание дошкольной группы;

- Министерством с Администрацией заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл на строительство данного объекта с дошкольной группой на 20 мест от 30.09.2021 № 1.

Сводный акт проверки от 15.10.2021 подписан:

с возражениями (письма Минобрнауки Республики Марий Эл от 26.10.2021 № 10579; МКУ «ДМЗ» от 25.10.2021 № 1769/1);

с пояснениями (письмо администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл от 22.10.2021 № 2681).

Возражения и пояснения рассмотрены.

Составлено заключение на возражения, утверждено 16 ноября 2021 года.

На все пункты возражений принято решение, что они не опровергают факты, изложенные в акте по результатам контрольного мероприятия.

Выводы:

Организация процесса реализации регионального проекта «Современная школа» в 2020-2021 годах осуществлялась Минобрнауки Республики Марий Эл неудовлетворительно:

1) допущены многочисленные нарушения требований законодательных и иных нормативных правовых актов при выделении бюджетных средств подведомственным учреждениям и муниципальным образованиям;

2) не выполнялись функции, отнесенные к компетенции Министерства в части осуществления централизованных закупок;

3) не осуществлялся должный контроль за соблюдением порядка и условий использования бюджетных средств их получателями.

Всего проверкой установлено нарушений и недостатков - **64**, из них:

- нарушений, оцениваемых в стоимостном выражении – **17**;

- нарушений, оцениваемых в количественном выражении – **24**;

- недостатков - **23**.

(Свод нарушений и недостатков, отраженных в акте проверки см. приложение № 1 к Отчету).

1. По 17 нарушениям, оцениваемым в стоимостном выражении, сумма составила 230 844,4 тыс. рублей или 58,7 % от проверенных средств, в том числе в 2019 году – 20 898,5 тыс. рублей, в 2020 году – 24 548,8 тыс. рублей, в 2021 году – 185 397,1 тыс. рублей, из них:

1.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве 10 ед., в сумме 205 734,3 тыс. рублей, выразившиеся в:

1.1.1. Нарушения порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (пункт 1.2.49 Классификатора⁶⁶) в сумме 49 076,7 тыс. рублей.

1.1.2. Нарушения порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий (пункт 1.2.61 Классификатора) в сумме 154 563,8 тыс. рублей.

1.1.3. Неосуществлении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (пункт 1.2.100 Классификатора) в сумме 1 714,7 тыс. рублей.

1.1.4. Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации (пункт 1.2.6. Классификатора) в сумме 379,1 тыс. рублей.

1.2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в количестве 7 ед., в сумме 25 110,1 тыс. рублей, выразившиеся в:

1.2.1. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (пункт 4.44 Классификатора) в сумме 817,2 тыс. рублей.

1.2.2. Неприменении мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного

⁶⁶ Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (в редакции от 22 декабря 2015 г.). Одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол № 2-СКСО.

поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора) в сумме 1 335,5 тыс. рублей.

1.2.3. Приемке и оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45 Классификатора) в сумме 22 957,4 тыс. рублей.

2. Нарушения, оцениваемые в количественном выражении – 24 ед., из них:

2.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 17 ед., выразившиеся в:

2.1.1. Нарушении порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ (пункт 1.1.18 Классификатора) – 4 ед.

2.1.2. Нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий (пункт 1.2.61 Классификатора) – 8 ед.

2.1.3. Нарушении порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (пункт 1.2.49 Классификатора) - 2 ед.

2.1.4. Неосуществлении бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (пункт 1.2.97 Классификатора) – 3 ед.

2.2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 7 ед., выразившиеся в:

2.2.1. Нарушении порядка организации централизованных закупок (пункт 4.13 Классификатора) – 2 ед.

2.2.2. Нарушении при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.23 Классификатора) – 1 ед.

2.2.3. Не включении в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28 Классификатора) – 2 ед.

2.2.4. Непредставлении, несвоевременном представлении информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направлении недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53 Классификатора) – 2 ед.

3. В ходе проверки выявлены риски:

1) не достижения в 2021 году результата регионального проекта по созданию новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности при использовании бюджетных средств в размере 83 615,3 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета

81 861,1 тыс. рублей и соответственно риск неисполнения условий Соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета, по причинам:

- муниципальный контракт на строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района» заключен на месяц позднее срока, предусмотренного Дорожной картой по строительству объекта, в результате срок строительства сократился с **7,5** до **6,5** месяцев, при установленной его продолжительности в **10 месяцев**;

- условия муниципального контракта на строительство вышеуказанного объекта, заключенного на весь объем средств, предусмотренный Соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета, не позволяют создать новые места ввиду того, что контрактом не предусмотрено оснащение этих мест средствами обучения и воспитания. Приобретение средств обучения и воспитания предусмотрено в рамках других контрактов (договоров), заключаемых с октября 2021 года за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных в бюджете республики на 2022 год;

2) неэффективного использования средств республиканского бюджета на разработку в 2020 году проектно-сметной документации по строительству школы на 825 мест в г. Козьмодемьянске, по причине не включения данного объекта в региональный проект;

3) необеспечения санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации построенной в 2020 году школы № 31 в г. Йошкар-Оле, по следующим причинам (установлены в ходе осмотра здания школы):

- в помещениях школы на стенах имеются многочисленные растрескивания и трещины, в отдельных местах длина трещин превышает 2 метров, ширина – 5 мм. Трещина над дверями 3-х помещений 1-го этажа – сквозная;

- на потолках многочисленные следы растрескивания, подтеков, сколы штукатурки;

- деревянный пол в помещениях снарядной и спортивного зала имеет щели, которые в отдельных местах достигают ширины 1 см;

- в подвальном помещении на потолке и стенах комнаты хранения люминесцентных ламп, сантехнической арматуры имеется плесень. На первом этаже в кабинете начальных классов присутствует запах плесени, что позволяет сделать вывод о ненадлежащей вентиляции воздуха в помещениях здания школы. Также установлены другие многочисленные дефекты и недостатки, в связи с чем руководство школы неоднократно обращалось в адрес заказчика.

4) дополнительных затрат МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы» в ходе эксплуатации объекта, в том числе по следующим причинам (установлены в ходе осмотра):

- по уходу, покраске и замене оконных стеклопакетов (вместо пластиковых стеклопакетов установлены деревянные стеклопакеты, которые на момент осмотра имели дефекты и недостатки);

- на приобретение красящих материалов и нанесение разметки на спортивных площадках и беговых дорожках, на приведение их в нормативное состояние по причинам:

- покрытия поверхности спортивных площадок и беговых дорожек щебнем гранитным фракции 5-20 мм, вместо фракции спецсмеси 4 - 7 мм;

- отслоения резинового покрытия от основания и замены алюминиевых бордюрных камней на просмоленные доски.

Предложения:

1. Министерству образования и науки Республики Марий Эл внести **Представление** для принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков (с учетом принятых в ходе проверки мер), в котором обязать:

1.1. В целях устранения нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок при реализации мероприятия регионального проекта на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Центры «Точка роста»):

1) **внести изменение в Соглашение** о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, от 25.01.2021 № 20-2021-01438, заключенное с ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш», в части **исключения объема субсидии**, предусмотренной учреждению на 2022 год в размере 34 512,5 тыс. рублей, на 2023 год - 32 938,6 тыс. рублей;

2) **заключить соглашения** с муниципальными образованиями, в которых муниципальные общеобразовательные учреждения являются участниками указанного мероприятия:

- в случае централизации закупок на передачу полномочий (части) по осуществлению закупки в пользу муниципального образования, с соблюдением требований, установленных статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- либо на предоставление межбюджетной субсидии на реализацию данного мероприятия.

1.2. Инициировать актуализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования на 2013 - 2025 годы»,

утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 № 452, а именно **включить в паспорт государственной программы:**

1) объемы финансового обеспечения регионального проекта «Современная школа» за счет средств местных бюджетов и **привести объемы финансового обеспечения 2021 года в соответствие** с последней редакцией паспорта регионального проекта «Современная школа» и законом о бюджете Республики Марий Эл;

2) по подпрограмме «Реализация региональных проектов» государственной программы:

- показатель «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек», предусмотренный Соглашением о реализации регионального проекта от 08.02.2019 и паспортом регионального проекта «Современная школа»;

- показатель эффективности «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях», предусмотренный Планом мероприятий по реализации Стратегии для ключевого события «Реализация регионального проекта «Современная школа»»;

3) по основному мероприятию «Региональный проект «Современная школа» **объект:** «Строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района» (создание дошкольных мест) и **добавить результат:** «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (создание дошкольных мест)») со значением – 20 мест.

1.3. Разработать и реализовать комплекс мероприятий (в том числе принять организационно-распорядительные акты (актуализировать при наличии)), который позволит обеспечить надлежащее выполнение функций ответственного исполнителя государственной программы в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, том числе:

1) по взаимодействию с подведомственными учреждениями:

- в части соблюдения: порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели при заключении и исполнении соглашений об их предоставлении; графиков перечисления средств;

- при подготовке инфраструктурных листов и дизайн-проектов (зонирования) помещений и оборудования, в целях создания (обновления) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях (с учетом специфики каждого конкретного общеобразовательного учреждения: численности обучающихся, площади помещений, материалов при оформлении помещений и т.д.);

2) по взаимодействию с муниципальными образованиями в части:

- соблюдения: порядка определения объема и условий предоставления межбюджетных субсидий при заключении и исполнении соглашений об их предоставлении; полноты и своевременности представления отчетности, предусмотренной в рамках указанных соглашений;

- своевременного определения экономии бюджетных средств по результатам закупочных процедур, осуществляемых в рамках соглашений о предоставлении межбюджетных субсидий и при ее наличии своевременного направления информации в Министерство просвещения России для внесения соответствующих изменений в указанные соглашения и сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Марий Эл (закон о бюджете Республики Марий Эл);

- проведения анализа мощностей планируемых к строительству объектов образования с учетом фактической потребности создания новых мест и их достаточности для выполнения показателя «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях»;

3) по контролю за:

- исполнением постановления Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2020 г. № 306⁶⁷, в том числе за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления межбюджетных субсидий и результативностью использования средств субсидий;

- предоставлением достоверной информации о реализации регионального проекта «Современная школа», в том числе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в части: значений целевых показателей; показателей результата, результативности исполнения мероприятий; финансового обеспечения (включая средства местного бюджета);

- своевременной актуализацией паспорта государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования на 2013 - 2025 годы».

1.4. Принять меры по обеспечению муниципальным образованием «Мари-Турекского муниципального района» ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района» до 31.12.2021.

1.5. Провести совещание с работниками Министерства, ответственными лицами подведомственных учреждений, должностными лицами муниципальных образований, являющихся участниками мероприятий регионального проекта

⁶⁷ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2020 г. № 306 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях».

«Современная школа», в целях недопущения и /или устранения выявленных настоящей проверкой нарушений, с составлением соответствующего протокола, в том числе по вопросам:

1) соблюдения порядка и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл (соблюдения типовой формы соглашений, наличия предоставляемой субсидии в перечнях субсидий, порядка предоставления субсидий; наличие в муниципальной программе перечня мероприятий, на софинансирование которых предоставляется субсидия и др.);

2) обеспечения целевого и результативного использования средств;

3) своевременности предоставления отчетности, предусмотренной в рамках соглашений на предоставление субсидий из республиканского бюджета;

4) соблюдения требования законодательства о закупках при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

1.6. Совместно с Министерством финансов Республики Марий Эл:

1) **определить** отдельный код целевой статьи расходов на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации по объектам капитального строительства, которые еще не включены в соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключаемые с Министерством просвещения России, с целью исключения неэффективного использования бюджетных средств в рамках региональных проектов;

2) **обеспечить** финансирование деятельности функционирующих и создаваемых Центров «Точка роста» с учетом **объема и статей расходов**, предусмотренных Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 02.07.2019 № 298-р;

3) **унифицировать** в порядках предоставления межбюджетных субсидий и типовой форме соглашения требования к правовому статусу документа, являющегося условием предоставления муниципальным образованиям субсидии из республиканского бюджета.

Порядками предоставления межбюджетных субсидий предусмотрено их предоставление при наличии в муниципальном образовании муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия. Вместе с тем, *типовой формой соглашения* предусмотрено наличие правового акта, содержащего расходные обязательства, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

1.7. Провести служебные проверки с целью применения мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допустившим ненадлежащее исполнение своих обязанностей в части:

- соблюдения порядка и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета;

- своевременной актуализации паспорта регионального проекта «Современная школа» и Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования на 2013 - 2025 годы»;

- осуществления контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств.

2. Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» внести **Представление** для принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков (с учетом принятых в ходе проверки мер), в котором обязать:

2.1. Разработать мероприятия реализация которых позволит:

1) с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы» **обеспечить**:

- проведение мониторинга состояния здания школы, в том числе наблюдение за параметрами устраненных сквозных трещин в помещениях школы;

- устранение в рамках гарантийных обязательств по контракту плесени в подвальном помещении, перекошенных дверей в служебных помещениях столовой и других недостатков, установленных в результате проведенных по инициативе Государственной счетной палаты Республики Марий Эл осмотров и не устраненных в ходе контрольного мероприятия;

2) **обеспечить** должный контроль по объектам строительства общеобразовательных учреждений:

- за качеством приемки работ;

- при выдаче заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям: энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, соблюдения технических условий по благоустройству и озеленению прилегающей территории;

- в части применения мер ответственности по муниципальным контрактам (взыскания неустойки (пени, штрафов) к поставщикам (подрядчикам, исполнителям)), представления информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками;

3) **осуществлять** анализ мощностей планируемых к строительству объектов образования на предмет соответствия фактической потребности создания новых мест и их достаточности для выполнения республикой показателя «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях».

2.2. Провести совещание с должностными лицами Администрации, Муниципального казенного учреждения «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола», Финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» с составлением соответствующего протокола, в том числе:

2.2.1. Рассмотреть вопросы по обеспечению и соблюдению:

1) целевого и результативного использования средств;
2) требований законодательства о закупках при осуществлении закупок для муниципальных нужд, а именно:

- применения мер ответственности по муниципальным контрактам (взыскания неустойки (пени, штрафов) к поставщикам (подрядчикам, исполнителям)), представления информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками;

- осуществления качественной приемки выполненных работ, проведения внутренней экспертизы товаров, работ и др.;

3) требований бюджетного законодательства, а именно:

- отражения при составлении проекта бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» расходов по целевым статьям расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей, показателей и результатов реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, в соответствии с пунктом 38 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н.

2.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по установленным проверкой нарушениям и недостаткам.

3. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» внести **Представление** для принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, в котором обязать:

3.1. Направить в адрес ЗАО СПП «Салют» **требование об уплате штрафа в размере 1 335,5 тыс. рублей** за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 1.1, 4.5 муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9 «В» в г. Йошкар-Оле» от 22.10.2018 № 188.

В требовании об уплате штрафа необходимо указать предельный срок его исполнения (сведения о начислении штрафов в соответствии с Законом о контрактной системе подлежат направлению в реестр контрактов, заключенных заказчиками). В случае неисполнения требования об уплате штрафов обратиться в течение 10 рабочих дней в суд, по результатам рассмотрения дела представить копию решения суда.

3.2. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы» **обеспечить:**

- проведение мониторинга состояния здания школы, в том числе наблюдение за параметрами устраненных сквозных трещин в помещениях школы;

- устранение в рамках гарантийных обязательств по контракту плесени в подвальном помещении, перекошенных дверей в служебных помещениях столовой и других недостатков, установленных в результате проведенных по инициативе Государственной счетной палаты Республики Марий Эл осмотров и не устраненных в ходе контрольного мероприятия.

3.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по установленным проверкой нарушениям и недостаткам.

4. Администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл внести **Представление** для принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, в котором обязать:

4.1. Привести в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Медведевский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 04.02.2020 № 114, муниципальную программу «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 12.11.2013 № 1875 (в ред. от 26.08.2019 № 1151).

4.2. Провести совещание с должностными лицами Администрации с составлением соответствующего протокола, в том числе по вопросам:

1) соблюдения порядка и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл (соблюдения типовой формы соглашений; наличия в муниципальной программе перечня мероприятий, на софинансирование которых предоставляется субсидия и др.);

2) своевременности предоставления отчетности, предусмотренной в рамках соглашений на предоставление субсидий из республиканского бюджета.

4.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в части:

- соблюдения порядка и условий предоставления субсидии из республиканского бюджета;
- своевременной актуализации муниципальных программ.

5. Администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл внести **Представление** для принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков (с учетом принятых в ходе проверки мер, в котором обязать:

5.1. Принять меры по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района» до 31.12.2021.

5.2. Разработать и реализовать комплекс мер, который позволит при использовании бюджетных средств на строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района»:

1) **обеспечить** должный контроль:

- за качеством приемки работ по строительству объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района»;

- при выдаче заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям: энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, соблюдения технических условий по благоустройству и озеленению прилегающей территории;

- в части применения мер ответственности по муниципальным контрактам (взыскания неустойки (пени, штрафов) к поставщикам (подрядчикам, исполнителям)), представления информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

5.3. Провести совещание с должностными лицами Администрации с составлением соответствующего протокола, в том числе по вопросам:

1) соблюдения порядка и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл (соблюдения типовой формы соглашений, наличия предоставляемой субсидии в перечнях субсидий, порядка предоставления субсидий; наличие в муниципальной программе перечня мероприятий, на софинансирование которых предоставляется субсидия);

2) обеспечения целевого и результативного использования средств;

3) своевременности предоставления отчетности, предусмотренной в рамках соглашений на предоставление субсидий из республиканского бюджета;

4) соблюдения требования законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд, в том числе в части соблюдения условий реализации контрактов (договоров), включая своевременность расчетов по контракту (договору), выбору конкурентного способа определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), включения в контракт (договор) обязательных условий и др.;

5) осуществления выбора типового проекта объекта капитального строительства с учетом целей и задач, определенных заключенными соглашениями при участии в мероприятиях регионального проекта «Современная школа».

5.4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в части:

- соблюдения порядка и условий предоставления субсидии из республиканского бюджета;
- обеспечения целевого и результативного использования средств;
- своевременности предоставления отчетности, предусмотренной в рамках соглашений на предоставление субсидий из республиканского бюджета;
- соблюдения требований законодательства в сфере закупок.

6. Администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл внести **Представление** для принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, в котором обязать:

6.1. Провести совещание с должностными лицами Администрации с составлением соответствующего протокола, в том числе по вопросам:

1) соблюдения порядка и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл (соблюдения типовой формы соглашений, наличия предоставляемой субсидии в перечнях субсидий, порядка предоставления субсидий и др.);

2) своевременности предоставления отчетности, предусмотренной в рамках соглашений на предоставление субсидий из республиканского бюджета;

3) соблюдения требования законодательства о закупках при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

6.2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в части:

- соблюдения порядка и условий предоставления субсидии из республиканского бюджета;
- своевременности предоставления отчетности, предусмотренной в рамках соглашений на предоставление субсидий из республиканского бюджета;
- соблюдения требований законодательства в сфере закупок.

7. Государственной счетной палате Республики Марий Эл возбудить дела об административных правонарушениях по фактам нарушений:

- условий предоставления субсидий в отношении должностных лиц Минобрнауки Республики Марий Эл по части 1 статьи 15.15.5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) – нарушение условий предоставления субсидий на иные цели, по части 1 статьи 15.15.3 КоАП РФ – нарушение условий предоставления межбюджетных субсидий;

- условий предоставления межбюджетных субсидий в отношении должностных лиц Администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл, Администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл, Администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ – нарушение условий предоставления субсидий.

8. Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл направить информацию для принятия мер по фактам нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору), имеющих признаки административного правонарушения по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, а именно по нарушениям *Администрацией Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл* сроков оплаты по договору, заключенному с Автономным учреждением Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проведение государственной экспертизы от 13.01.2021 № 002Д-21/МГЭ-1312.

9. Министерству финансов Республики Марий Эл направить информационное письмо с предложениями совместно с **Министерством образования и науки Республики Марий Эл**:

1) **определить** отдельный код целевой статьи расходов на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации по объектам капитального строительства, которые еще не включены в соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключаемые с Министерством просвещения России, с целью исключения неэффективного использования бюджетных средств в рамках региональных проектов;

2) **обеспечить** финансирование деятельности функционирующих и создаваемых Центров «Точка роста» с учетом **объема и статей расходов**, предусмотренных Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 02.07.2019 № 298-р;

3) **унифицировать** в порядках предоставления межбюджетных субсидий и типовой форме соглашения требования к правовому статусу документа, являющегося условием предоставления муниципальным образованиям субсидии из республиканского бюджета.

Порядками предоставления межбюджетных субсидий предусмотрено их предоставление при наличии в муниципальном образовании муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия. Вместе с тем, *типовой формой соглашения*

предусмотрено наличие правового акта, содержащего расходные обязательства, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

10. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл направить информацию для дачи оценки соблюдения законодательства в сфере капитального строительства объектов социальной сферы при строительстве школы № 31 в г. Йошкар-Оле в рамках регионального проекта «Современная школа» по следующим вопросам:

1) соблюдения положений Градостроительного кодекса Российской Федерации при корректировке проектной документации, как внесением в нее изменений с последующим получением положительного заключения государственной экспертизы, так и путем согласования изменений между заказчиком, подрядчиком и проектировщиком с применением писем или подписанием актов на дополнительные работы, при том, что проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, подготовлена на основе типовой проектной документации, включенной в реестр Минстроя РФ и признанной подлежащей к повторному использованию;

2) обоснованности увеличения стоимости работ по строительству школы и продления срока выполнения работ;

3) многочисленных дефектов, установленных проведенными в ходе проверки осмотрами, в том числе сквозной трещины над дверями 3 помещений 1-го этажа.

11. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл направить информационное письмо и копию Отчета о результатах контрольного мероприятия в целях проведения анализа реализации Государственной программы, в том числе регионального проекта «Современная школа» и принятия при необходимости решений о корректирующих действиях.

12. Управлению Федерального казначейства по Республике Марий Эл направить информационное письмо и копию Отчета о результатах контрольного мероприятия для информации и возможного использования при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля.

13. Материал проверки по всем фактам нарушений для дачи оценки и принятия мер прокурорского реагирования направить в **прокуратуру Республики Марий Эл**.

14. Куратору регионального проекта «Современная школа» - Первому заместителю Председателя Правительства Республики Марий Эл Васютину М.З. направить информационное письмо и копию Отчета о результатах контрольного мероприятия для информации и принятия мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков в рамках полномочий, в том числе предусмотренных постановлением Правительства Республики Марий Эл от

25.12.2018 № 487 «Об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл», Распоряжением Главы Республики Марий Эл от 19.03.2021 № 42-рг «О распределении обязанностей между Председателем Правительства Республики Марий Эл, первыми заместителями и заместителями Председателя Правительства Республики Марий Эл».

15. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия:

- Главе Республики Марий Эл А.А.Евстифееву;
- в Государственное Собрание Республики Марий Эл;
- в УФСБ России по Республике Марий Эл - инициатору проверки.

Настоящий Отчет утвержден Решением Коллегии Государственной счетной палаты Республики Марий Эл от 30.11.2021 протокол № 14.

- Приложения:
1. Свод нарушений и недостатков, отраженных в акте контрольного мероприятия «Проверка результативности (эффективности) использования средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» за 2020 год и истекший период 2021 года» на 35 л. в 1 экз.
 2. Информация о причинах несвоевременного достижения контрольных точек по мероприятиям регионального проекта в 2021 году на 1 л. в 1 экз.
 3. Фотоотчет по результатам осмотров, проведенных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы» на 3 л в 1 экз.
 4. Фотоотчет по результатам осмотра, проведенного в ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» 03.03.2021, на 1 л. в 1 экз.
 5. Фотоотчет по результатам осмотров Центров «Точка роста» на 1 л. в 1 экз.

Председатель
Государственной счетной палаты
Республики Марий Эл

С.Ф.Каргальский

Свод нарушений и недостатков, отраженных в акте контрольного мероприятия «Проверка результативности (эффективности) использования средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» за 2020 год и истекший период 2021 года»

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)				
					Итого	ФБ	РБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Нарушения и недостатки, установленные в ходе контрольного мероприятия, в том числе:			64	X	230 844,4	218 689,3	9 687,3	2 467,8	
Нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа», в том числе:			41	X	230 844,4	218 689,3	9 687,3	2 467,8	
1. Финансовые нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа»			17	Всего	230 844,4	218 689,3	9 687,3	2 467,8	
				2019	20 898,5	20 460,1	417,5	20,9	
				2020	24 548,8	17 243,0	5 576,2	1 729,6	
				2021	185 397,1	180 986,2	3 693,6	717,3	
1.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов			10	Всего	205 734,3	196 213,6	9 129,7	391,0	
				2020	21 054,5	15 227,4	5 436,1	391,0	
				2021	184 679,8	180 986,2	3 693,6	0,0	
1.1.1. Нарушение порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (пункт 1.2.49 Классификатора)			4	Всего	49 076,7	48 095,2	981,5	0,0	
				2020	14 956,9	14 657,8	299,1	0,0	
				2021	34 119,8	33 437,4	682,4	0,0	
1. Государственному образовательному учреждению Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» предоставлена субсидия на иные цели с нарушением порядка и условий ее предоставления и в объеме, не соответствующем фактической потребности учреждения, а именно предварительные расчеты объема субсидии на сумму 16 025,2 тыс. рублей на создание Центра «Точка роста» ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» в Минобрнауки Республики Марий Эл не представлялись, субсидия предоставлена	бюджетному образовательному учреждению Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»	Абзац 4 пункта 1 статьи 78.1, подпункт 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункт 6 Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2011 № 254	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	<i>Всего</i>	14 956,9	14 657,8	299,1	0,0

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учреждению не только для создания (обновление) его материально-технической базы, а также для оснащения иных общеобразовательных организаций комплектами оборудования и средствами обучения для выполнения Минобрнауки Республики Марий Эл показателей по созданию 15 центров «Точка роста», в том числе на сумму 14 956,9 тыс. рублей (федеральные средства – 14 657,8 тыс. рублей, республиканские – 299,1 тыс. рублей) для 14 Центров «Точка роста», создаваемых в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Марий Эл				2020	14 956,9	14 657,8	299,1	0,0
2. Государственному бюджетному образовательному учреждению Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Уркаш» предоставлена субсидия на иные цели с нарушением порядка и условий ее предоставления и в объеме, не соответствующем фактической потребности учреждения, а именно финансово-экономическое обоснование объема субсидии на сумму 32 943,5 тыс. рублей (федеральные средства – 32 284,6 тыс. рублей, республиканские – 658,9 тыс. рублей) на создание центров «Точка роста» в Минобрнауки Республики Марий Эл не представлялось (учреждение не является участником мероприятия), субсидия предоставлена Учреждению не для создания (обновления) его материально-технической базы, а для оснащения иных образовательных организаций комплектами оборудования и средствами обучения для выполнения Минобрнауки Республики Марий Эл показателей по созданию 21 центра «Точка роста», создаваемых в общеобразовательных учреждениях Республики Марий Эл	Абзац 4 пункта 1 статьи 78.1, подпункт 1 пункта 1 ст. 158 БК РФ, подпункт «б» пункта 5, пункта 12 Порядка определения объема и условия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 460	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	Всего	32 943,5	32 284,6	658,9	0,0
				2021	32 943,5	32 284,6	658,9	0,0
<i>По пунктам 1, 2. По итогам рассмотрения материалов Государственной счетной палаты Республики Марий Эл прокуратурой Республики Марий Эл (письмо от 15.06.2021 № 21-27-2021) министру образования и науки Республики Марий Эл внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства при реализации регионального проекта «Современная школа».</i>								

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Минобрнауки Республики Марий Эл по результатам рассмотрения вышеуказанного представления к работникам Министерства, виновным в нарушениях, указанных в представлении, применены меры дисциплинарного воздействия, в 2022 году планируется определение в качестве уполномоченного органа, проводящего централизованные закупки для бюджетных учреждений, - Минобрнауки Республики Марий Эл (письмо от 19.07.2021 № 6934)</i>								
3. Не соблюдался график перечисления субсидии на иные цели в ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» («не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.04.2021»), в результате средства субсидии на иные цели доведены позже срока, установленного графиком перечисления субсидии, платежными поручениями от 13.04.2021 № 552541 на сумму 78,75 тыс. рублей, от 14.04.2021 № 567210 на 239,91 тыс. рублей, от 19.04.2021 № 604290 на 55,99 тыс. рублей	Абзац 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 10 Порядка определения объема и условия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 460, пункты 3.1.1, 4.1.3 Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 25.01.2021 № 20-2021-01352	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	<i>Всего</i>	402,1	394,1	8,0	0,0
			1	2021	402,1	394,1	8,0	0,0
4. Не соблюдался график перечисления субсидии на иные цели в ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская школа-интернат» («не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.04.2021»), в результате средства субсидии на иные цели доведены позже срока, установленного графиком перечисления субсидии, платежными поручениями от 13.04.2021 № 552540 на сумму 448,94 тыс. рублей, от 14.04.2021 № 567209 на 56,0 тыс. рублей, от 19.04.2021 № 604290 на 269,25 тыс. рублей	Абзац 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 10 Порядка определения объема и условия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 460, пункты 3.1.1, 4.1.3 Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	<i>Всего</i>	774,2	758,7	15,5	0,0
			1	2021	774,2	758,7	15,5	0,0

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)				
					Итого	ФБ	РБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Марий Эл субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 22.01.2021 № 20-2021-01297								
<i>За нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.</i>									
1.1.2. Нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий (пункт 1.2.61 Классификатора)			3		Всего	154 563,8	147 548,8	7 015,0	0,0
					2020	4 003,8	0,0	4 003,8	0,0
					2021	150 560,0	147 548,8	3 011,2	0,0
1. Не соблюдены условия и порядок предоставления межбюджетной субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях, а именно не выполнено требование о наличии в муниципальной программе перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (не указана принадлежность объекта строительства к региональному проекту, коды бюджетной классификации расходов отсутствуют, мероприятие в виде отдельного структурного элемента в муниципальной программе отсутствует)	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункты 3, 7, 8 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240, подпункт «а» пункта 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл от 17.01.2020	Администрация муниципального образования «Медведевский муниципальный район»	1		<i>Всего</i>	150 560,0	147 548,8	3 011,2	0,0
				2021	150 560,0	147 548,8	3 011,2	0,0	
2. Не соблюден порядок предоставления межбюджетной субсидии, а именно с Администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск» заключено Соглашение от 29.06.2020 № 1 на предоставление субсидии из республиканского бюджета на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги при отсутствии: - утвержденного законом о республиканском бюджете Республики Марий Эл Перечня субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацы 5, 6 пункта 4 статьи 9 Закона Республики Марий Эл от 06.07.2005 № 26-З «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл», пункт 2 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306	Минобрнауки Республики Марий Эл	1		<i>Всего</i>	2 882,2	0,0	2 882,2	0,0
				2020	2 882,2	0,0	2 882,2	0,0	

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Республики Марий Эл в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; - Порядка предоставления субсидий								
3. Не соблюден порядок предоставления межбюджетной субсидии, а именно с <i>Администрацией Мари-Турекского муниципального района</i> заключено Соглашение от 29.06.2020 № 1/1 на предоставление субсидии на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги при отсутствии: - утвержденного законом о республиканском бюджете Республики Марий Эл Перечня субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; - Порядка предоставления субсидий. Отсутствие Перечня субсидий и Порядка предоставления субсидий повлекло нарушение администрацией сроков оплаты по договору, заключенному с Государственным бюджетным научным учреждением при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.А. Васильева» от 03.08.2020 № б/н, на 39 календарных дней (расчет произведен 21.09.2020 следовало 13.08.2020)	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацы 5, 6 пункта 4 статьи 9 Закона Республики Марий Эл от 06.07.2005 № 26-3 «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл», пункт 2 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	<i>Всего</i>	1 121,6	0,0	1 121,6	0,0
				2020	1 121,6	0,0	1 121,6	0,0
<i>За нарушение, указанное в пункте 1, предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ, за нарушения, указанные в пунктах 2 и 3, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.15.3 КоАП РФ Срок привлечения к административной ответственности не истек</i>								
1.1.3. Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (пункт 1.2.100 Классификатора)			2	<i>Всего</i>	1 714,7	569,6	1 133,2	11,9
				<i>2020</i>	1 714,7	569,6	1 133,2	11,9
				<i>2021</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Не обеспечена результативность использования			1	Всего	581,8	569,6	11,6	0,6

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>бюджетных средств, а именно благоустройство, выполненное на территории Школы № 31 в г. Йошкар-Оле, не соответствует требованиям проектной документации: «Схеме планировочной организации земельного участка», «Ведомости элементов озеленения» (9396-ПЗУ том 2), СП 31-115-2006 «Покрытия открытых плоскостных сооружений. Конструкция покрытий», в результате оплачены работы, по которым не достигнут результат, в том числе:</p> <p>- по муниципальному контракту от 22.10.2018 № 188, Акту выполненных работ от 05.08.2020 приняты и оплачены работы на сумму 494,7 тыс. рублей по посадке деревьев, параметры которых не соответствовали требованиям проектной документации, локальной смете, муниципальному контракту от 22.10.2018 № 188, а именно возраст и высота посаженных деревьев кленов остролистных должны составлять от 7 до 9 лет, от 1,5 м – 2,0 м., фактически высота деревьев составляет от 0,05 м до 1,15 м., что соответствует возрасту до 7 лет. При этом, излишне оплачена стоимость посадочного материала (деревьев) в сумме 205,65 тыс. рублей (стоимость оплаченных по акту выполненных работ деревьев (212,73 тыс. руб. за минусом стоимости фактически посаженного материала (7,08 тыс. руб.));</p> <p>- по муниципальному контракту от 22.10.2018 № 188, Акту выполненных работ на от 05.08.2020 на общую сумму приняты и оплачены работы на сумму 77,1 тыс. рублей по посадке 349 кустов, отсутствующих на момент осмотра, предусмотрена посадка 661 кустарника, фактически на территории школы имелось 312 кустарников;</p> <p>- по муниципальному контракту от 22.10.2018 № 188, Акту выполненных работ от 05.08.2020 № 30 оплачено работ на сумму 10,0 тыс. рублей по покрытию футбольного поля – спортивного газона (посев луговых газонных трав), который на момент</p>	<p>Подпункт 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»</p>		2020	581,8, в т.ч. излишне оплачено 205,65 (возмещено)	569,6	11,6	0,6

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
осмотра не соответствовал техническим характеристикам, предусмотренным пунктом 8.1 раздела 8 «Покрытия открытых плоскостных сооружений. Конструкция покрытий» СП 31-115-2006 «Схемы планировочной организации земельного участка» проектной документации и состоял из 80 % утоптанной земли и 20 % редкой смеси злаковых трав. <i>В ходе проверки ЗАО «СПП «Салют»» (подрядчик) произведена посадка деревьев в количестве 62 единиц. Возраст и высота посаженных деревьев - кленов остролистных составляет от 7 до 9 лет, от 1,5 м – 2,0 м (соответственно), что подтверждено осмотром, проведенным по состоянию на 06.10.2021</i>								
2. Не обеспечена результативность использования бюджетных средств, а именно на 30.11.2020 не достигнуто значение результата использования субсидий – на разработанную проектно-сметную документацию не получено положительное заключение государственной экспертизы	Подпункт 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 12 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг объектов капитального строительства муниципальной собственности, создаваемых в рамках реализации национальных проектов и указанных в паспортах региональных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353, Соглашение о предоставлении субсидии на проектные и изыскательские работы от 29.06.2020 № 1/1	Администрация Мари-Турекского муниципального района	1	Всего	1 132,9	0,0	1 121,6	11,3
			1	2020	1 132,9	0,0	1 121,6	11,3
1.1.4 Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации (пункт 1.2.6. Классификатора)			1	Всего	379,1	0,0	0,0	379,1
				2020	379,1	0,0	0,0	379,1
			1	Всего	379,1	0,0	0,0	379,1

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)				
					Итого	ФБ	РБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Расходы, относящиеся к расходам на реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа», в части оплаты работ по осуществлению авторского надзора за строительством Школы № 31 в г. Йошкар-Оле, были предусмотрены и произведены в рамках другого основного мероприятия «Введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (в т.ч. школьных стадионов)» подпрограммы «Комплексное развитие муниципальных учреждений в сфере образования городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденной постановлением Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл № 471 от 31.03.2016	Статья 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»	1. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 2. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»		2020	379,1	0,0	0,0	379,1	
1.2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц				7	Всего	25 110,1	22 475,7	557,6	2 076,8
					2019	20 898,5	20 460,1	417,5	20,9
					2020	3 494,3	2 015,6	140,1	1 338,6
					2021	717,3	0,0	0,0	717,3
1.2.1. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (пункт 4.44 Классификатора)				2	Всего	817,2	0,0	98,9	718,3
					2020	99,9	0,0	98,9	1,0
					2021	717,3	0,0	0,0	717,3
1. Нарушены сроки оплаты по договору, заключенному с Автономным учреждением Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проведение государственной экспертизы от 13.01.2021 № 002Д-21/МГЭ-1312, свыше 30 дней, а именно авансовый платеж в размере 215,2 тыс. рублей произведен 26.02.2021 вместо 25.01.2021 или на 32 календарных дня позже установленного договором срока; окончательный расчет по договору в сумме 502,1 тыс. рублей	Часть 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 4.2 договора, заключенного с Автономным учреждением Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проведение государственной экспертизы от 13.01.2021 № 002Д-21/МГЭ-1312	Администрация Мари-Турекского муниципального района	1	Всего	717,3	0,0	0,0	717,3	
				2021	717,3	0,0	0,0	717,3	

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)				
					Итого	ФБ	РБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
произведен 28.06.2021 вместо 26.04.2021 или на 63 календарных дня позже установленного договором срока									
2. Нарушены сроки оплаты аванса по договору, заключенному с Государственным бюджетным научным учреждением при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.А. Васильева» от 03.08.2020 № б/н, на 39 календарных дней (расчет произведен 21.09.2020 следовало 13.08.2020)	Часть 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2.6 договора, заключенного с Государственным бюджетным научным учреждением при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.А. Васильева» от 03.08.2020 № б/н	Администрация Мари-Турекского муниципального района	1	Всего	99,9	0,0	98,9	1,0	
				2020	99,9	0,0	98,9	1,0	
<i>Несвоевременность оплаты по договору с Государственным бюджетным научным учреждением при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.А. Васильева» от 03.08.2020 № б/н связана с несвоевременным доведением до администрации Мари-Турекского района предельных объемов финансирования. Заявка в Минобрнауки Республики Марий Эл на перечисление средств субсидии с приложением копий договоров-оснований была направлена администрацией в Минобрнауки Республики Марий Эл письмом от 03.08.2020 № 2060, средства доведены Министерством 21.09.2020.</i>									
<i>За нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности по нарушению, указанному в пункте 1 не истек, по нарушению, указанному в пункте 2 истек.</i>									
1.2.2. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора)				1	Всего	1 335,5	0,0	0,0	1 335,5
					2020	1 335,5	0,0	0,0	1 335,5
1. Не направлено Подрядчику (ЗАО СПП «Салют») требование об уплате штрафа за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 1.1, 4.5 муниципального контракта от 22.10.2018 № 188, выполнить работы по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В в г. Йошкар-Оле» согласно техническому заданию (приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью контракта, в соответствии с проектно-сметной документацией: а именно работы по: - устройству вентиляционной системы выполнены некачественно, с нарушением: «вентиляционные каналы «П 7 и П 8» поменяны местами, в резьбовых	Часть 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункт 9.6 муниципального контракта на «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В в г. Йошкар-Оле» от 22.10.2018 № 188	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	Всего	1 335,5	0,0	0,0	1 335,5	
				2020	1 335,5	0,0	0,0	1 335,5	

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соединениях 7 (семи) узлов регулирования отсутствует герметичность», стоимость выполненных работ по данным Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 31 от 07.08.2020 составила 9 665,6 тыс. рублей; - посадке деревьев выполнены ненадлежащим образом: в «Схеме планировочной организации земельного участка», «Ведомости элементов озеленения» (9396-ПЗУ том 2) возраст и высота посаженных деревьев указаны от 7 до 9 лет, от 1,5 м – 2,0 м., фактически высота деревьев составляет от 0,05 м до 1,15 м., что соответствует возрасту до 7 лет, стоимость выполненных работ по данным Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 05.08.2020 составила 494,7 тыс. рублей; - устройству спортивного газона футбольного поля выполнены ненадлежащим образом: согласно требованиям СП 31-115-2006 «Покрытия открытых плоскостных сооружений. Конструкция покрытий», «Схемы планировочной организации земельного участка» проектной документации травяное покрытие (спортивный газон) должно быть низким, густым, устойчивым к вытаптыванию и частой стрижке, а также к засушливой и дождливой погоде, фактически спортивный газон футбольного поля состоит из 80 % утоптанной земли и 20 % редкой смеси злаковых трав, стоимость выполненных работ по данным Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 05.08.2020 составила 10,0 тыс. рублей; - поставке в столовую школы «Подставки под пароконвектомат модели ПК-10М» не имеющей уровней для размещения противней с пищей, что не соответствует условиям муниципального контракта от 22.10.2018 № 188, стоимость указанного оборудования по данным Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 09.12.2019 составила 19,6 тыс. рублей.								
			4	Всего	22 957,4	22 475,7	458,7	23,0

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)				
					Итого	ФБ	РБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2.3. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45 Классификатора)					2019	20 898,5	20 460,1	417,5	20,9
					2020	2 058,9	2 015,6	41,2	2,1
1. Осуществлена приемка выполненных работ по установке оконных блоков в 2019 году, не соответствующих муниципальному контракту на «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В в г. Йошкар-Оле» № 188 от 22.10.2018, а именно разделом «Архитектурные решения» проектно-сметной документации (9396-АР Том № 3) и разделом 4 локальной сметы на общестроительные работы по строительству Школы № 31 выше отм. 0,000 м. предусмотрены «блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом», фактически установлены «блоки оконные деревянные одинарной конструкции со стеклопакетами клееными двухкамерными энергосберегающими» (изменения в проектно-сметную документацию и контракт не вносились)	Пункт 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	Всего	12 777,5	12 509,4	255,3	12,8	
				2019	12 777,5	12 509,4	255,3	12,8	
2. Осуществлена приемка выполненных работ по устройству вентиляционной системы, не соответствующих муниципальному контракту на «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В в г. Йошкар-Оле» № 188 от 22.10.2018, а именно работы по устройству вентиляционной системы выполнены некачественно, с нарушением: «вентиляционные каналы «П 7 и П 8» поменяны местами, в резьбовых соединениях 7 (семи) узлов регулирования отсутствует герметичность»	Пункт 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	Всего	9 665,6	9 462,8	193,1	9,7	
				2019	8 101,4	7 931,5	161,8	8,1	
				2020	1 564,2	1 531,3	31,3	1,6	
<i>Указанные конструктивные недостатки были устранены ЗАО СПП «Салют» (подрядчик). Письмом от 11.05.2021 № 250 ЗАО СПП «Салют» проинформировало Государственную счетную палату Республики Марий Эл о замене распределительных узлов вентиляционных установок и перестановки воздухопроводов в соответствии с проектной документацией</i>									
3. Осуществлена приемка выполненных работ по посадке деревьев (Акт выполненных работ по форме № КС-2 от 05.08.2020, отчет о проведении экспертизы от 07.08.2020) не соответствующих муниципальному контракту на «Строительство средней общеобразовательной школы в	Пункт 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского	1	Всего	494,7	484,3	9,9	0,5	
				2020	494,7	484,3	9,9	0,5	

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
микрорайоне 9В в г. Йошкар-Оле» №188 от 22.10.2018, а именно в проектной документации: «Схеме планировочной организации земельного участка», «Ведомости элементов озеленения» (9396-ПЗУ том 2) и Акте выполненных работ от 05.08.2020 возраст и высота посаженных деревьев указаны от 7 до 9 лет, от 1,5 м – 2,0 м., фактически высота деревьев составляет от 0,05 м до 1,15 м., что соответствует возрасту деревьев до 7 лет		округа «Город Йошкар-Ола»						
4. Осуществлена приемка оборудования «Подставки под пароконвектомат модель ПК 10М», не соответствующего условиям муниципального контракта на «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В в г. Йошкар-Оле» №188 от 22.10.2018, а именно согласно локальной смете на приобретение технологического оборудования и инвентаря проектно-сметной документации 02-01-20 (позиция №152), акту выполненных работ и экспертному заключению подставка под пароконвектомат модели ПК-10М имеет уровни для размещения противней с пищей, в ходе осмотра установлено, что подставка под пароконвектомат не имеет уровней для размещения противней с пищей.	Пункт 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	Всего	19,6	19,2	0,4	0,0
				2019	19,6	19,2	0,4	0,0
<i>ЗАО СПП «Салют» (поставщик) письмом от 11.05.2021 № 250 проинформировало Государственную счетную палату Республики Марий Эл о замене подставки под пароконвектомат, которая имеет уровни размещения для противней с пищей</i>								
2. Нарушения, оцениваемые в количественном выражении			24		X	X	X	X
					X	X	X	X
					X	X	X	X
2.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов			17		X	X	X	X
					X	X	X	X
					X	X	X	X
2.1.1. Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ (пункт 1.1.18 Классификатора)			4		X	X	X	X
					X	X	X	X
					X	X	X	X
1. Не обеспечена взаимосвязка паспорта государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» с паспортом регионального	Абзац 3 пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 59 Положения об организации проектной	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>проекта «Современная школа» по задачам и ресурсам:</p> <p>1.1. Государственная программа Республики Марий Эл (в ред. от 18.08.2020) по подпрограмме «Реализация региональных проектов» не содержит показателя: «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек», предусмотренного Соглашением о реализации регионального проекта от 08.02.2019 и отраженного в паспорте регионального проекта «Современная школа»;</p> <p>1.2. Предусмотренные в паспорте государственной программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мероприятие по строительству средней общеобразовательной школы в г. Козьмодемьянске на 825 мест (проектирование) и его финансовое обеспечение на 2020 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, - финансовое обеспечение мероприятия «Строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района» (проектирование, строительство)» на 2020 год в сумме 1 326,0 тыс. рублей, в паспорте регионального проекта «Современная школа» отсутствуют 	<p>деятельности в Республике Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2018 № 487 «Об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл», пункты 2, 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2011 № 435</p>							
<p>2. Не обеспечено внесение изменений в паспорт регионального проекта «Современная школа» с целью приведения его в соответствие с законом о республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий финансовый год и на плановый период, в результате в паспорте регионального проекта не отражены объемы ассигнований, предусмотренные законом о республиканском бюджете на 2020 год (2020 год) в сумме 5 326,0 тыс. рублей</p>	<p>Пункт 59 Положения об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2018 № 487 «Об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл»</p>	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
<p>3. В муниципальной программе «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном</p>	<p>Абзац 3 пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздел II «Требования к содержанию муниципальной</p>	Администрация муниципального образования	1		X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
образовании «Медведевский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 12.11.2013 № 1875 (в ред. от 26.08.2019 № 1151), принадлежность объекта: «Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский 5, в г. Ижевске» к региональному проекту «Современная школа» не указана, слова «региональный проект» и коды бюджетной классификации расходов отсутствуют, мероприятие в виде отдельного структурного элемента в муниципальной программе отсутствует	программы) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Медведевский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 04.02.2020 № 114	«Медведевский муниципальный район»						
4. По состоянию на 01.06.2021 объемы финансового обеспечения муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 12.11.2013 № 1875 (в ред. от 26.08.2019 № 1151), по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский 5, в г. Ижевске» не приведены в соответствие с бюджетными назначениями, утвержденными решением Собрания депутатов Медведевского муниципального района от 23.12.2020 № 102-VII «О бюджете Медведевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов» (в ред. от 10.02.2021 № 116-VII), а именно муниципальной программой объем финансового обеспечения предусмотрен в сумме 252 000,0 тыс. рублей (2021 год – 160 000,0 тыс. рублей, 2022 год – 92 000,0 тыс.	Абзац 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Администрация муниципального образования «Медведевский муниципальный район»	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
рублей), тогда как в муниципальном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 535 756,9 тыс. рублей (2021 год – 268 597,5 тыс. рублей, 2022 год – 267 159,4 тыс. рублей)								
2.1.2. Нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий (пункт 1.2.61 Классификатора)			8	X	X	X	X	X
1. В результате не осуществления контроля нарушены условия и порядок предоставления межбюджетной субсидии <i>Администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район»</i> , а именно заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл и предоставлены субсидии в сумме 150 560,0 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета – 147 548,8 тыс. рублей, республиканского – 3 011,2 тыс. рублей, при невыполнении требования о наличии в муниципальной программе перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Пункт 3 статьи 139, подпункт 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункты 3, 7, 8 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240, подпункт а) пункта 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл от 17.01.2020	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
2. Не соблюден порядок предоставления межбюджетной субсидии, а именно с Минобрнауки Республики Марий Эл заключено Соглашение от 29.06.2020 № 1/1 на предоставление субсидии на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги при отсутствии: - утвержденного законом о республиканском бюджете Республики Марий Эл Перечня субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацы 5, 6 пункта 4 статьи 9 Закона Республики Марий Эл от 06.07.2005 № 26-3 «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл», пункт 2 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306	Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Порядка предоставления субсидий								
3. Заключенное Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году бюджету муниципального образования Мари-Турекского района субсидии на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги от 29.06.2020 № 1/1 не соответствует типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Марий Эл от 25.12.2019 № 16-н, в части отсутствия условий, подлежащих обязательному включению	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 8 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306, пункт 9 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг объектов капитального строительства муниципальной собственности, создаваемых в рамках реализации национальных проектов и указанных в паспортах региональных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353, пункт 2 приказа Министерства финансов Республики Марий Эл от 25.12.2019 № 16-н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования в Республике Марий Эл»	1. Минобрнауки Республики Марий Эл 2. Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»	1	X	X	X	X	X
4. При изменении в Законе Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Закона Республики Марий Эл от 28.05.2021 № 22-З), Решении Собрании депутатов Мари-Турекского муниципального района (приложение № 8) «О	Абзац 3 пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункты 8, 10 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением	1. Минобрнауки Республики Марий Эл 2. Администрация муниципального образования «Мари-Турекский	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджете Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 16.12.2020 № 139 (в ред. от 07.05.2021 № 197) объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (2022 год) на финансовое обеспечение мероприятия по строительству объекта: «Сардаяльская основная общеобразовательная школа в дер. Сардаял Мари-Турекского района» в размере 100 505,4 тыс. рублей в Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета от 21.11.2019 № 88624000-1-2019-011 соответствующие изменения не внесены. <i>В ходе проверки между Минобрнауки Республики Марий Эл и Администрацией Мари-Турекского муниципального района заключено на бумажном носителе новое Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования в Республике Марий Эл на 2022 год от 30.09.2021 № 1 (письмо Министерства от 30.09.2021 № 9628)</i>	Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306	муниципальный район»						
5. Заключенное Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» субсидии на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги от 29.06.2020 № 1, не соответствует типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Марий Эл от 25.12.2019 № 16-н, в части отсутствия условий, подлежащих обязательному включению	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 8 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306, пункт 2 приказа Министерства финансов Республики Марий Эл от 25.12.2019 № 16-н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования в Республике Марий Эл»	1. Минобрнауки Республики Марий Эл 2. Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»	1	X	X	X	X	X
6. Не соблюден порядок предоставления межбюджетной субсидии, а именно с Минобрнауки	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацы 5, 6 пункта	Администрация городского округа	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Республики Марий Эл заключено Соглашение от 29.06.2020 № 1 на предоставление субсидии из республиканского бюджета на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги при отсутствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утвержденного законом о республиканском бюджете Республики Марий Эл Перечня субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; - Порядка предоставления субсидий, в результате Администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» предоставлена и администрацией израсходована субсидия в 2020 году в сумме 2 882,2 тыс. рублей. 	<p>4 статьи 9 Закона Республики Марий Эл от 06.07.2005 № 26-З «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл», пункт 2 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306</p>	«Город Козьмодемьянск»						
<p>7. Несвоевременно представлены в Минобрнауки Республики Марий Эл:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет о расходах бюджета муниципального образования «Медведевский муниципальный район» за 2020 год, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, на 25 календарных дней позже установленного срока, а именно предусмотрено не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором была получена субсидия, фактически отчет представлен 30.01.2021; - отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2020 год, на 15 календарных дней позже установленного пунктом 4.3.6 раздела IV Соглашения от 17.01.2020 срока, а именно предусмотрено не позднее 15 января, следующего за годом, в котором была получена субсидия, фактически отчет представлен 30.01.2021 и на 25 календарных дней позже срока, установленного пунктом 14 Порядка 	<p>Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 14 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240, пункты 4.3.6 раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета от 17.01.2020</p>	Администрация муниципального образования «Медведевский муниципальный район»	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
предоставления субсидии, а именно предусмотрено не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором была получена субсидия, фактически отчет представлен 30.01.2021								
8. Несвоевременно представлен в Минобрнауки Республики Марий Эл: - отчет о выполнении мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества за 2020 год на 10 календарных дней позже установленного срока, а именно предусмотрено не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором была получена субсидия, фактически отчет представлен 15.01.2021	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 14 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг объектов капитального строительства муниципальной собственности, создаваемых в рамках реализации национальных проектов и указанных в паспортах региональных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353, пункты 4.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета от 29.06.2020 № 1/1	Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»	1	X	X	X	X	X
<i>За нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.15.3 КоАП РФ в отношении Минобрнауки Республики Марий Эл, по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ в отношении администраций муниципальных образований. Срок привлечения к административной ответственности не истек.</i>								
2.1.3. Нарушение порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (пункт 1.2.49 Классификатора)			2	X	X	X	X	X
1. В 2020 году предварительные расчеты объема субсидии на сумму 16 755,8 тыс. рублей на создание Центра «Точка роста» в Минобрнауки Республики Марий Эл не представлялись	Пункт 6 Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2011 № 254	ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. В 2021 году предварительные расчеты объема субсидии на сумму 32 943,5 тыс. рублей на создание Центра «Точка роста» в Минобрнауки Республики Марий Эл не представлялись	подпункт «б» пункта 5, пункт 12 Порядка определения объема и условия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2020 № 460	ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»	1	X	X	X	X	X
2.1.4. Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (пункт 1.2.97 Классификатора)			3	X	X	X	X	X
1. В результате неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств не обеспечено соблюдение получателями межбюджетных субсидий порядка (обязательств) их предоставления, а именно отчетность, предусмотренная в рамках соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета, представлена администрациями <i>Медведевского, Мари-Турекского муниципальных районов, городского округа «Город Козьмодемьянск»</i> не своевременно, с задержкой от 10 до 25 дней	Подпункт 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 14 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240, пункт 14 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг объектов капитального строительства муниципальной собственности,	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	создаваемых в рамках реализации национальных проектов и указанных в паспортах региональных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353, пункт 4.1.2 соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета, заключенных с администрациями Медведевского, Мари-Турекского муниципальных районов, городского округа «Город Козьмодемьянск»							
2. В результате неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (контроля) не обеспечено соблюдение Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» результативности и других обязательств, предусмотренных Соглашением, при использовании межбюджетных субсидий, а именно: 2.1) в эксплуатируемой менее года Школе № 31 в г. Йошкар-Оле установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм; 2.2) благоустройство, выполненное на территории Школы № 31 в г. Йошкар-Оле, не соответствует требованиям проектной документации: «Схеме планировочной организации земельного участка», «Ведомости элементов озеленения» (9396-ПЗУ том 2), СП 31-115-2006 «Покрытия открытых плоскостных сооружений. Конструкция покрытий», общая стоимость оплаченных работ, по которым не достигнут результат составила - 581,8 тыс. рублей, из них: - на сумму 494,7 тыс. рублей (средств федерального бюджета – 494,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 9,9 тыс. рублей, местного бюджета – 0,5 тыс. рублей) оплачена стоимость посадочного материала (деревьев), не соответствующего условиям проектной	Подпункты 1, 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 24 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306, пункты 4.1.2, 4.3.9.2 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 10.02.2019 № 073-09-2019-057, от 19.12.2019 № 073-09-2020-907, пункты 4.1.2, 4.3.4 соглашений о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл от 13.03.2019 № 88701000-1-2019-002, 19.02.2020 №88701000-1-2020-005	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>документации (муниципального контракта), а именно возраст и высота посаженных деревьев кленов остролистных должны составлять от 7 до 9 лет, от 1,5 м – 2,0 м., фактически высота деревьев составляет от 0,05 м до 1,15 м., что соответствует возрасту до 7 лет;</p> <p>- на сумму 77,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 75,5 тыс. рублей, республиканского – 1,5 тыс. рублей, местного – 0,1 тыс. рублей) оплачена стоимость древесно-кустарниковых растений в количестве 349 кустов, которые фактически отсутствуют;</p> <p>- на сумму 10,0 тыс. рублей (средств федерального бюджета – 9,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 0,2 тыс. рублей, местного бюджета – 0,001 тыс. рублей) оплачена стоимость спортивного газона футбольного поля, который фактически отсутствует, а именно травяное покрытие футбольного поля должно быть низким, густым, устойчивым к вытаптыванию и частой стрижке, а также к засушливой и дождливой погоде, фактически состоит из 80,0 % утопанной земли и 20,0 % редко растущей смеси трав</p>								
<p><i>По результатам рассмотрения направленных материалов по пункту 2.1 данного нарушения, Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по фактам нарушения пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», статьи 28, части 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением о назначении административного наказания № 208у от 26.05.2021, должностное лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (письмо от 27.05.2021 № 2011).</i></p>								
<p>3. В результате неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (контроля) в 2020 году не обеспечено соблюдение Администрацией Мари-Турекского муниципального района, как получателя межбюджетных субсидий, условий и результативности их предоставления на сумму 1 132,9 тыс. рублей, а именно в 2020 году не обеспечено достижение значения результата использования субсидий – на разработанную проектно-сметную документацию не получено</p>	<p>Подпункты 1, 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 24 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306, пункт 12 Порядка предоставления и распределения субсидий</p>	<p>Минобрнауки Республики Марий Эл</p>	<p>1</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
положительное заключение государственной экспертизы	из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг объектов капитального строительства муниципальной собственности, создаваемых в рамках реализации национальных проектов и указанных в паспортах региональных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.09.2020 № 353, пункт 4.1.2 Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги от 29.06.2020 № 1/1							
2.2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц			7	X	X	X	X	X
2.2.1. Нарушения порядка организации централизованных закупок (пункт 4.13 Классификатора)			2	X	X	X	X	X
1. На ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» в проверяемом периоде возложены полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты	Часть 3 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
2. Учреждением в проверяемом периоде осуществлялись централизованные закупки при отсутствии полномочий	Части 3, 4 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»	1	X	X	X	X	X
2.2.2. Нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.23 Классификатора)			1	X	X	X	X	X
1. В отношении одного объекта строительства «Сардаяльская основная общеобразовательная	Часть 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Администрация муниципального	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
школа» д. Сардаял Мари-Турекского района» 03.08.2020 у единственного поставщика – ИП Дубцова Геннадия Александровича осуществлена закупка работ (услуг) на выполнение проектно-сметной документации и инженерных изысканий на общую сумму 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных субсидий из республиканского бюджета – 792,0 тыс. рублей, местного бюджета – 8,0 тыс. рублей, без проведения конкурентных процедур, путем заключения 3 договоров: от 03.08.2020 № Д-221,3/19 на сумму 300,0 тыс. рублей, от 03.08.2020 № Д-221,4/19 на сумму 200,0 тыс. рублей, от 03.08.2020 № Д-221,5/19 на сумму 300,0 тыс. рублей, со сроком заключения и исполнения в течение одного календарного периода времени		образования «Мари-Турекский муниципальный район»						
<i>За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности истек.</i>								
2.2.3. Не включение в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28 Классификатора)			2	X	X	X	X	X
1. В заключенных договорах с единственным поставщиком не определен срок выполнения обязательств заказчика о предоплате в размере 30%: - от 02.07.2020 № 200702 с ООО «Мир шахмат»; - от 14.07.2020 № 28 с ИП Таташев О.В.; - от 14.07.2020 № 9-ип с ИП Кузнецова Я.Г.; - от 14.07.2020 № 186 с ООО «Адвентер»	Пункт 1 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»	1	X	X	X	X	X
2. Не определен срок выплаты аванса по договорам заключенных с ИП Дубцовым Геннадием Александровичем в размере 30% от общей суммы по договорам от 03.08.2020 № Д-221,3/19, № Д-221,4/19, № Д-221,5/19	Пункт 1 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»	1	X	X	X	X	X
2.2.4. Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53 Классификатора)			2	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Не направлена для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация об изменении контракта № 188 от 22.10.2018 на строительство школы в г. Йошкар-Ола: проектно-сметная документация после корректировки и получения экспертиз на сумму 5 544,0 тыс. рублей (положительное заключение от 22.08.2019 № 12-1-0103-19); «сводные сметные расчеты стоимости строительства», являющиеся приложениями к дополнительным соглашениям от 16.12.2019, от 19.12.2019, от 30.04.2020, от 02.06.2020 к муниципальному контракту № 188 от 22.10.2018, на сумму 14 448,2 тыс. рублей	Пункт 8 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
2. Не направлена для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация об изменении контракта от 18.09.2020 № 0108300014620000028, заключенного с ООО «СтройКрафт» (письма от 14.10.2020 № 431, от 10.11.2020 № 3836), с указанием условий контракта, которые были изменены, в части замены работ по проектированию централизованной системы теплоснабжения на работы по проектированию газовой автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 1,255 Гкал/ч (1,46 МВт) по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 3 микрорайон»	Пункт 8 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»	1	X	X	X	X	X
<i>За нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности по нарушению, указанному в пункте 1 истек, в пункте 2 не истек.</i>								
3. Недостатки, установленные в ходе проверки			23	X	X	X	X	X
1. Предусмотренный Планом мероприятий по реализации Стратегии ¹ для ключевого события «Реализация регионального проекта «Современная школа»» показатель эффективности «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в		Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

¹ План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 29.06.2018 № 380-р (в редакции распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 15.06.2020 № 224-р).

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» отражен в Государственной программе Республики Марий Эл в паспорте другой подпрограммы, а именно подпрограммы «Государственное обеспечение функционирования системы образования»								
2. При увеличении бюджетных ассигнований по объекту «Строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаял Мари-Турекского района» на 2022 год – 100 505,4 тыс. рублей показатели основного мероприятия «региональный проект «Современная школа» в Государственной программе Республики Марий Эл остались неизменными. <i>По информации Министерства (письмо от 30.09.2021 № 9628) актуализация Государственной программы Республики Марий Эл запланирована до 01.12.2021</i>		Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
3. В паспорте регионального проекта «Современная школа» и Соглашении о реализации регионального проекта от 08.02.2019 отсутствует показатель: «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 1 единица», указанный в Отчете о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» на 2020 год		Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
4. Указанная в паспорте регионального проекта «Современная школа» Методика расчета показателей ² применима для расчета показателей Министерством просвещения России и основывается на данных отчетов субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое		Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

² Методика расчета показателей федерального проекта «Современная школа», утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.04.2019 № 179.

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
обеспечение реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа». Минобрнауки Республики Марий Эл порядок определения (расчета) значений показателей по республике не определен, проверке не представлен. <i>В ходе проверки методика расчета показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» (единственный показатель, установленный на 2021 год) в паспорте регионального проекта «Современная школа» (версия 13 от 13.10.2021) актуализирована</i>								
5. В Перечне субсидий на 2020 год (в ред. Закона № 31-З от 11.09.2020 (окончательная редакция)) отсутствовала «Субсидия на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2025 годы», фактически предоставленная по Соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета муниципальному образованию «Городской округ «Город Козьмодемьянск» от 29.06.2020 № 1. Кроме того, по состоянию на 01.08.2021 Порядок предоставления субсидии отсутствует.		Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
6. В Министерство просвещения России информация о наличии экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг за 2 и 3 квартал 2020 года, и предложение о заключении дополнительных соглашений, предусматривающих уменьшение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в установленный указанным пунктом срок (не реже одного раза в квартал) на сумму 6 141,6 тыс. рублей, в том числе по средствам федерального бюджета –	Пункт 4.3.9.6 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 19.12.2019 № 073-09-2020-907 (в редакции дополнительного соглашения от 02.06.2020 № 073-09-2020-907/4)	Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 018,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 122,8 тыс. рублей, не направлялись. В 2020 году изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Марий Эл, Закон Республики Марий Эл от 29.11.2019 № 49-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», при образовании экономии бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг на сумму 6 141,6 тыс. рублей, не внесены								
7. Порядками предоставления межбюджетных субсидий из республиканского бюджета предусмотрено их предоставление при наличии в муниципальном образовании муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия. Вместе с тем, типовой формой соглашения предусмотрено наличие правового акта, содержащего расходные обязательства, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.		Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
8. Участниками реализации регионального проекта по состоянию на 01.06.2021 не соблюдался Помесячный план исполнения бюджета Республики Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году, нарушались сроки достижения контрольных точек. Не освоение бюджетных средств в установленный срок и заданном объеме создает риски несвоевременного достижения результатов регионального проекта.		Минобрнауки Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
9. Перспективный план реализации мероприятий комплекса мер (программ), направленных на создание новых мест в муниципальных		Администрация городского округа	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>общеобразовательных организациях городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2016 – 2025 годы, утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.03.2016 № 407 (в ред. от 23.12.2016), на момент проверки не актуализирован. Строительство Школы № 31 в г. Йошкар-Оле предусмотрено в период - 2016 – 2018 годы.</p> <p>В республиканскую адресную инвестиционную программу объект включен и строительство его осуществлялось с 2019 года.</p>		«Город Йошкар-Ола»						
<p>10. Нарушение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы» требований санитарного законодательства, выразившееся в нарушении пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», статьи 28, части 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», свидетельствует о ненадлежащем исполнении <i>Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»</i> обязательства, предусмотренного пунктом 4.3.4 соглашений о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл от 13.03.2019, от 19.02.2020, согласно которому муниципалитет обязан обеспечить создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями</p>		Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
<p>11. Применение кодов бюджетной классификации расходов с нарушением статьи 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Минфина</p>		Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
России от 06.06.2019 № 85н ³ влечет искажение данных о финансовом обеспечении реализации регионального проекта «Современная школа»								
12. При выполнении строительного-монтажных работ при строительстве школы в г. Йошкар-Оле неоднократно нарушался график выполнения отдельных видов работ (приложение № 2 к муниципальному контракту № 188 от 22.10.2018 на строительство школы в г. Йошкар-Оле). МКУ «ДМЗ» в адрес ЗАО «СПП Салют» было предъявлено требование об уплате пени за просрочку исполнения муниципального контракта № 188 от 22.10.2018 на 6 дней в сумме 10 449 рублей 59 копеек. По состоянию на 01.06.2021 пени подрядчиком не уплачены		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
13. Акты выполненных работ по форме № КС-2 по муниципальному контракту № 188 от 22.10.2018 на строительство школы в г. Йошкар-Оле, отчеты о проведении экспертизы содержат недостоверную информацию: - о материале, из которого изготовлены оконные блоки, установленные в здании Школы № 31 в г. Йошкар-Оле; - о выполнении работ по устройству системы вентиляции; - о посадке на пришкольной территории 59 деревьев - кленов остролистных; - о поставленном оборудовании: подставке под пароконвектомат		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
14. По результатам визуального осмотра здания Школы № 31 в г. Йошкар-Оле по состоянию на 31.03.2021 установлено следующее: - наличие дефектов на деревянных оконных блоках (наличие в стыках зазоров, трещины в стеклопакете);		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X

³ Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>- в классах ручки для открывания окон демонтированы;</p> <p>- в 66 помещениях на потолках многочисленные следы растрескивания; в 11 помещениях следы подтеков; в 2 помещениях сколы штукатурки;</p> <p>- в 5 помещениях 1-го этажа на стенах имеются трещины, в отдельных местах длина трещин превышает 2 метра, ширина трещин превышают 5 мм. Трещина над дверями 3 помещений 1-го этажа – сквозная; на стенах имеются многочисленные растрескивания в 54 помещениях.</p> <p><i>Письмами от 19.07.2021 № 328, 15.09.2021 № 455 ЗАО СПП «Салют» проинформировало Государственную счетную палату Республики Марий Эл о проведении работ по устранению трещин на первом этаже, ремонту кровли, потолка спортивного зала потолочных плит «Армстронг». По результатам ремонтных работ составлены акты устранения замечаний от 13.07.2021, 02.08.2021 факты выполнения работ со стороны Школы № 31 в г. Йошкар-Оле подтверждены заместителем директора по АХР – Савиновым Е.Л. и осмотром, проведенным по состоянию на 06.10.2021;</i></p> <p>- деревянный пол в помещениях снарядной и спортивного зала имеет щели, которые в отдельных местах достигают ширины 1 см.</p> <p><i>В ходе проведения осмотра (с 30 по 31.03.2021) ЗАО СПП «Салют» указанные выше недостатки были устранены;</i></p> <p>- в подвальном помещении на потолке и стенах комнаты хранения люминесцентных ламп, сантехнической арматуры имеется плесень. На первом этаже в кабинете начальных классов с двухуровневым потолком присутствует запах плесени, что позволяет сделать вывод о ненадлежащей вентиляции воздуха в помещениях здания Школы № 31.</p>								

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p><i>Осмотром, проведенным по состоянию на 06.10.2021, установлено, что недостатки устранены;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - калитка с правой стороны фасада – перекошена и не закрывается. Ворота, расположенные с правой стороны главного фасада перекошены, нарушена возможность закрытия ворот на навесной замок; - разметка, сделанная на спортивных площадках и беговых дорожках, практически отсутствует. Насыпная гранитная крошка имеет рыхлую и подвижную поверхность, на которой отсутствует возможность длительного сохранения разметки; - по периметру спортивных площадок с резиновым покрытием уложены просмоленные доски, по краям площадок имеются отслоения резинового покрытия от основания. - на металлических элементах: рукоход, турник, брусья гимнастические, препятствие «стенка с двумя проломами», «забор с наклонной доской», «разрушенная лестница» имеется ржавчина, на препятствии «разрушенная лестница» отдельные деревянные элементы расслаиваются. <p>Наличие указанных повреждений свидетельствует о низком качестве установленных объектов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в столовой находилось всего 9 стеллажей, из них - 4 стеллажа кухонных на сумму 99,5 тыс. рублей и 5 стеллажей металлических на сумму 16,6 тыс. рублей. Стеллажи кухонные в количестве 9 штук на сумму 173,9 тыс. рублей находились за пределами столовой, а именно: 3 стеллажа находятся в актовом зале, 1 – в помещении кладовой уборочного инвентаря 3 этажа, 1 – в помещении кладовой уборочного инвентаря 2 этажа. <p>Конструкции стеллажей металлических и стеллажей кухонных, представленных к осмотру, визуально изготовлены из одного и того же материала и имеют одинаковый внешний вид. Вместе с тем, стоимость стеллажей кухонных</p>								

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
дороже в 6 раз стеллажей металлических. Таким образом, при отсутствии потребности в стеллажах кухонных объем израсходованных бюджетных средств на приобретение оборудования мог быть меньшим								
<p>15. (с учетом возражений и дополнительно представленных документов) Изменения в «Комплекс мер (программа), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 – 2025 годы», утвержденный постановлением Главы Администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 10.03.2016 № 168, в целях актуализации наименования объектов строительства в соответствии с региональным проектом и периодом строительства объектов в проверяемом периоде не вносились.</p> <p>Комплексом мер в редакции от 05.12.2016 № 849 предусмотрено строительство школы в пос. Медведево по ул. Кирова на 825 мест в 2018 году, что не соответствует периоду строительства, определенному Соглашением - 2020 - 2022 годы. В 2020 – 2022 годах Комплексом мер строительство школы в пос. Медведево по ул. Кирова на 825 мест не предусмотрено.</p> <p>Указанный Комплекс мер не является муниципальной программой, разработанной в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не содержит распределение бюджетных ассигнований в соответствии с классификацией расходов бюджетов. Решением Собрания депутатов муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 18.12.2019 № 31-VII «О бюджете муниципального образования «Медведевский муниципальный район» на 2020 год и на плановый</p>		Администрация Медведевского муниципального района	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
период 2021 и 2022 годов» утверждено распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 12.11.2013 № 1875								
16. По результатам визуального осмотра строящегося здания школы в п. Медведево по состоянию на 08.06.2021 установлено нарушение графика выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ на общую сумму 10 340,45 тыс. рублей (3,77% цены контракта), а именно: - не выполнены работы, срок выполнения которых истек, стоимость работ – 1 187,3 тыс. рублей; - отдельные виды работ выполняются с отставанием от графика, стоимость работ 8 123,0 тыс. рублей; - отдельные виды работ, срок исполнения по которым наступил, не выполняются, стоимость не выполненных работ – 1 030,15 тыс. рублей. Нарушение графика выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ создает риски несвоевременного исполнения обязательств, принятых по муниципальному контракту № 0108300011520000071 от 03.07.2020 на строительство школы в п. Медведево		Администрация Медведевского муниципального района	1	X	X	X	X	X
17. Не выполнение в установленный срок заданных контрольных точек влечет риск невыполнения мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Несвоевременное заключение контрактов на разработку проектно-сметной документации на строительство школы в д. Сардаял Мари-Турекского района и несвоевременное выполнение		Администрация Мари-Турекского муниципального района:	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
работ, услуг повлияли на своевременность получения положительной экспертизы, без которой размещение конкурсной документации в единой информационной системе в сфере закупок невозможно								
18. В Минобрнауки Республики Марий Эл несвоевременно представлены: - отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2020 год на 10 календарных дней позже установленного срока, а именно предусмотрено не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором была получена субсидия, фактически отчет представлен 15.01.2021; - отчет о выполнении мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества за 2020 год на 10 календарных дней позже установленного срока, а именно предусмотрено не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором была получена субсидия, фактически отчет представлен 15.01.2021	Пункт 4.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета от 29.06.2020 № 1	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»	1	X	X	X	X	X
19. В Соглашении о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на проектные и изыскательские работы, иные работы и услуги от 29.06.2020 № 1 отсутствует информация в соответствии с какими порядками предоставления субсидии заключено настоящее Соглашение		Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»	1	X	X	X	X	X
20. Приобретенные с апреля по июнь 2020 года в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» оборудование и средства обучения в количестве 115 единиц на момент осмотра по состоянию на 03.03.2020 не эксплуатировались		ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат»	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. В оформлении помещений имеются отклонения от Дизайн-проекта Доброшкола в части расположения оборудования и средств обучения: в мастерской штукатурно-малярного дела, швейных мастерских, обувной мастерской, кабинете педагога-психолога, учебных кабинетах: русского языка, биологии, истории, математики и компьютерном классе		ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат»	1	X	X	X	X	X
22. Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии от 22.04.2020 № 20-2020-02033 не оговорено, что субсидия выделяется для приобретения оборудования и средств обучения для 15 Центров «Точка роста»		ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»	1	X	X	X	X	X
23. Оформление помещений не в полной мере соответствует типовому дизайн-проекту Точки роста, имеются отклонения в части оформлении пола (необходимо линолеум, фактически плитка), мебели и оборудования, цветового оформления стен, а также площади помещений (необходимо 71 м2 и 32 м2, фактически 54 м2 и 60 м2)		ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш»	1	X	X	X	X	X

Информация
о причинах несвоевременного достижения контрольных точек по
мероприятиям регионального проекта в 2021 году

Контрольная точка, мероприятие	Срок		Объяснение Минобрнауки Республики Марий Эл
	План	Факт	
Результат «Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа»			
Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	11.01.2021		в связи с возникшей необходимостью в проведении экспертизы на объект культурного наследия в связи с предполагаемым наличием мест захоронения на участке строительства в ходе инженерно-геодезических изысканий
Мероприятие «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – объект «Сардаяльская основная общеобразовательная школа в дер. Сардаял Мари-Турекского района»»	25.12.2020	19.04.2021	
Результат «В Республике Марий Эл обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»			
Контрольная точка «Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» (Вид документа и характеристика результата: «Извещения о проведении закупок»)	31.03.2021	21.05.2021	в связи с перераспределением позиций при формировании технических заданий.
Результат «На базе общеобразовательных организаций Республики Марий Эл созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»»			
Контрольная точка «Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций» (Вид документа и характеристика результата: «Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа», «Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования детских технопарков «Кванториум»», «Извещения о проведении закупок»)	31.03.2021	19.05.2021	Письмо федерального оператора от 19.05.2021 № 1601 «О согласовании инфраструктурного листа для создания детского технопарка Кванториум в 2021 году
		27.05.2021	в связи с поздним утверждением инфраструктурного листа (19.05.2021)
		30.04.2021	в связи с заменой помещений, для размещения Кванториума, по согласованию с федеральным оператором
Результат «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»			
Контрольная точка «Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» (Вид документа и характеристика результата: «Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа», «Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», «Извещения о проведении закупок»)	31.03.2021	20.04.2021	в связи с заменой позиций инфраструктурного листа в связи с изменением местонахождения центра
		30.04.2021	в связи с определением нового адреса местонахождения ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования»
		21.05.2021	в связи с перераспределением позиций при формировании технических заданий

Фотоотчет
по результатам осмотров, проведенных в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы»

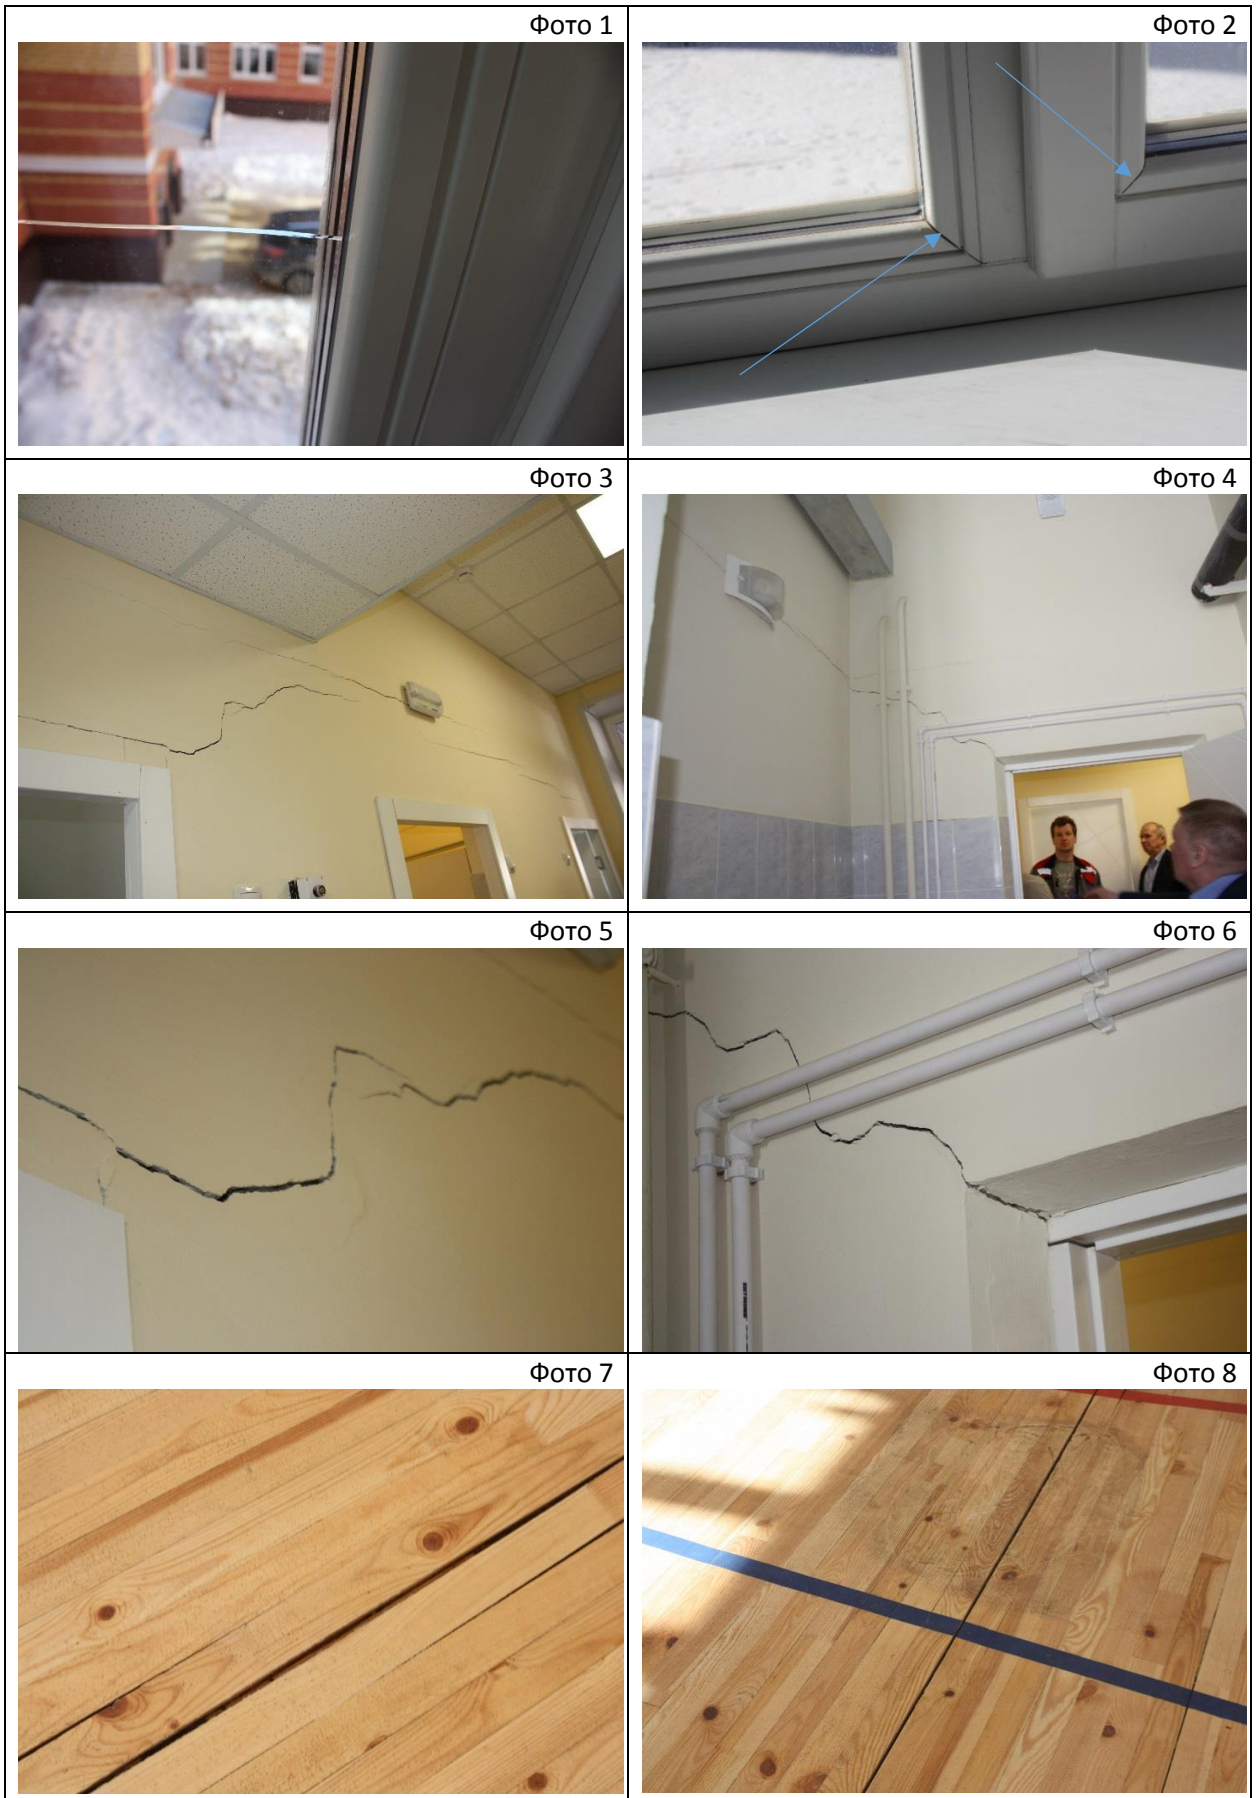


Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Φοτο 17



Φοτο 18



Φοτο 19



Φοτο 20



Φοτο 21



Φοτο 22




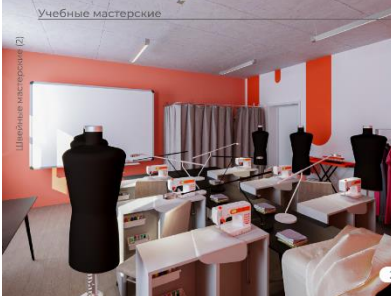


Φοτο 23



Φοτο 24



**Фотоотчет
по результатам осмотра, проведенного в ГБОУ Республики Марий Эл
«Козьмодемьянская школа-интернат» 03.03.2021**

Наименование помещений	Предусмотрено в Дизайн-проекте	Фактически реализовано
Кабинет социально-бытовой ориентировки	 <p>Учебные кабинеты Кабинет СБО (Социально-бытовой ориентировки)</p>	
Мастерская штукатурно-малярного дела	 <p>Учебные мастерские Швейная мастерская (2)</p>	
Швейная мастерская	 <p>Учебные мастерские Швейная мастерская (2)</p>	
Столярная мастерская	 <p>Учебные мастерские Столярная мастерская 2</p>	

Фотоотчет по результатам осмотров Центров «Точка роста»


ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» (01.04.2021)



Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций



Помещение для проектной деятельности (рекреация)



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» (по состоянию на 01.04.2021)



кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций



Рекреация в холле



МБОУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа №2» (по состоянию на 01.04.2021)



кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций



помещение для проектной деятельности



Рекреация в холле

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» (по состоянию на 14.04.2021)



кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций



помещение для проектной деятельности



ХОЛЛ

МБОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Яналова» (по состоянию на 14.04.2021)



кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций



помещение для проектной деятельности



рекреация в холле

МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» (по состоянию на 14.04.2021)



кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций



помещение для проектной деятельности



рекреация (шахматная комната)
